



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 060503

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: VILLA RIVA

DISTRITO MUNICIPAL: CRISTO REY DE GUARAGUAO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 5 de mayo de 2023

1. Ing. Richard Cabrera

TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LA IGLESIA	103.70	1.20	1.00	103.70	1.00	124.44	103.70
TRAMO B	CRISTO REY	93.10	1.20	1.00			111.72	
TRAMO C	CRISTO REY	38.10	1.20	1.00			45.72	
TRAMO D	30 DE MARZO	282.20	1.20	1.00			338.64	
TRAMO E	30 DE MARZO	373.40	1.20	1.00			448.08	
TRAMO F	30 DE MARZO	619.10	1.20	1.00			742.92	
TRAMO G	AV. MELLA	176.35	1.20	2.00	43.00	1.00	423.24	43.00
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							2,234.76	146.70

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,185,174.82

Monto desembolsado RD\$ 3,185,174.82 (100%)

Avance de obra 105.14%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 5 de mayo de 2023

PROVINCIA: DUARTE

MUNICIPIO: VILLA RIVA

DISTRITO MUNICIPAL: CRISTO REY DE GUARAGUAO


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 2,234,76 metros cuadrados de aceras y 146,70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. EN LA VISITA DE INSPECCION SE OBSERVO UNA TERMINACION MALA POR CAUSA DE DE LA LLUVIA EN ACERA
2. TAMBIEN SE OBSERVARON VARIACIONES EN ALGUNOS TRAMOS CON EL ESPESOR DE 10CM- 8CM DE LA ACERA
3. SE LE HICIERON LAS RECOMENDACIONES DE LUGAR PARA EVITAR LO NOMBRADO EN LA PRIMERA NOTA

IMÁGENES

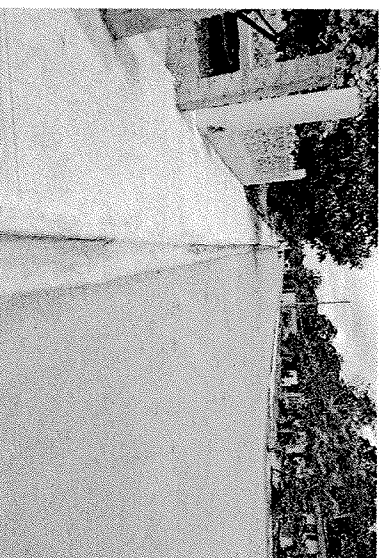



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

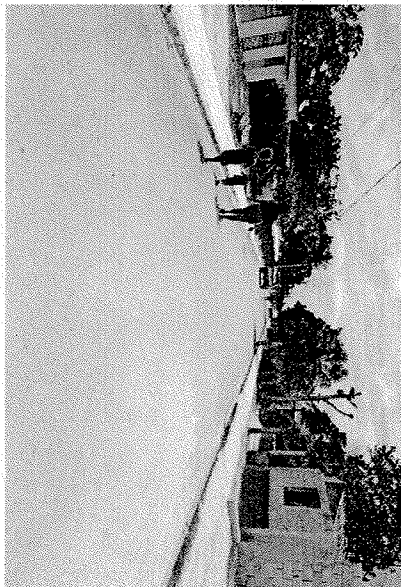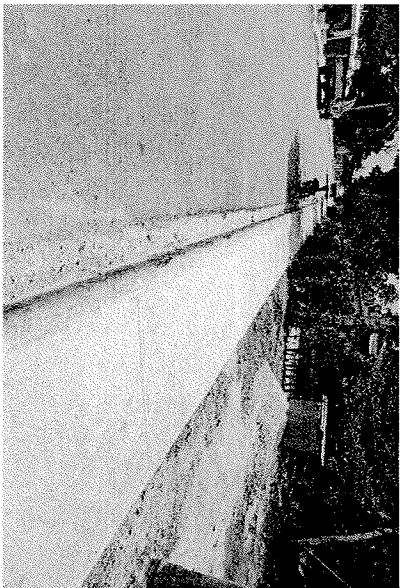

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico

FÉLPE REYES
Técnico
