



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 070302

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: EL LLANO

DISTRITO MUNICIPAL: GUANITO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de enero de 2023

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

TÉCNICOS: 2. Ing. Danilo Mercado


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA PRINCIPAL (FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO CELINDA JIMENEZ)	138.00	1.00	1	138.00	1	138	138
TRAMO B	CARRETERA PRINCIPAL (FRENTE AL CENTRO EDUCATIVO CELINDA JIMENEZ)	84.70	1.81	1	87.70	1	153.307	87.7
TRAMO C	SECTOR LOS ARROYOS (CALLE ESCUELA LATERAL DERECHO)	26.80	1.00	1	46.20	2	26.8	92.4
TRAMO D	CALLE ATRÁS DE LA ESCUELA	71.30	1.03	2	71.30	2	146.878	142.6
TRAMO E	CALLE ESCUELA LATERAL IZQUIERDO	59.50	1.00	2	60.5	2	119	121
TRAMO F	CALLE A	45.00	1.00	1	45	1	45	45
TRAMO G	CALLE B	71.50	1.00	2	71.5	2	143	143
TRAMO H	CALLE C	21.20	1.00	2	283.9	1	42.4	283.9
TRAMO I								
Total							814.39	1053.60

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,056,764.81

Monto desembolsado RD\$ 3,056,764.82 (100%)

Avance de obra 119.22%



## LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: EL LLANO

DISTRITO MUNICIPAL: GUANTO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de enero de 2023


### INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 814.39 metros cuadrados de aceras y 1,053.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

#### NOTAS


1. Este distrito esta construyendo por contrato.
2. La obra construida cumple con los parámetros recomendados por la LMD.
3. Los moradores están mas que agradecido por la iniciativa de la junta en tomarlo en cuenta.


#### IMÁGENES

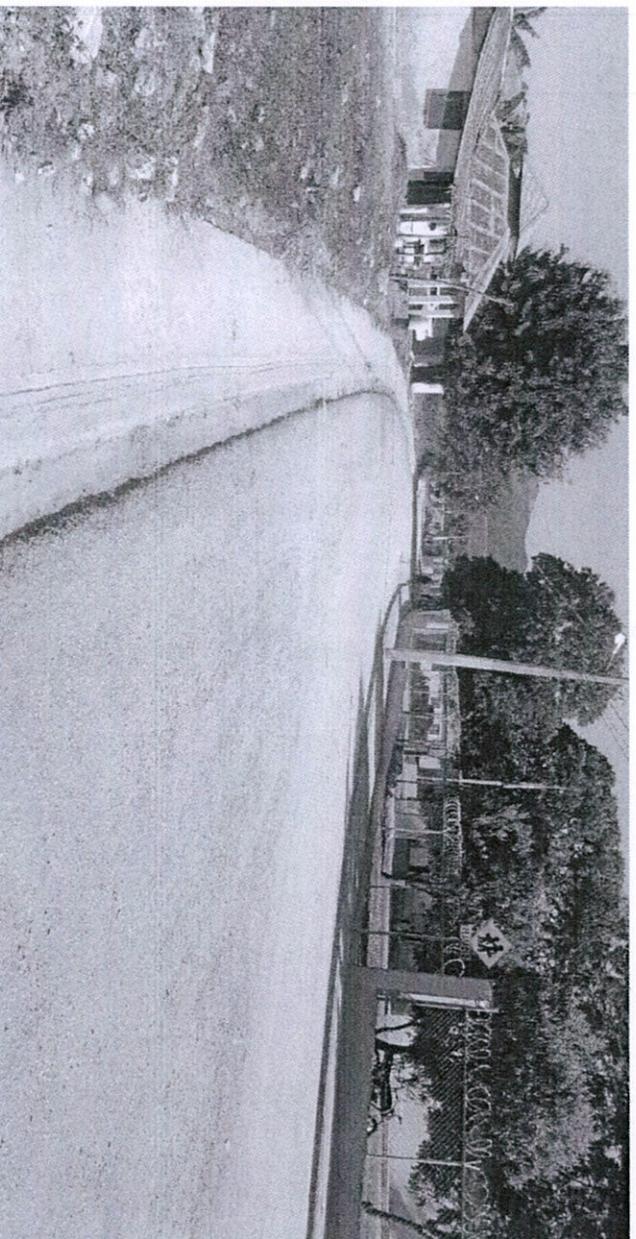






LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

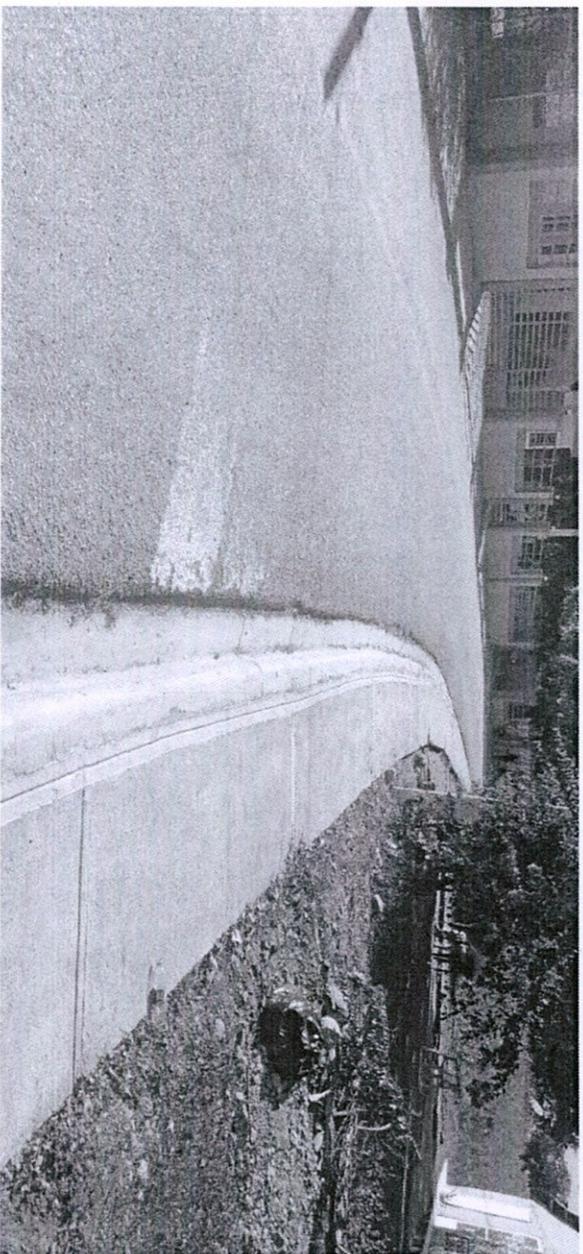



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

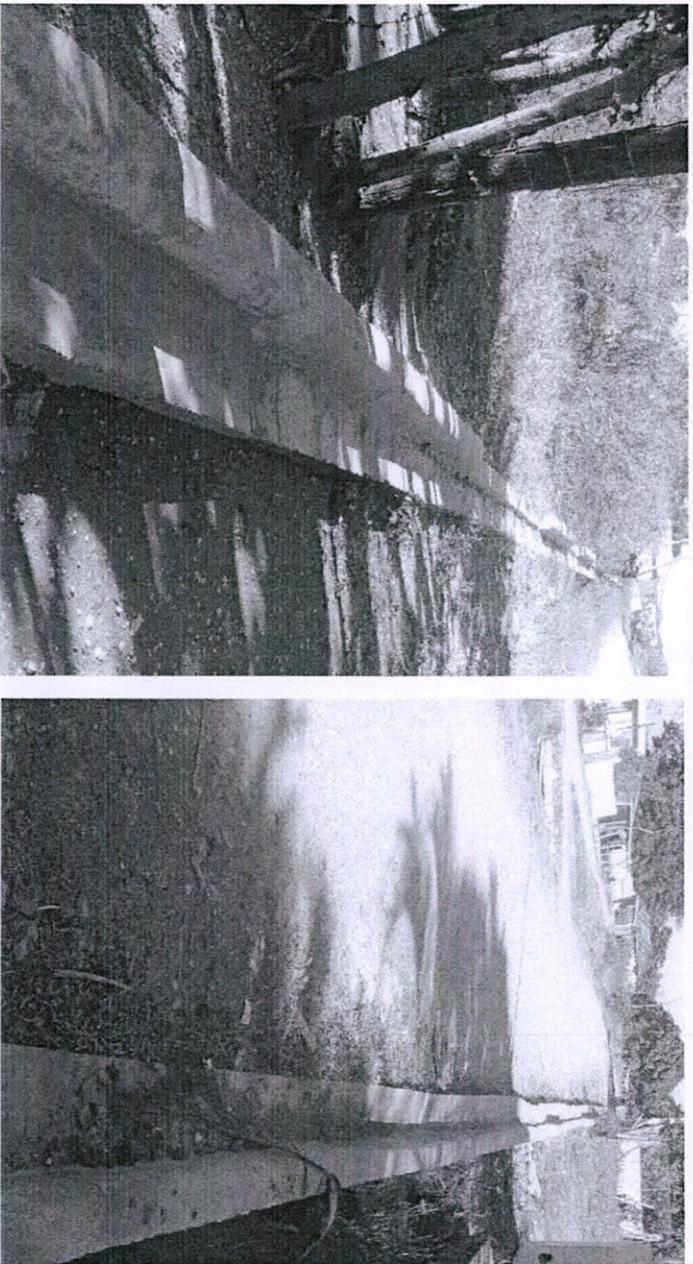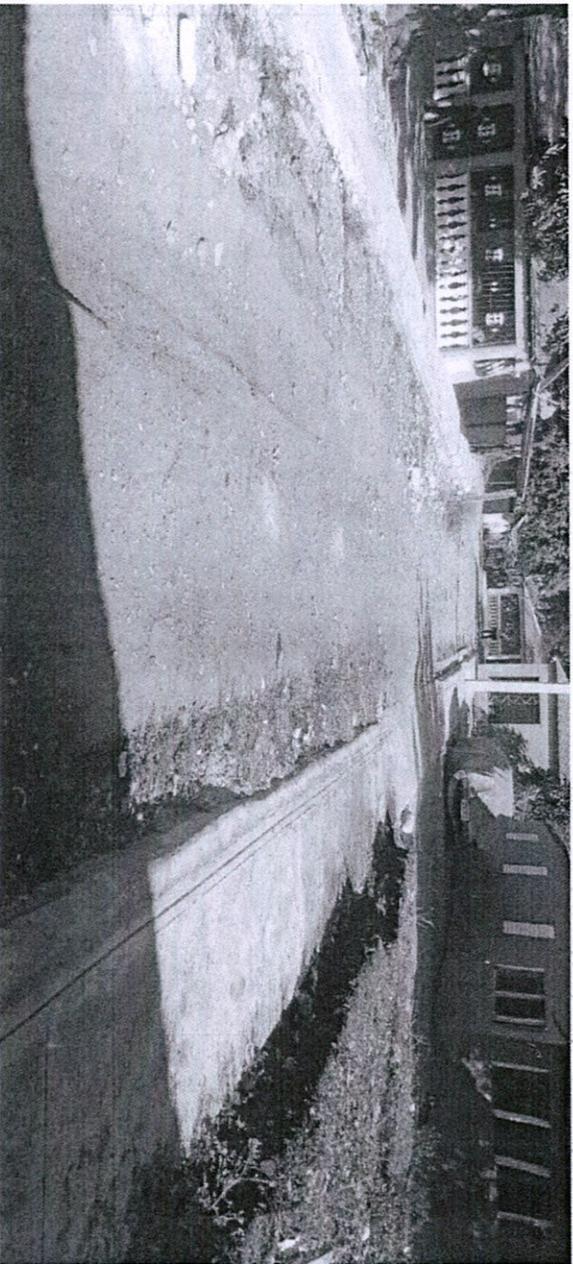



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico

  
ING. DANILLO MERCADO

Técnico

