



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 070301

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: EL LLANO

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 5 de octubre de 2022

1. Ing. Staylin Mendoza

TÉCNICOS: 2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CENTRO DE COTICA	63.50	1.08	2	63.50	2	137.16	127
TRAMO B	CENTRO DE COTICA	23.20	0.80	2	35.40	2	37.12	70.8
TRAMO C	CENTRO DE COTICA	59.80	1.03	2	59.80	2	123.188	119.6
TRAMO D	CENTRO DE COTICA	82.85	0.95	2	85.10	2	157.415	170.2
TRAMO E	JUAN BOSCH	161.75	1.00	2	161.75	2	323.5	323.5
TRAMO F	CEMENTERIO	51.15	1.00	2	83.7	2	102.3	167.4
TRAMO G	LEOPORDO MEDINA	22.80	0.95	1	152.7	1	21.66	152.7
TRAMO H	LEOPORDO MEDINA	63.40	1.00	2	63.4	2	126.8	126.8
TRAMO I	LEOPORDO MEDINA	129.30	1.00	1	129.3	1	129.3	129.3
Total							1158.44	1387.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,061,319.90

Monto desembolsado RD\$ 3,061,319.90 (100%)

Avance de obra 160.21%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 5 de octubre de 2022

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: EL LLANO

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,158.44 metros cuadrados de aceras y 1,387.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. La obra se ejecutó vía administración.
2. El proyecto cumple con los estándares de calidad recomendados por el programa.

IMÁGENES

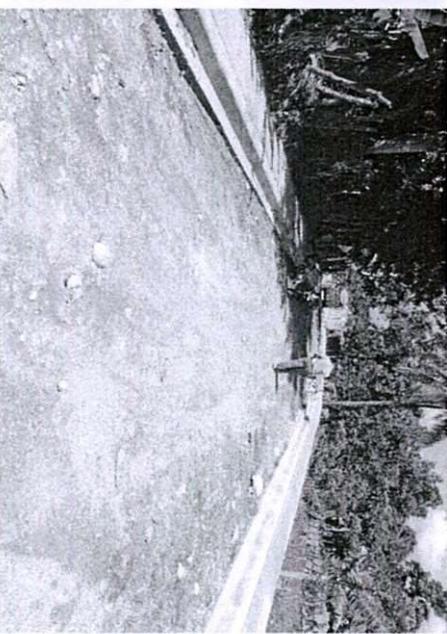




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

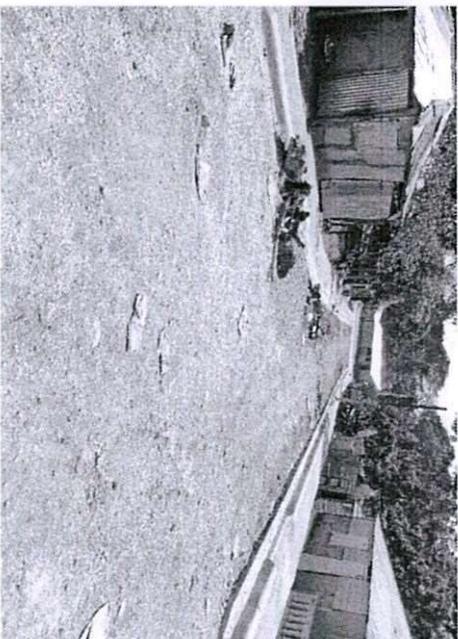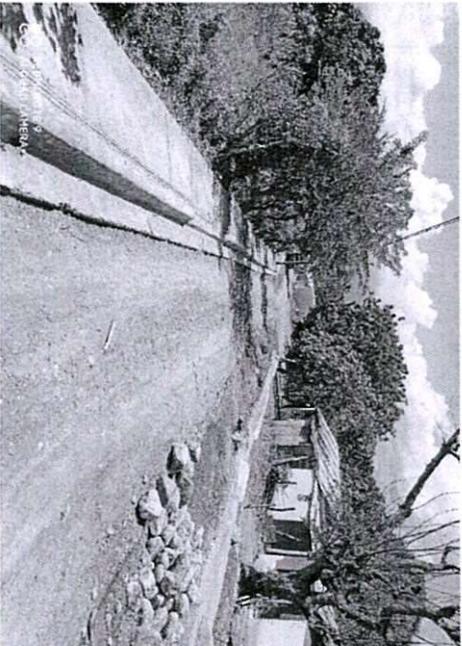

Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico


ING. DANILLO MERCADO
Técnico

