



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 070401

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: HONDO VALLE

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 5 de mayo de 2022

1. Ing. Richard Cabrera


TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A1	PEDRO MORILLO/ CALLE DEL CEMENTERIO	42.90	1.00	1	42.90	1	42.9	42.9
TRAMO A2	PEDRO MORILLO/ CALLE DEL CEMENTERIO	41.30	1.00	1	58.20	1	41.3	58.2
TRAMO A3	PEDRO MORILLO/ CALLE DEL CEMENTERIO				40.50	1		40.5
TRAMO A4	PEDRO MORILLO/ CALLE DEL CEMENTERIO				20.8	1		20.8
TRAMO A5	PEDRO MORILLO/ CALLE DEL CEMENTERIO	34.00	1.00	1	34	1	34	34
TRAMO A6	PEDRO MORILLO/ CALLE DEL CEMENTERIO				8.7	1		8.7
TRAMO A7	PEDRO MORILLO/ CALLE DEL CEMENTERIO	37.00	1.00	1	37	1	37	37
TRAMO B1	RESPALDO PEDRO MORILLO	36.50	1.00	1	73.6	1	36.5	73.6
TRAMO B2	RESPALDO PEDRO MORILLO				17.5	1		17.5
TRAMO B3	RESPALDO PEDRO MORILLO				99.1	1		99.1
TRAMO C1	RESPALDO, RESPALDO PEDRO MORILLO				59.5	1		59.5
TRAMO C2	RESPALDO, RESPALDO PEDRO MORILLO				34	1		34
Total							191.7	525.8



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA		
Monto asignado	RD\$ 3,386,791.54	
Monto desembolsado	RD\$ 1,693,395.77	(50%)
Avance de obra	45.90%	



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 5 de mayo de 2022

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: HONDO VALLE

DISTRITO MUNICIPAL: -



REPORTE

A la fecha de 05/05/2022 se ha ejecutado 191.70 metros cuadrados de aceras y 525.80 metros lineales de contén, lo que corresponde al 45.9% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. Los nombres de las calles colocadas, fueron suministrados por miembros de la comunidad presente.

IMÁGENES

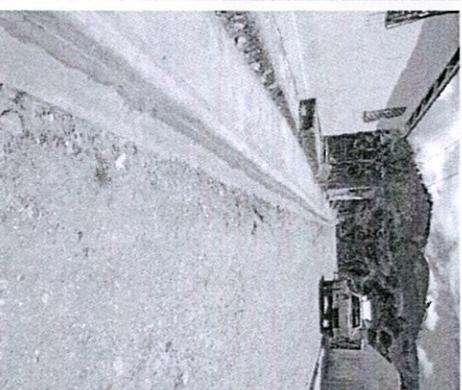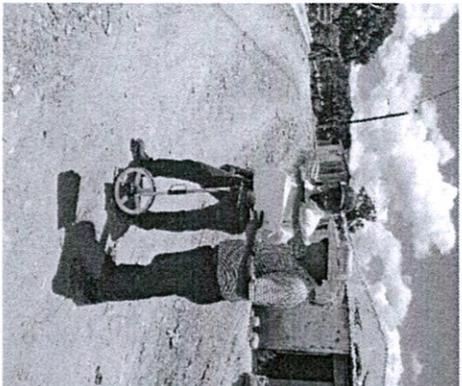



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

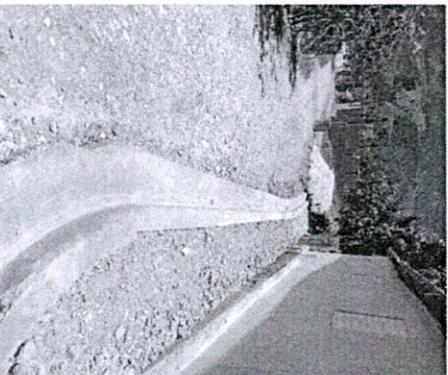

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico

ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico
