



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 070501

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: PEDRO SANTANA

DISTRITO MUNICIPAL: -


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19/0/2023

TÉCNICOS:
1. Ing. Staylin Mendoza
2. Arq. Zunilda Del Rosario
3. Francisco Martínez

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	RESP. 2DA CARRETERA ARROZA	143.25	0.98	2	141.75	2	280.77	283.5
TRAMO B	RESP. 1RA CARRETERA ARROZA	77.35	0.96	2	77.95	2	148.512	155.9
TRAMO C	CARRETERA ARROZO	261.15	1.00	2	261.15	2	522.3	522.3
TRAMO D	CALLE PERPENDICULAR	375.60	0.98	2	409.30	2	736.176	818.6
Total							1687.76	1780.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,031,386.48
Monto desembolsado RD\$ 3,031,386.49 (100%)
Avance de obra 215.79%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19/0/2023

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: PEDRO SANTANA

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,687.76 metros cuadrados de aceras y 1,780.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Esta obra fue ejecutado pr contrato.
2. El presupuesto y la cublicacion sera hecho por esta institucion
3. Tanto las aceras como los contenes presentan buenas terminacion visual.
4. En algunos de los tramos se utilizaron un volumen de mayor de relleno bajo acera debido al desnivel que
5. En algunos de tramos se tubo que hacer corte de talud para poder hacer la ejecucion tanto de las ace
6. En gran parte de los tramos se movilizaron las empalizadas.

IMÁGENES

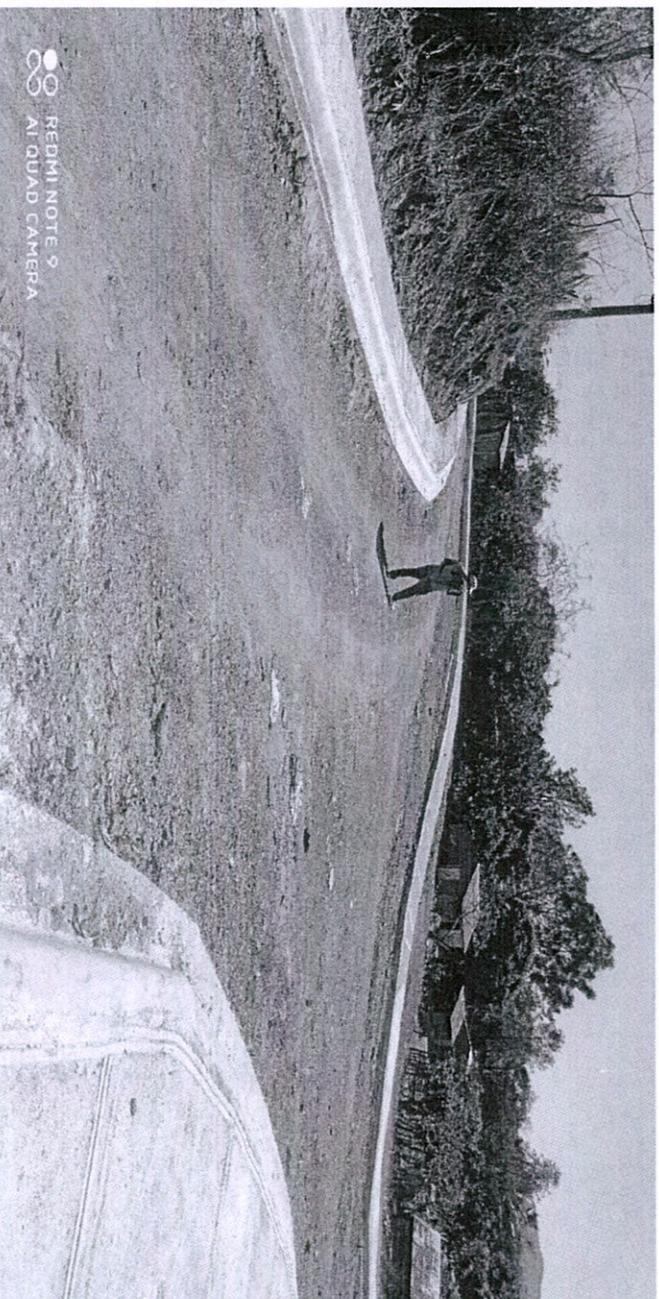



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico


ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico


FRANCISCO MARTÍNEZ

Técnico

