

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE AVANCE DE OBRA

**CODIGO:** 070601  
**REGIÓN:** EL VALLE  
**PROVINCIA:** ELÍAS PIÑA  
**MUNICIPIO:** JUAN SANTIAGO  
**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 16 de junio de 2023

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Staylin Mendoza  
2. Elizabeth García


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LA CANA	136.00	1.00	1.00	136.00	1.00	136.00	136.00
TRAMO B	LA CANA				106.70	1.00		106.70
TRAMO C	EL RINCONCITO				45.20	1.00		45.20
TRAMO D	EL RINCONCITO	18.30	1.00	1.00	49.80	1.00	18.30	49.80
TRAMO E	EL RINCONCITO				70.40	1.00		70.40
TRAMO F	EL RINCONCITO				61.70	1.00		61.70
<b>Total</b>							<b>154.30</b>	<b>469.80</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,079,431.78

Monto desembolsado RD\$ 3,079,431.79 (100%)

Avance de obra 44.42%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de junio de 2023

PROVINCIA: ELÍAS PIÑA

MUNICIPIO: JUAN SANTIAGO

DISTRITO MUNICIPAL: -

## INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 16/06/2023 se ha ejecutado 154.30 metros cuadrados de aceras y 469.80 metros lineales de contén, lo que corresponde al 44.42% del fondo asignado para este territorio.


### NOTAS

1. Esta obra fue ejecutada por contrato.
2. Se Construyeron tanto acera como contenes.
3. Esta obra contempla obras complementarias como la construcción de muro encaches por el terreno accidentado el cual fue construida.

- Por otra parte la acera que se esta ejecutando de es manera estampada lo que eleva el costo de la obra al igual el muro de encache, por lo que se deberá notificar a la alcaldía de manera formar para que tenga en su conocimiento que esta aunque sea de manera necesaria deberá ser asumida por esta, para que no afecte el convenio establecido liga municipal con el gobierno local.
- 4.

### IMÁGENES

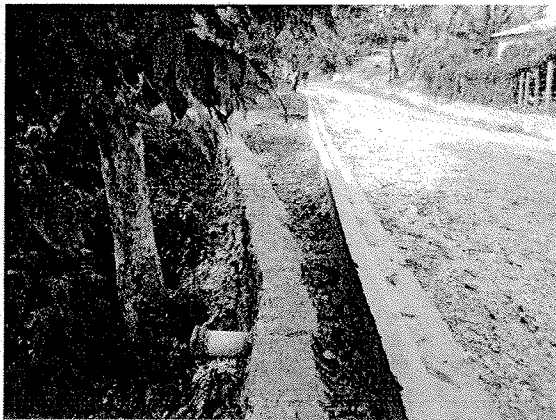



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

ELIZABETH GARCÍA

Técnico
