



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 080103

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: EL SEIBO

MUNICIPIO: EL SEIBO

DISTRITO MUNICIPAL: SAN FRANCISCO - VICENTILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15/06/23

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Sector/CAÑA GRANDE	43.50	1.01	1.00	43.50	1.00	43.94	43.50
TRAMO B		39.50	1.01	2.00	39.50	2.00	79.79	79.00
TRAMO C					71.00	1.00		71.00
TRAMO D					118.20	1.00		118.20
TRAMO E	C/ PRINCIPAL	31.50	0.78	1.00			24.57	
TRAMO F	SECTOR/ CERCADO av/ HATO MAYOR	128.90	1.00	2.00	128.90	2.00	257.80	257.80
TRAMO G		23.90	1.50	2.00	23.90	2.00	71.70	47.80
TRAMO H		4.50	1.30	2.00	4.50	2.00	11.70	9.00
TRAMO I		19.20	1.30	2.00	19.20	2.00	49.92	38.40
TRAMO J		56.30	1.00	2.00	56.30	2.00	112.60	112.60
TRAMO K		40.40	1.00	1.00	40.40	1.00	40.40	40.40
TRAMO L		23.50	2.55	1.00	23.50	1.00	59.93	23.50
TRAMO M								
TRAMO N								
<b>Total</b>							<b>752.34</b>	<b>841.20</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,104,918.57

Monto desembolsado RD\$ 1,552,459.29 (50%)

Avance de obra 98.11%



# LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15/06/23

PROVINCIA: EL SEIBO

MUNICIPIO: EL SEIBO

DISTRITO MUNICIPAL: SAN FRANCISCO - VICENTILLO


## INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 15/06/2023 se ha ejecutado 752.34 metros cuadrados de aceras y 841.20 metros lineales de contén, lo que corresponde al 98.11% del fondo asignado para este territorio.

### NOTAS


1. Este Gobierno Local ejecuto por contrato.
2. Toda construcción cumple con los parámetros de construcción.

### IMÁGENES

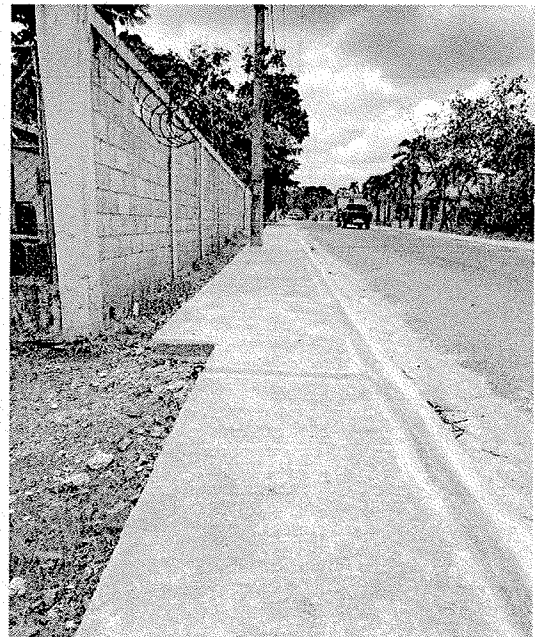





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

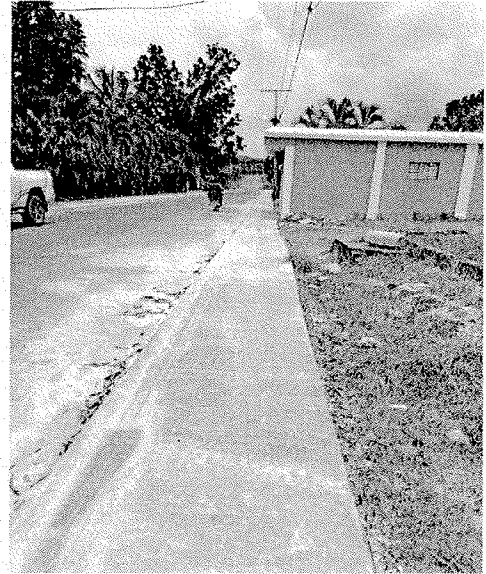

*Suministra los datos de este reporte,*

  
ING. DANILO MERCADO  
Técnico

  
FELIPE REYES  
Técnico
