



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


CODIGO: 080104
REGIÓN: YUMA
PROVINCIA: EL SEIBO
MUNICIPIO: EL SEIBO
DISTRITO MUNICIPAL: SANTA LUCÍA - LA HIGUERA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14/01/2023
TÉCNICOS: 1. Arq. Zunilda Del Rosario
2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE A (SECTOR EL TAMARINDO)	77.15	0.80	2	115.70	2	123.44	231.4
TRAMO B	CALLE B (SECTOR EL TAMARINDO)	18.50	0.50	1	38.50	2	9.25	77
TRAMO C	CALLE C (SECTOR EL TAMARINDO)	130.00	0.60	2	146.70	2	156	293.4
TRAMO D	CALLE D (SECTOR EL TAMARINDO)	86.60	1.00	2	134.20	2	173.2	268.4
TRAMO E	CALLE E (SECTOR EL TAMARINDO)	116.80	1.00	1	116.8	2	116.8	233.6
TRAMO F	CALLE A (SECTOR EL TAMARINDO)	83.20	0.77	1	83.2	1	64.064	83.2
TRAMO G	CALLE A (SECTOR EL TAMARINDO)				6.2	1		6.2
TRAMO H	CALLE A (SECTOR EL TAMARINDO)	30.40	1.02	1			31.008	
TRAMO I	CALLE A (SECTOR EL TAMARINDO)	4.90	1.00	1			4.9	
TRAMO J								
Total							678.66	1193.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,880,042.14
Monto desembolsado RD\$ 3,880,042.14 (100%)
Avance de obra 99.04%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: EL SEIBO

MUNICIPIO: EL SEIBO

DISTRITO MUNICIPAL: SANTA LUCÍA - LA HIGUERA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 14/01/2023



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 678,66 metros cuadrados de aceras y 1,193,20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. En la ejecución de las aceras y los contenes pudimos observar una buena terminación con respecto a lo recomendado.

IMÁGENES

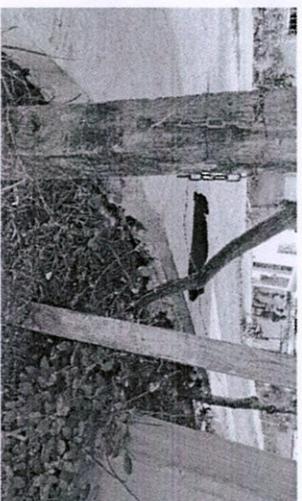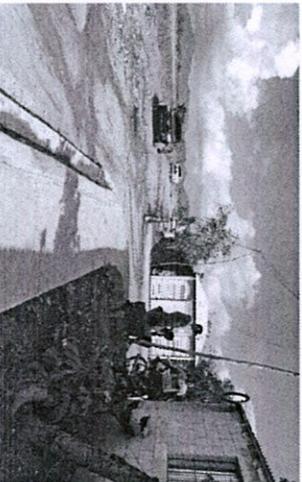



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Zunilda del Rosario G.

ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO

Técnico

Elizabeth G.

ELIZABETH GARCIA

Técnico

