



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


CODIGO: 080202
REGIÓN: YUMA
PROVINCIA: EL SEIBO
MUNICIPIO: MICHES
DISTRITO MUNICIPAL: EL CEDRO (JOVERO)

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de noviembre de 2022
1. Ing. Edward Acosta
TÉCNICOS: 2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACÉRAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE DE LA CLINICA	104.65	1.25	2	104.65	2	261.625	209.3
TRAMO B	CALLE DOÑA ANTONIA				81.70	2		163.4
TRAMO C	CARR. PRINCIPAL	208.90	1.10	1			229.79	
TRAMO D	CALLE PRINCIPAL	12.40	1.15	1	140.80	2	14.26	281.6
TRAMO E	CALLE SEGUNDA				59.2	2		118.4
TRAMO F	CALLE PRINCIPAL				143.8	1		143.8
TRAMO G	CALLE LA LOMA	92.05	1.00	2	120.8	2	184.1	241.6
Total							689.78	1158.10

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,424,208.31
Monto desembolsado RD\$ 3,424,208.32 (100%)
Avance de obra 110.04%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: EL SEIBO

MUNICIPIO: MICHEs

DISTRITO MUNICIPAL: EL CEDRO (JOVERO)

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de noviembre de 2022

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 689.78 metros cuadrados de aceras y 1,158.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. La obra se esta realizando via administracion.
2. El proyecto cumple con los estandares de calidad recomendados para el programa.
3. Han realizado un sin numero de obras complementarias (Baden), producto de la topografía del terreno.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -

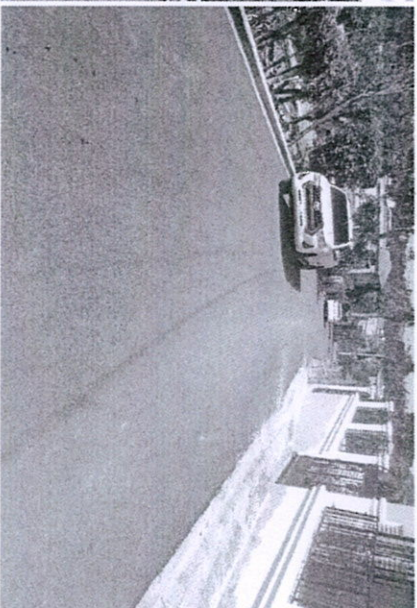

Suministra los datos de este reporte,



ING. EDWARD ACOSTA
Técnico



ING. DANILLO MERCADO
Técnico

