

# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 180803  
**REGIÓN:** CIBAO NORTE  
**PROVINCIA:** PUERTO PLATA  
**MUNICIPIO:** VILLA ISABELA  
**DISTRITO MUNICIPAL:** LA JAIBA

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 13 de junio de 2023


1. Ing. Richard Cabrera  
2. Ing. Danilo Mercado

**TÉCNICOS:**

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR LOMA S. PUEBLECITO				144.25	2.00		288.50
TRAMO B	CALLE PRINCIPAL AVEPETRILLO				213.00	1.00		213.00
TRAMO C	CALLE PRINCIPAL ANEGADIZO	13.90	1.65		314.40	1.00		314.40
TRAMO D	CALLE PRINCIPAL ANEGADIZO				74.70	2.00		149.40
TRAMO E	CALLE PRINCIPAL BETEL	54.10	1.00	1.00	54.10	1.00	54.10	54.10
TRAMO F	CALLE PRINCIPAL BETEL	567.30	1.00	1.00	267.10	1.00	567.30	267.10
<b>Total</b>							<b>621.40</b>	<b>1,286.50</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,853,087.46  
Monto desembolsado RD\$ 1,426,543.73 (50%)  
Avance de obra 140.98%



# LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** CIBAO NORTE  
**PROVINCIA:** PUERTO PLATA  
**MUNICIPIO:** VILLA ISABELA  
**DISTRITO MUNICIPAL:** LA JAIBA

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 13 de junio de 2023

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 621.40 metros cuadrados de aceras y 1,286.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## NOTAS


1. Esta obra fue ejecutada por contrato.
2. Casi en su totalidad se construyeron contenes.
3. Tanto las aceras como los contenes cumplen con los parametros establecido.
4. La calidad de las aceras y contenes son aceptables.

## IMÁGENES





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

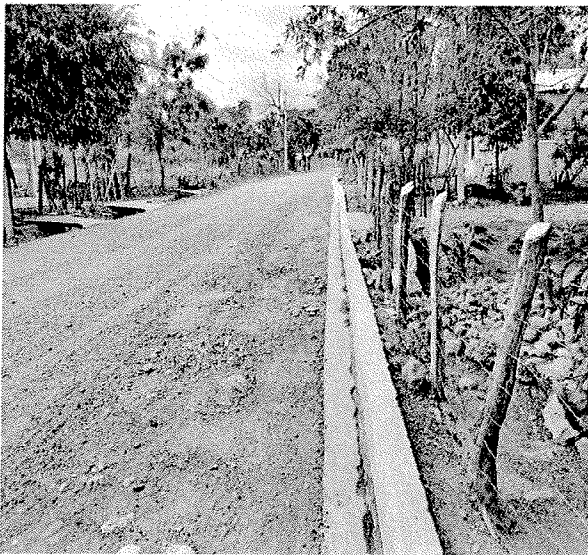

*Suministra los datos de este reporte,*

ING. RICHARD CABRERA  
Técnico

ING. DANILO MERCADO  
Técnico
