

# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 090108  
REGIÓN: CIBAO NORTE  
PROVINCIA: ESPAILLAT  
MUNICIPIO: MOCA  
DISTRITO MUNICIPAL: MONTE DE LA JAGUA


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de julio de 2022

SUPERVISOR: César Rafael Santana  
CODIA: 41948

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (M)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LOS VARGAS				421.60	1		421.6
TRAMO B	LOS VARGAS II				166.00	1		166
TRAMO C	LOS MARINGUISES				201.90	1		201.9
TRAMO D	LOS MARINGUISES II				34.00	1		34
TRAMO E	LAS COLINAS 2 I I-4				457.47	1		457.47
TRAMO F	LAS COLINAS 2 II T4				187.38	1		187.38
TRAMO G	LAS COLINAS I I I-5				478.45	1		478.45
TRAMO H	LAS COLINAS I II T5				47.2	1		47.2
Total							0.00	1994.00

## AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,236,690.66  
Monto desembolsado RD\$ 3,236,690.66 (100%)  
Avance de obra 155.82%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** CIBAO NORTE

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 19 de julio de 2022

**PROVINCIA:** ESPAILLAT

**MUNICIPIO:** MOCA

**DISTRITO MUNICIPAL:** MONTE DE LA JAGUA



## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,994.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## NOTAS





1. Este informe de cierre de ejecución se realiza a partir del reporte suministrado por el Ingeniero Supervisor del gobierno local designado por el CODIA, en cumplimiento de convenio CODIA-LMD.


## IMÁGENES

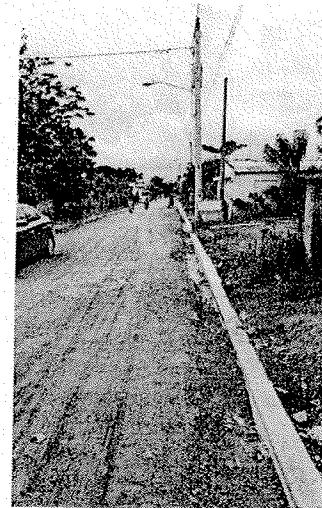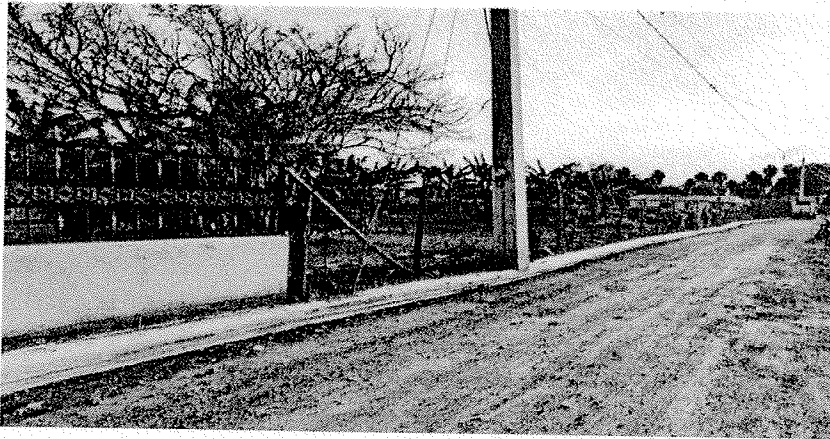








# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

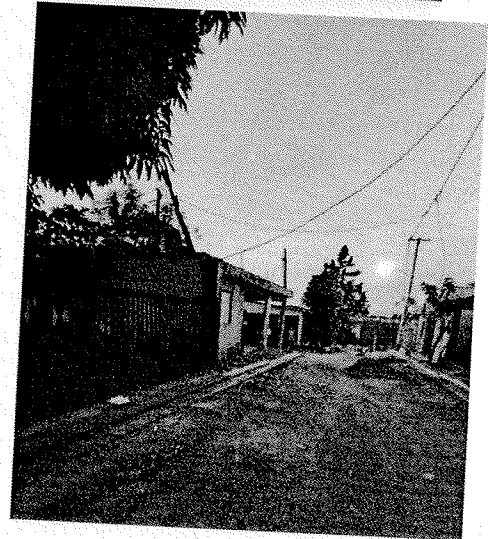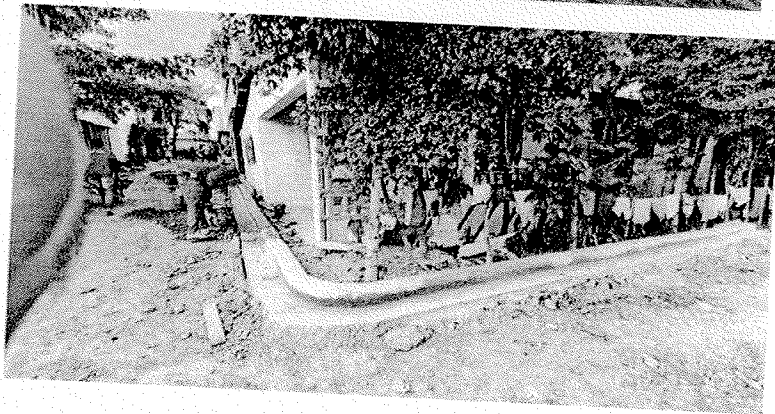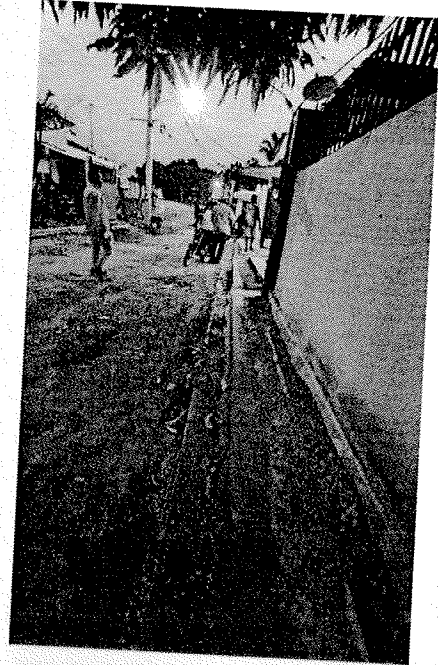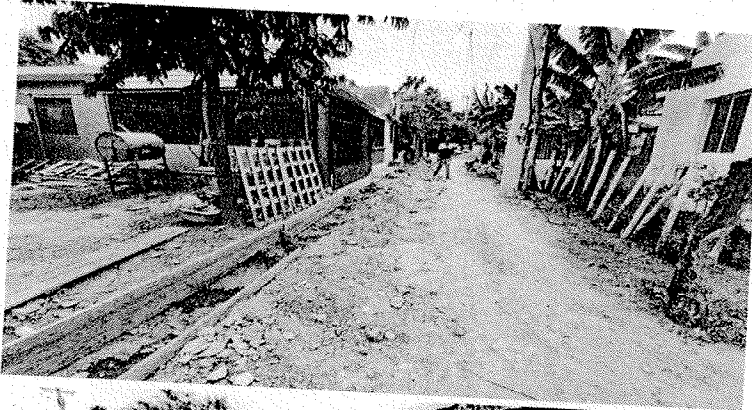



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

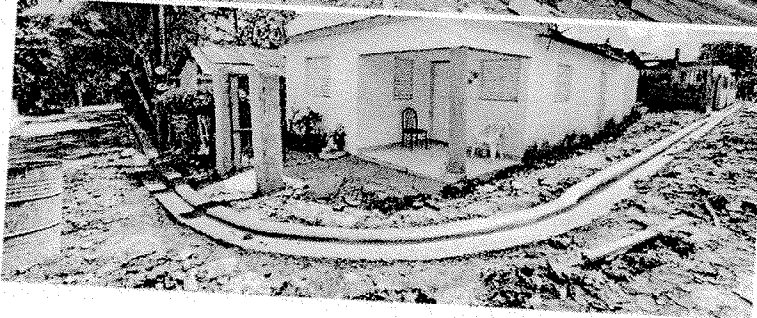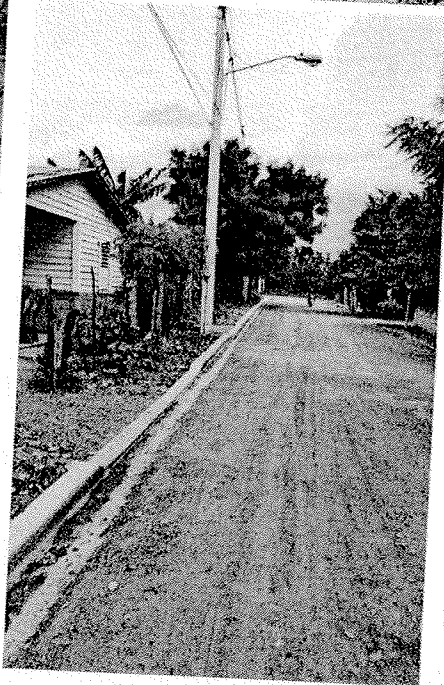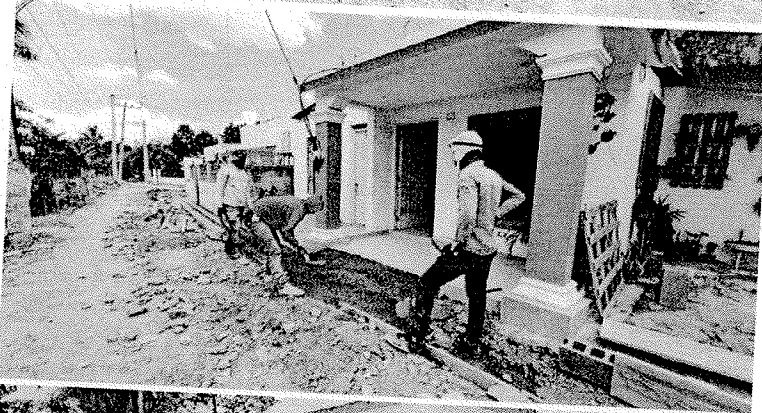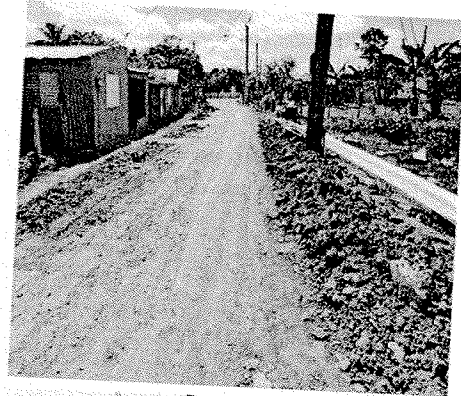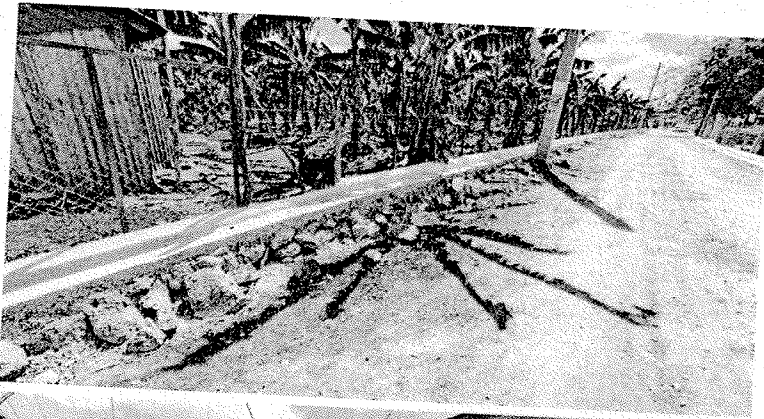

*Suministra los datos de este reporte,*

  
Arq. Yanetza Pérez  
Técnico
