



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 100103
REGIÓN: NOROCCIDENTAL
PROVINCIA: INDEPENDENCIA
MUNICIPIO: JIMANÍ
DISTRITO MUNICIPAL: BOCA DE CACHÓN


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15/11/2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Danilo Mercado
2. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	PROYECTO 1A				31.70	2		63.4
TRAMO B	PROYECTO 1B				238.00	2		476
TRAMO C	PROYECTO 2				12.40	2		24.8
TRAMO D	PROYECTO 3				7.20	2		14.4
TRAMO E	PROYECTO 4				111.8	2		223.6
TRAMO F	PROYECTO 5				53.4	2		106.8
TRAMO G	PROYECTO 6				530	2		1060
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							0.00	1969.00

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,942,236.97
Monto desembolsado RD\$ 1,471,118.49 (50%)
Avance de obra 173.36%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 15/11/2022

PROVINCIA: INDEPENDENCIA

MUNICIPIO: JIMANI

DISTRITO MUNICIPAL: BOCA DE CACHÓN


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,969.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. La obra se realizó por Contrato. Ejecutaron solo contenes para aprovechar el Plan de Asfaltado Nacional.
2. Este proyecto cumple con los estándares recomendado por el Programa.
3. Se observó desniveles de los contenes, uso de mucho telford, socavaciones de los contenes productos de las lluvias.
4. Se le hizo recomendaciones con respecto al drenaje y los desniveles observado para la buena ejecución de la obra.

IMÁGENES

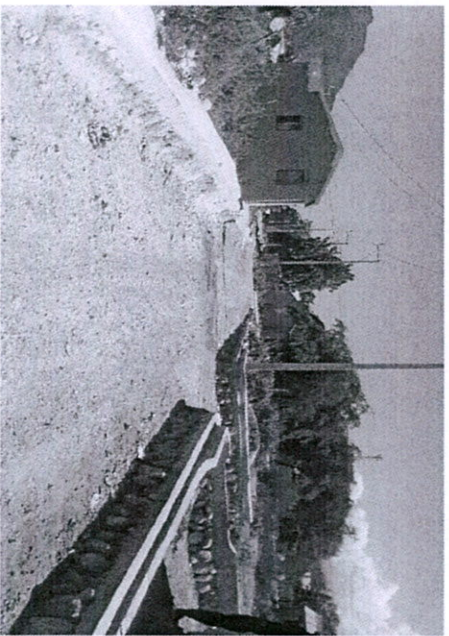




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

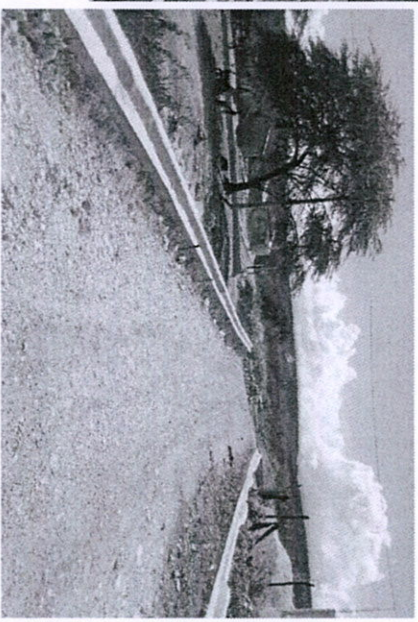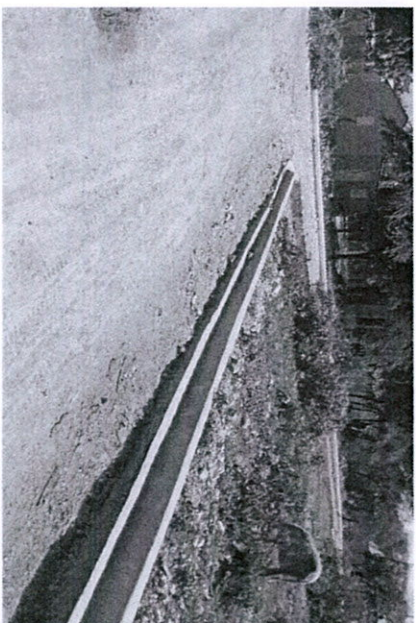

Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILLO MERCADO
Técnico


ING. RICHARD CABRERA
Técnico

