



LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 110103
REGIÓN: YUMA
PROVINCIA: LA ALTAGRACIA
MUNICIPIO: HIGÜEY
DISTRITO MUNICIPAL: LA OTRA BANDA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21 de octubre de 2022
TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez
2. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	BARRIO SINAI (CALLE PRINCIPAL)	151.70	1.00	1	151.70	1	151.7	151.7
TRAMO B	BARRIO SINAI (CALLE PRINCIPAL)	149.50	1.19	1	166.10	1	177.905	166.1
TRAMO C	BARRIO SINAI (CALLE PRINCIPAL)	14.40	1.00	1	14.40	1	14.4	14.4
TRAMO D	BARRIO SINAI (CALLE PRINCIPAL)				49.60	1		49.6
TRAMO E	CALLE PRINCIPAL	376.40	0.90	1	376.4	1	338.76	376.4
TRAMO F	SECTOR KM-5 CALLE EL LIMON	212.50	1.15	1	323.9	1	244.375	323.9
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							927.14	1082.10

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,744,047.85
Monto desembolsado RD\$ 5,744,047.86 (100%)
Avance de obra 67.35%



LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: LA ALTAGRACIA

MUNICIPIO: HIGÜEY

DISTRITO MUNICIPAL: LA OTRA BANDA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 21 de octubre de 2022



INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 21/10/2022 se ha ejecutado 927.14 metros cuadrados de aceras y 1,082.10 metros lineales de contén, lo que corresponde al 67.35% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. Este distrito municipal esta construyendo por contrato.
2. Lo construido hasta el momento cumple con los parametros recomendados.

IMÁGENES

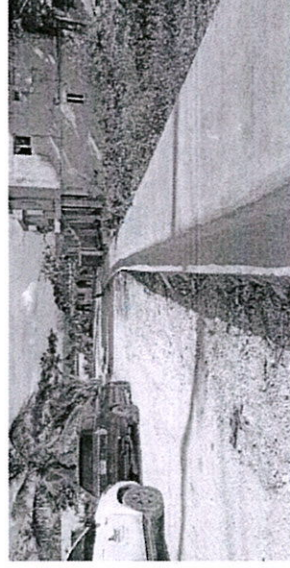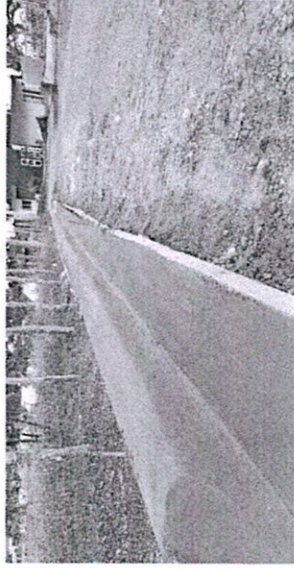




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

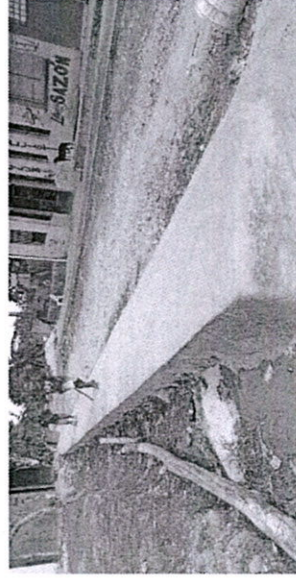

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico


ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

