



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


CODIGO: 110103
REGIÓN: YUMA
PROVINCIA: LA ALTAGRACIA
MUNICIPIO: HIGÜEY
DISTRITO MUNICIPAL: LA OTRA BANDA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de enero de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Danilo Mercado
2. Elisabeht Aguilera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	BARRIO SINAI (CALLE PRINCIPAL)	151.70	1.00	1	151.70	1	151.7	151.7
TRAMO B	BARRIO SINAI (CALLE PRINCIPAL)	149.50	1.19	1	166.10	1	177.905	166.1
TRAMO C	BARRIO SINAI (CALLE PRINCIPAL)	14.40	1.00	1	14.40	1	14.4	14.4
TRAMO D	BARRIO SINAI (CALLE PRINCIPAL)				49.60	1		49.6
TRAMO E	CALLE PRINCIPAL	376.40	0.90	1	376.4	1	338.76	376.4
TRAMO F	SECTOR KM-5 CALLE EL LIMON	212.50	1.15	1	323.9	1	244.375	323.9
TRAMO G	BARRIO LA CEJA (PRIMERA)	430.90	1.12	2	430.9	2	965.216	861.8
TRAMO H								
Total							1892.36	1943.90

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,744,047.85
Monto desembolsado RD\$ 5,744,047.86 (100%)
Avance de obra 125.84%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: LA ALTAGRACIA

MUNICIPIO: HIGÜEY

DISTRITO MUNICIPAL: LA OTRA BANDA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de enero de 2023


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,892.36 metros cuadrados de aceras y 1,943.90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Este distrito municipal esta construyendo por contrato.
2. Este proyecto cumple con los estándares recomendado por el Programa.

IMÁGENES

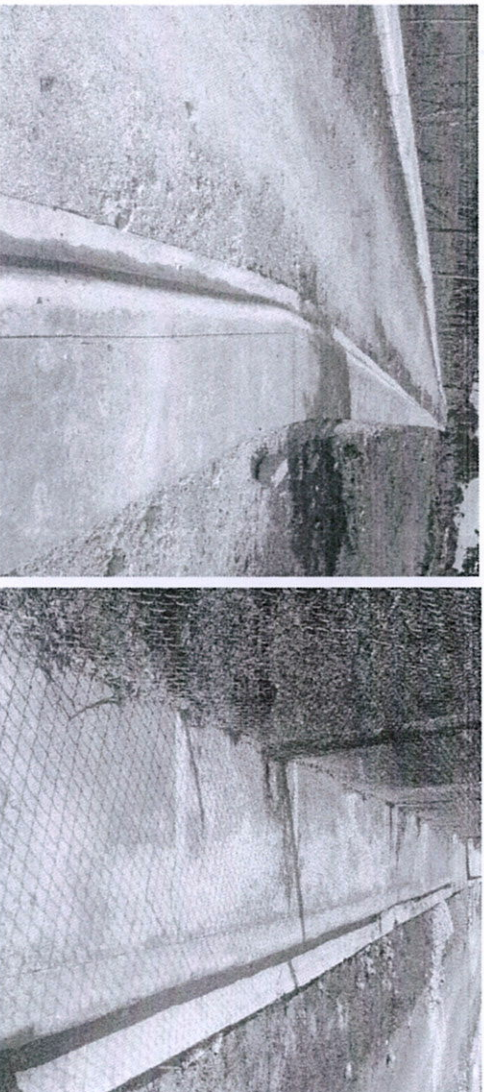



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILLO MERCADO
Técnico


ELISABETH AGUILERA
Técnico

