

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 110104
REGIÓN: YUMA
PROVINCIA: LA ALTAGRACIA
MUNICIPIO: HIGÜEY
DISTRITO MUNICIPAL: VERÓN PUNTA CANA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de junio de 2023

TÉCNICOS: 1. Arq. Zumilda Del Rosario
 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA PRINCIPAL	777.52	1.00	2.00	450.30	2.00	1,555.04	900.60
TRAMO B	C/PRIMERA	207.49	1.00	2.00	244.10	2.00	414.97	488.20
TRAMO C	SECTOR: VILLA ESPERANZA, CALLE: SEGUNDA				136.60	2.00		273.20
TRAMO DH	SECTOR: VILLA ESPERANZA, CALLE: SEGUNDA				13.30	1.00		13.30
TRAMO DI	SECTOR: VILLA ESPERANZA, CALLE: SEGUNDA				50.30	2.00		100.60
TRAMO DJ	SECTOR: VILLA ESPERANZA, CALLE: TERCERA				215.30	2.00		430.60
Total							1,970.01	2,206.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 7,376,611.88
 Monto desembolsado RD\$ 7,376,611.89 (100%)
 Avance de obra 108.26%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16 de junio de 2023

PROVINCIA: LA ALTAGRACIA

MUNICIPIO: HIGÜEY

DISTRITO MUNICIPAL: VERÓN PUNTA CANA



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,970.01 metros cuadrados de aceras y 2,206.50 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Esta Obra fue ejecutada por contrato.
2. El proyecto cumple con los recomendaciones establecidas del programa de aceras y contenes.
3. Este levantamiento técnico comprende las calles segunda y tercera en el sector Villa Esperanza.

IMÁGENES

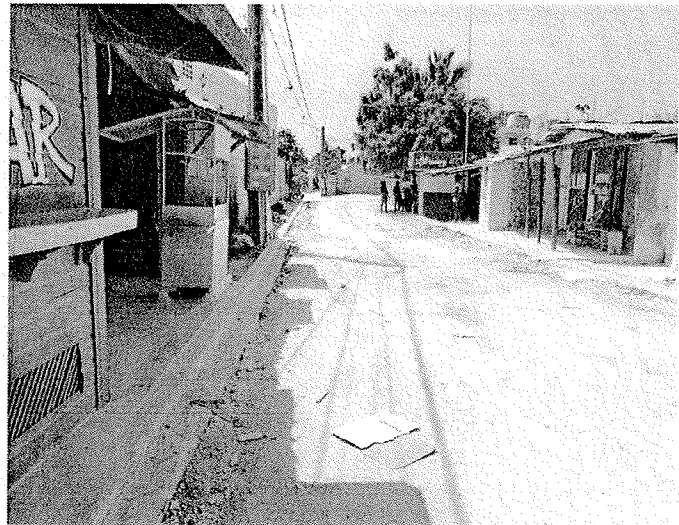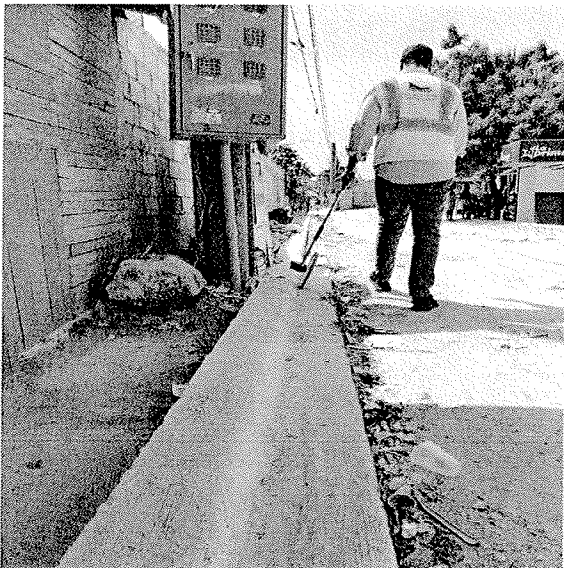



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

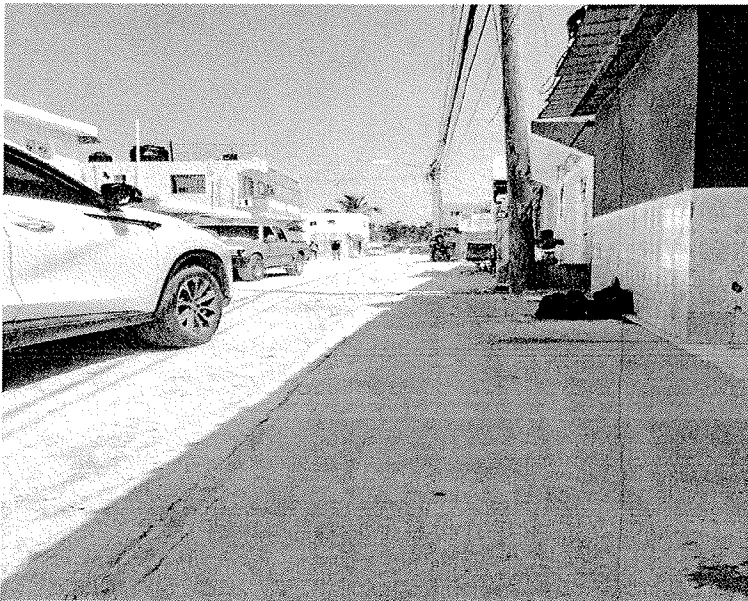

Suministra los datos de este reporte,

Zunilda Del Rosario C.
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO
Técnico

César de los Santos
CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico
