



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 120201

**REGIÓN:** YUMA

**PROVINCIA:** LA ROMANA

**MUNICIPIO:** GUAYMATE

**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 1 de noviembre de 2022

1. Ing. Ana Indhira Rámirez

**TÉCNICOS:** 2. Ing. Félix Tavárez

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calle A	91.40	0.78	2	98.60	2	142.584	197.2
TRAMO B	CALLE PRINCIPAL				271.25	2		542.5
TRAMO C	Calle B	151.40	0.90	2	151.20	2	272.52	302.4
TRAMO D	Calle duarte				59.50	1		59.5
TRAMO E	Calle C				145.55	2		291.1
TRAMO F	Calle D				33.9	2		67.8
TRAMO G	Calle E				112.45	2		224.9
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							415.10	1685.40

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,402,358.51

Monto desembolsado RD\$ 4,402,358.52 (100%)

Avance de obra 108.11%



## LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de noviembre de 2022

PROVINCIA: LA ROMANA

MUNICIPIO: GUAYMATE

DISTRITO MUNICIPAL: -

### INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente Informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 415.10 metros cuadrados de aceras y 1,685.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS


1. Al momento de la visita en los trabajos ejecutados tienen mas contenes realizados que aceras
2. Este municipio esta construyendo por contrato.
3. El Arq. Eric Paulino nos informa que construyeron mas contenes porque estan a la espera del programa de asfaltado
4. Lo visto hasta el momento cumple con lo recomendado.

### IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

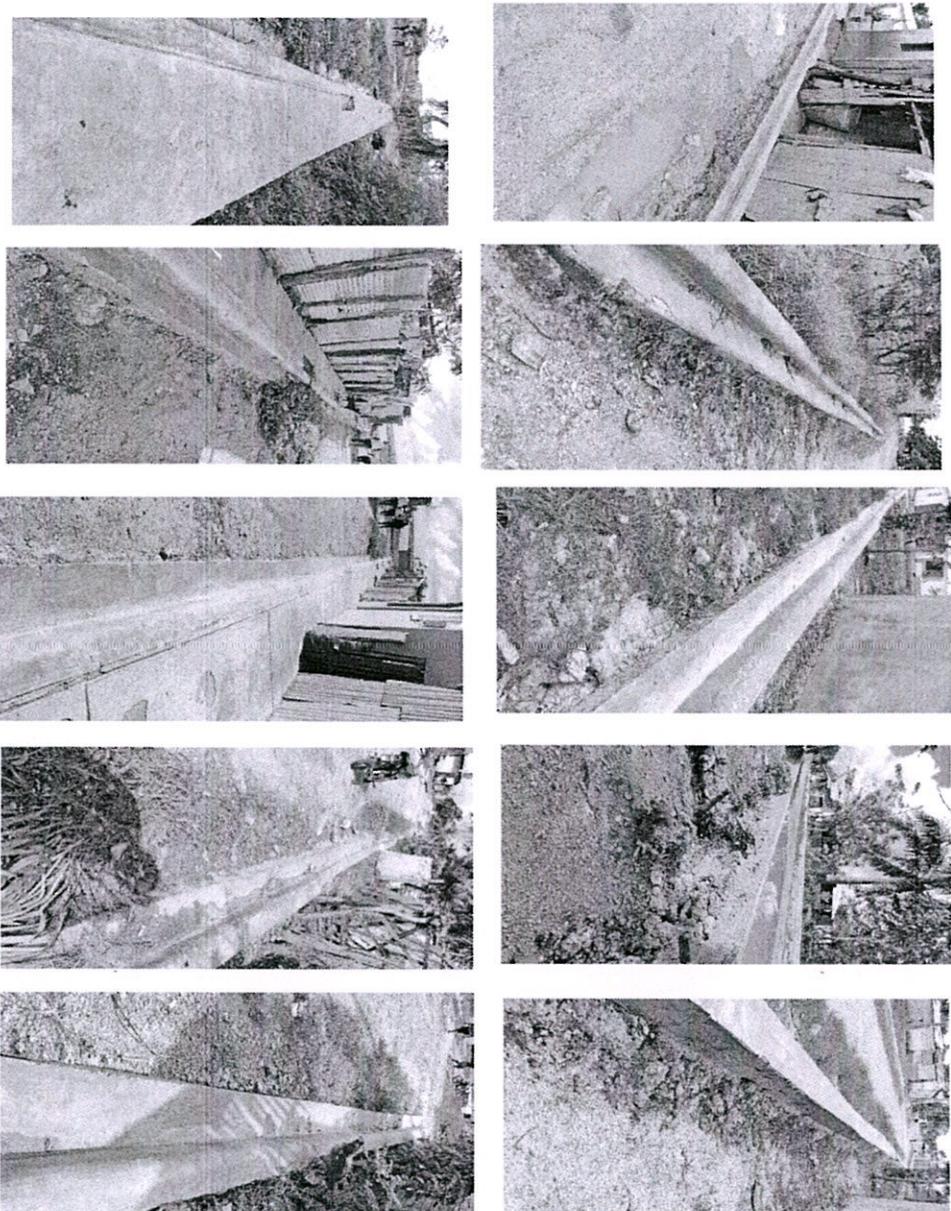

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDIRIRA RAMIREZ  
Técnico

  
ING. FÉLIX TAVÁREZ  
Técnico

