



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 120302

REGIÓN: YUMA

PROVINCIA: LA ROMANA

MUNICIPIO: VILLA HERMOSA

DISTRITO MUNICIPAL: CUMAYASA


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de noviembre de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR BRISA DEL MAR, CALLE LOS OCÉANOS	59.80	0.85	2.00	61.30	2.00	101.81	122.60
TRAMO B	SECTOR BRISA DEL MAR, CALLE LOS OCÉANOS	11.60	0.75	2.00	11.60	2.00	17.40	23.20
TRAMO C	SECTOR BRISA DEL MAR, CALLE LOS OCÉANOS	503.40	1.00	2.00	506.20	2.00	1,006.80	1,012.40
Total							1,126.01	1,158.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,904,010.56
Monto desembolsado RD\$ 1,952,005.29 (50%)
Avance de obra 110.27%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: YUMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 1 de noviembre de 2022

PROVINCIA: LA ROMANA

MUNICIPIO: VILLA HERMOSA

DISTRITO MUNICIPAL: CUMAYASA

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,126.01 metros cuadrados de aceras y 1,158.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Los trabajos hasta el momento de la visita se han ejecutado con buena calidad.
2. Tanto las aceras y contenes tienen las dimensiones y parámetros recomendados.
3. Este distrito esta ejecutando por contrato.

IMÁGENES






LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

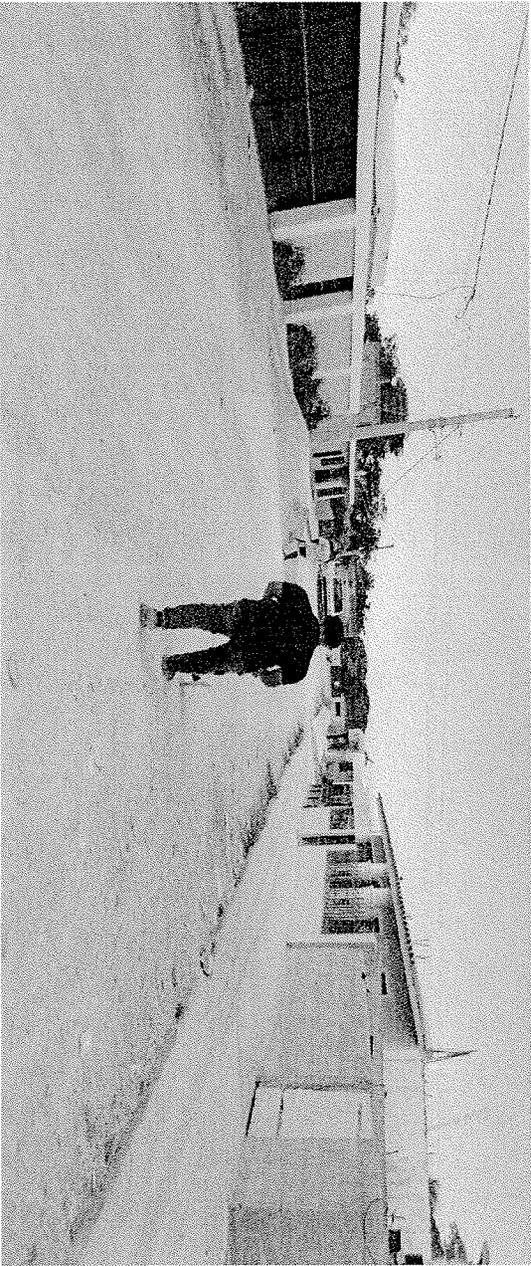

Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico


FELIPE REYES

Técnico
