



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 130103

REGIÓN: CIBAO SUR

PROVINCIA: LA VEGA

MUNICIPIO: LA VEGA

DISTRITO MUNICIPAL: EL RANCHITO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16/05/2023

1. Arq. Keilin Mora

TÉCNICOS: 2. Ing. Richard Cabrera


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ PRINC. FRENTE AL AYUNTAMIENTO	20.80	1.16	1	38.60	1	24.128	38.6
TRAMO B	C/ PRINC. FRENTE A RAFAEL CORONADO	262.00	0.91	1	262.00	1	238.42	262
TRAMO C	C/ PRINC. FRENTE A RAFAEL CORONADO	55.20	0.82	1	186.60	1	45.264	186.6
TRAMO D	C/ PRINC. FRENTE A RAFAEL CORONADO 2	174.00	0.51	1	246.30	1	88.74	246.3
TRAMO E	SETOR LA ROSA	26.90	0.90	1	26.9	1	24.21	26.9
TRAMO F	SETOR LA ROSA CALLE 1	39.40	1.50	1	39.4	1	59.1	39.4
TRAMO G	SETOR LA ROSA CALLE 2	58.60	1.00	2	58.6	2	117.2	117.2
TRAMO H	SETOR LA ROSA CALLE 3	7.70	1.01	1	23.8	1	7.777	23.8
TRAMO I	SETOR LA ROSA CALLE 4	14.40	0.27					
Total							604.84	940.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,650,552.63

Monto desembolsado RD\$ 3,650,552.64 (100%)

Avance de obra 84.56%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 16/05/203

PROVINCIA: LA VEGA

MUNICIPIO: LA VEGA

DISTRITO MUNICIPAL: EL RANCHITO



INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 16/05/203 se ha ejecutado 604.84 metros cuadrados de aceras y 940.80 metros lineales de contén, lo que corresponde al 84.56% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. Estas aceras y contenes estan bien realizadas y cumplen con lo establecido con el programa
2. No completa el cierre, de modo que por ende sera necesario hacer otro levantamiento para completar

IMÁGENES

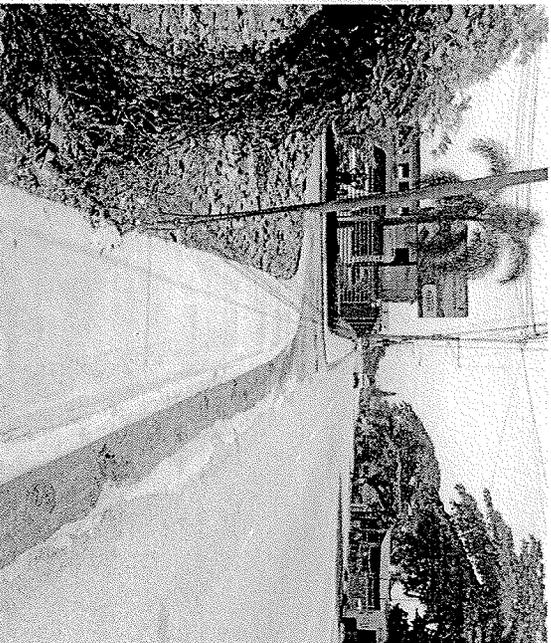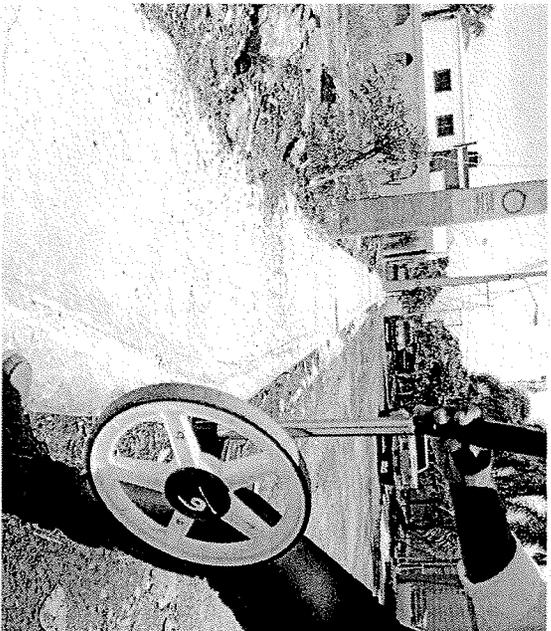



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

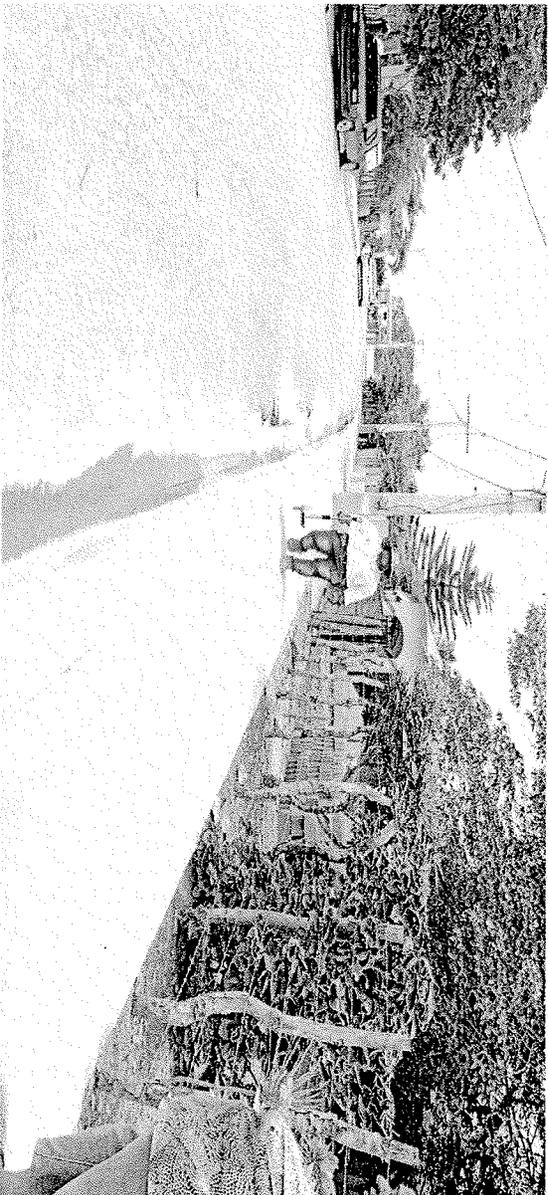

Suministra los datos de este reporte,


ARQ. KEILIN MORA
Técnico


ING. RICHARD CABRERA
Técnico
