



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE AVANCE DE OBRA

**CODIGO:** 130201  
**REGIÓN:** CIBAO SUR  
**PROVINCIA:** LA VEGA  
**MUNICIPIO:** CONSTANZA  
**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 29 de junio de 2023

**TÉCNICOS:**  
1. Ing. Staylin Mendoza  
2. Arq. Keilin Mora


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	ENTRADA EL EVANGELICO	41.60	0.76	2.00	68.90	2.00	63.56	137.80
TRAMO B	ENTRADA EL EVANGELICO	19.10	0.40	1.00	80.80	2.00	7.64	161.60
TRAMO C	ENTRADA EL EVANGELICO	39.95	0.83	2.00	45.35	2.00	65.94	90.70
TRAMO D	CIRIACO RAMIREZ (MATA DE MANGO)	245.60	1.00	2.00	245.60	2.00	491.20	491.20
TRAMO E	CIRIACO RAMIREZ CALLEJON 1 (MATA DE MANGO)				123.30	2.00		246.60
<b>Total</b>							<b>628.34</b>	<b>1,127.90</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 6,368,528.27

Monto desembolsado RD\$ 3,184,264.14 (50%)

Avance de obra 56.27%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** CIBAO SUR

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 29 de junio de 2023

**PROVINCIA:** LA VEGA

**MUNICIPIO:** CONSTANZA

**DISTRITO MUNICIPAL:** -


## **INFORME DE AVANCE DE OBRA**

A la fecha de 29/06/2023 se ha ejecutado 628.34 metros cuadrados de aceras y 1,127.90 metros lineales de contén, lo que corresponde al 56.27% del fondo asignado para este territorio.

## **NOTAS**



1. Esta obra fue ejecutada por contrato
2. Los contenes presentan buena terminación visual
3. Las aceras en casi su totalidad le hace falta el violín que lo divide los contenes.
4. En algunos de los tramos que se ejecutaron las acera tiene un ancho menor a 1mts debido al espacio disponible en dichos tramos.

## **IMÁGENES**

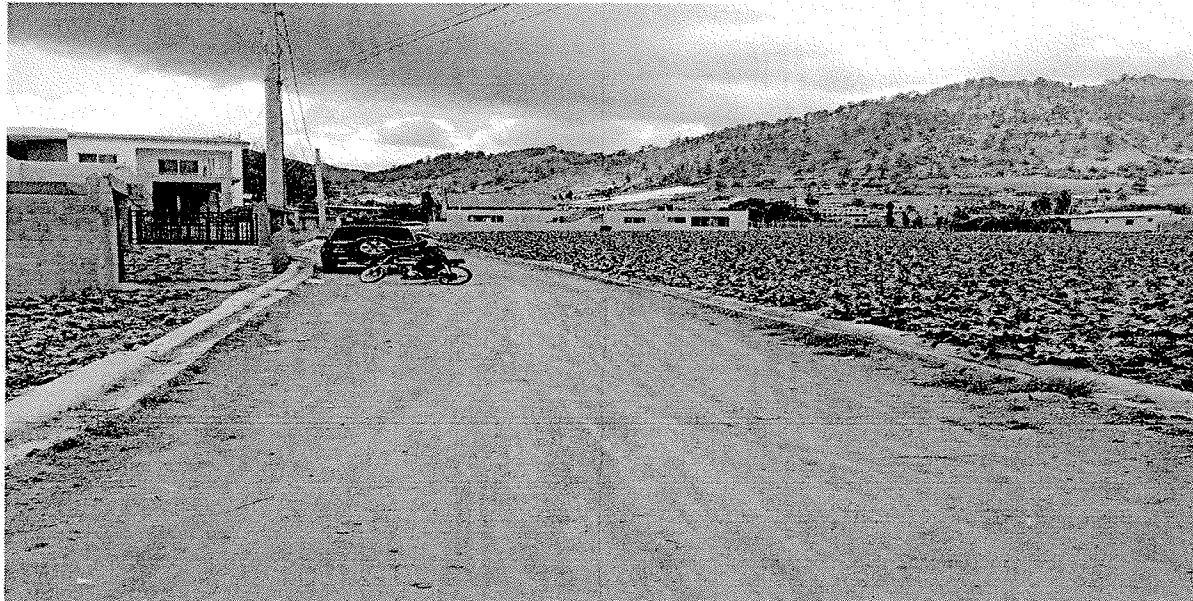





# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

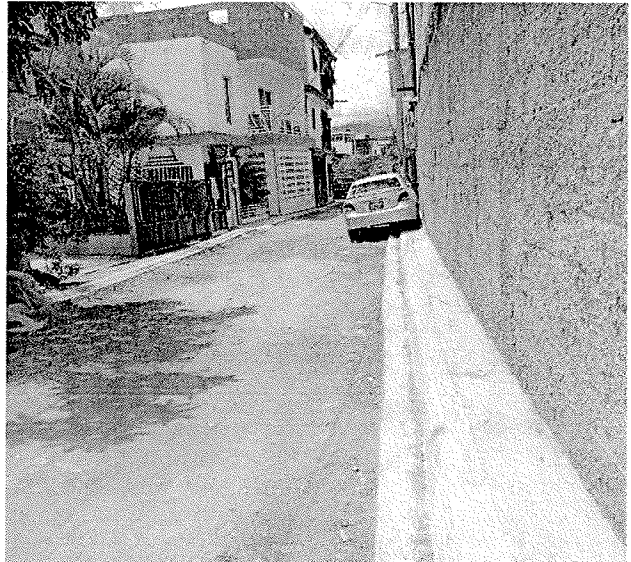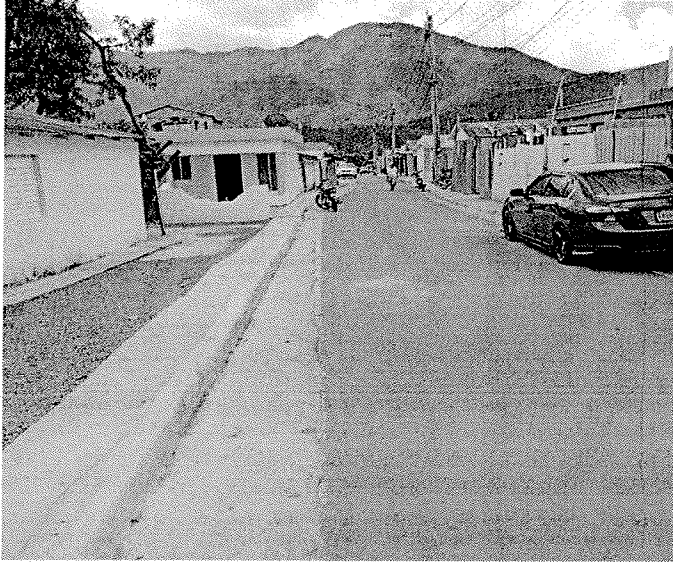

*Suministra los datos de este reporte,*

  
\_\_\_\_\_  
ING. STAYLIN MENDOZA  
Técnico

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. KEILIN MORA  
Técnico
