

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 130401
REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: LA VEGA
MUNICIPIO: JIMA ABAJO
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 26 de junio de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera
 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	DUARTE, iniciando en el puente Jima abajo (lateral izquierdo)	310.80	1.90	1.00			590.52	
TRAMO B	DUARTE, iniciando en el puente Jima abajo (lateral derecho)	150.70	4.12	1.00			620.88	
TRAMO C	C/ Caonabo independencia parte atras				82.50	2.00		165.00
TRAMO D	BARRIO RAFAEL				227.00	1.00		227.00
TRAMO E	SECTOR IMARIBA	45.50	1.00	1.00	45.50	1.00	45.50	45.50
TRAMO F		38.30	1.00	2.00	38.30	2.00	76.60	76.60
TRAMO G		318.00	0.85	1.00	380.20	1.00	270.30	380.20
TRAMO H	C/ LOS PATOS				43.00	1.00		43.00
TRAMO I	C/ AL LADO DEL PLAY	58.00	4.90	1.00			284.20	
Total							1,888.00	937.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,370,798.28
 Monto desembolsado RD\$ 4,370,798.29 (100%)
 Avance de obra 105.94%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 26 de junio de 2023

PROVINCIA: LA VEGA

MUNICIPIO: JIMA ABAJO

DISTRITO MUNICIPAL: -



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,888.00 metros cuadrados de aceras y 937.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. En esta visita se hizo un levantamiento de contenes donde observamos una buena terminación.
2. En algunos tramos de aceras no pudieron darle el ancho requerido por normas.

IMÁGENES

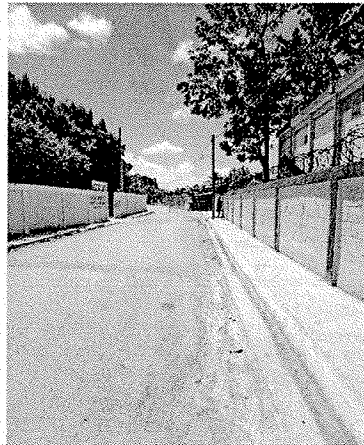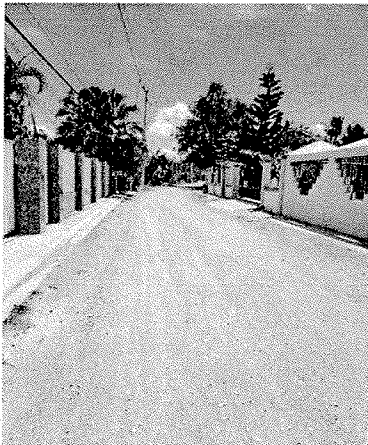



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

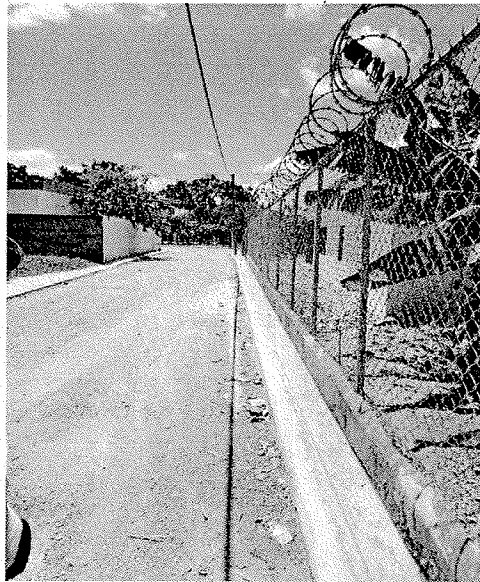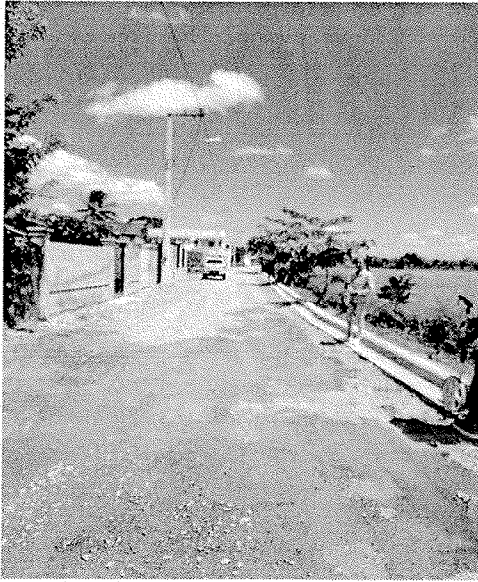

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico

FELIPE REYES
Técnico
