



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 140101

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: NAGUA

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 13/07/2022

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Av. María Trinidad Sánchez	280.00	1.00	1	280.00	1	280	280
TRAMO B	Av. María Trinidad Sánchez	188.90	1.50	1	188.90	1	283.35	188.9
TRAMO C	Av. María Trinidad Sánchez				219.50	1		219.5
TRAMO D	Casco Urbano(Detrás del Palacio de Justicia)	82.50	1.70	1			140.25	
TRAMO E	Casco Urbano(Alrededor del Palacio de Justicia)	124.80	1.50	1			187.2	
Total							890.8	688.4

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 7,011,012.11

Monto desembolsado RD\$ 3,505,506.06 (50%)

Avance de obra 43.10%



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 13/07/2022

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: MAGUA

DISTRITO MUNICIPAL: -


REPORTE

A la fecha de 13/07/2022 se ha ejecutado 890,80 metros cuadrados de aceras y 688,40 metros lineales de contén, lo que corresponde al 43,1% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Se esta ejecutando vía administración.
La obra se esta realizando a la salida del pueblo (Carr. Nagua-Cabrera), donde están implementado
2. un Ancho de Acera de 1,0 m, 1,50 m, 1,70 m y una altura de contén de 0,40 m, con área verdes incluidas.
3. En el Casco Urbano se hizo un remozamiento a las aceras y contenes alrededor del Palacio de Justicia.
4. La calidad de la obra es optima, están utilizando los materiales según requerimientos técnicos.

IMÁGENES

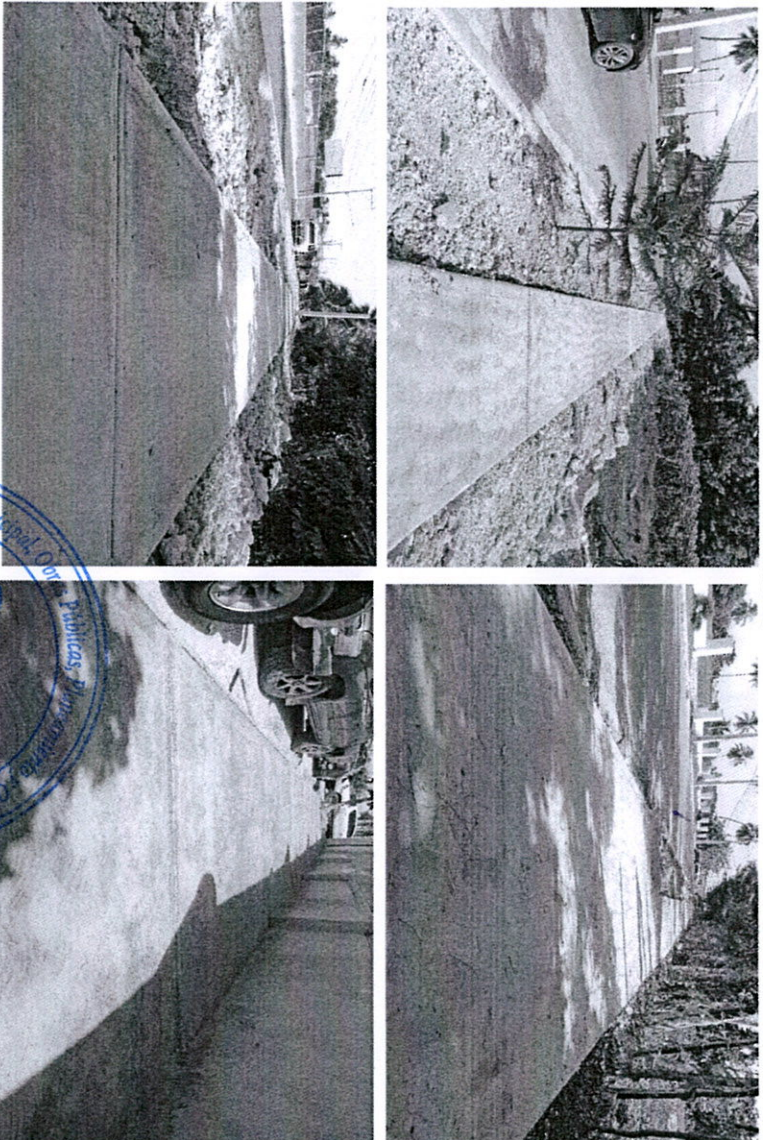

Suministra los datos de este reporte,


ING. DANILLO MERCADO
Técnico


CESAR DE LOS SANTOS
Técnico

