

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 140103

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: NAGUA

DISTRITO MUNICIPAL: LAS GORDAS

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de mayo de 2023

1. Ing. Edward Acosta

2. Elizabeth García

TÉCNICOS:

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR CANTA LA RANA	26.75	2.24	2	27.95	2	119.924	55.9
TRAMO B	C/ PRINCIPAL CANTA LA RANA	44.75	1.22	2	84.95	2	109.097	169.9
TRAMO C	EL TIZON				255.80	2		511.6
TRAMO D	LA PIRAGUA				552.95	2		1105.9
TRAMO E	EL RINCON DE LOS FENOS				365.1	2		730.2
TRAMO F	EL RICON DE LOS GINOS				267.4	2		534.8
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							229.02	3108.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,272,321.69

Monto desembolsado RD\$ 4,272,321.69 (100%)

Avance de obra 201.95%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORDESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de mayo de 2023

PROVINCIA: MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

MUNICIPIO: NAGUA

DISTRITO MUNICIPAL: LAS GORDAS



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 229.02 metros cuadrados de aceras y 3,108.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS




1. Las aceras y contenes construidos a la fecha presentan buena terminación y calidad constructiva.
2. Actualmente se evidenciaron tramos de contenes que fueron destruidos por equipos pesados de agric
3. La mayor parte de los recursos fueron destinados a la construcción de contenes.

IMÁGENES

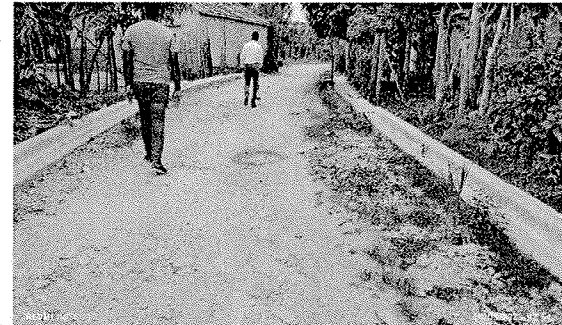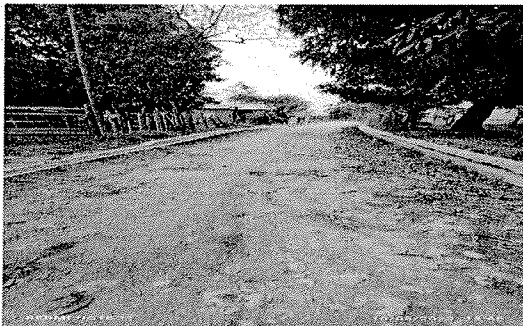



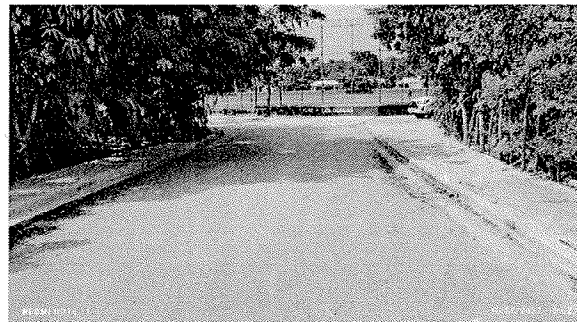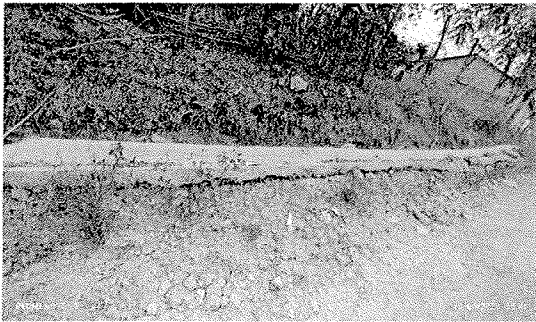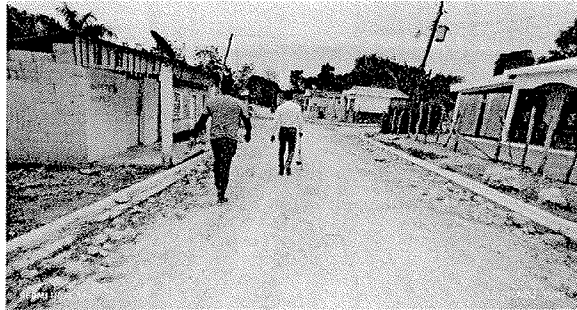

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING. EDWARD ACOSTA
Técnico


ELIZABETH GARCÍA
Técnico

Técnico
