



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 150201
REGIÓN: CIBAO NOROESTE
PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: CASTAÑUELAS
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de mayo de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera
2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calle Mauricio Baez	26.50	0.85	1.00	26.50	1.00	22.53	26.50
TRAMO B	Calle Mayen	25.50	1.00	1.00	25.50	1.00	25.50	25.50
TRAMO C	Calle Mayen	16.00	2.45	1.00	16.00	1.00	39.20	16.00
TRAMO D	Calle Mayen	44.00	1.00	1.00	44.00	1.00	44.00	44.00
TRAMO E	Calle la gringa	19.10	1.00	1.00	19.10	1.00	19.10	19.10
TRAMO F	Calle la gringa	22.65	1.00	1.00	22.65	1.00	22.65	22.65
TRAMO G	Calle Mayen	92.60	0.95	1.00	92.00	1.00	87.97	92.00
TRAMO H	Calle Mayen	119.60	1.20	1.00	119.60	1.00	143.52	119.60
TRAMO I	Calle Mayen	74.60	1.00	1.00	74.60	1.00	74.60	74.60
TRAMO J	Calle Mauricio Baez	53.10	1.00	1.00	53.10	1.00	53.10	53.10
TRAMO K	Calle Mauricio Baez	61.20	1.00	1.00	61.20	1.00	61.20	61.20
TRAMO L	Calle Mauricio Baez	30.90	1.00	1.00	30.90	1.00	30.90	30.90
TRAMO M	Calle Mauricio Baez	104.50	1.00	1.00	104.50	1.00	104.50	104.50
TRAMO N	Calle Orgibe Albarez	10.50	1.94	1.00	10.50	1.00	20.37	10.50
TRAMO O	Calle Orgibe Albarez	80.60	1.08	1.00	80.60	1.00	87.05	80.60
TRAMO P	Calle Orgibe Albarez	12.30	0.80	1.00	12.30	1.00	9.84	12.30
TRAMO Q	CALLE JOSE PEÑA GOMEZ	175.80	0.80	1.00	263.80	1.00	140.64	263.80
TRAMO R	Calle Orgibe Albarez	77.90	1.00	1.00	77.90	1.00	77.90	77.90
TRAMO S								
Total							1,064.56	1,134.75

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,633,416.84
Monto desembolsado RD\$ 3,633,416.84 (100%)
Avance de obra 115.08%



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 10 de mayo de 2023

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: CASTAÑUELAS

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,064.56 metros cuadrados de aceras y 1,134.75 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Algunas zonas tienen mas metros de contenes ,pero cumplen ambos metraje asignado.
2. En esta inspeccion cumplen con los parametros recomendados por el programa.

IMÁGENES

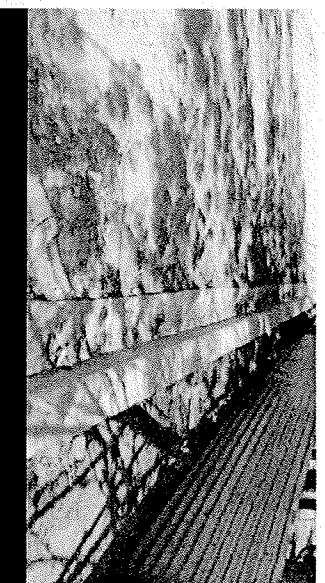



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA
Técnico

FELIPE REYES
Técnico
