



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 170106

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: PERAVIA

MUNICIPIO: BANÍ

DISTRITO MUNICIPAL: VILLA SOMBRERO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de octubre de 2022

1. Ing. Staylin Mendoza

TÉCNICOS: 2. Felipe Reyes


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE INMACULADA CONCEPCION	164.50	0.96	1	174.80	1	157.92	174.8
TRAMO B	CALLE INMACULADA CONCEPCION	78.10	1.00	1	78.10	1	78.1	78.1
TRAMO C	CALLE MAXIMO GOMEZ	501.35	1.00	2	1,013.90	1	1007.629273	1013.9
TRAMO D								
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1243.65	1266.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,469,216.88

Monto desembolsado RD\$ 3,469,216.88 (100%)

Avance de obra 140.16%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de octubre de 2022

PROVINCIA: PERAVIA

MUNICIPIO: BANI

DISTRITO MUNICIPAL: VILLA SOMBRERO

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,243.65 metros cuadrados de aceras y 1,266.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.


NOTAS

1. Se ejecutó de manera adecuada, la ejecución de la aceras como la de contenes.
2. Uno de los tramos debido a agua subterránea se deterioro. Es aproximadamente 15 metro de acera, los cual el contratista se comprometió a corregirla.
3. Este proyecto fue adjudicado por contrato a una compañía constructora.



IMÁGENES



REDMIANO EN AV
ALCALDÍA CAYEY




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

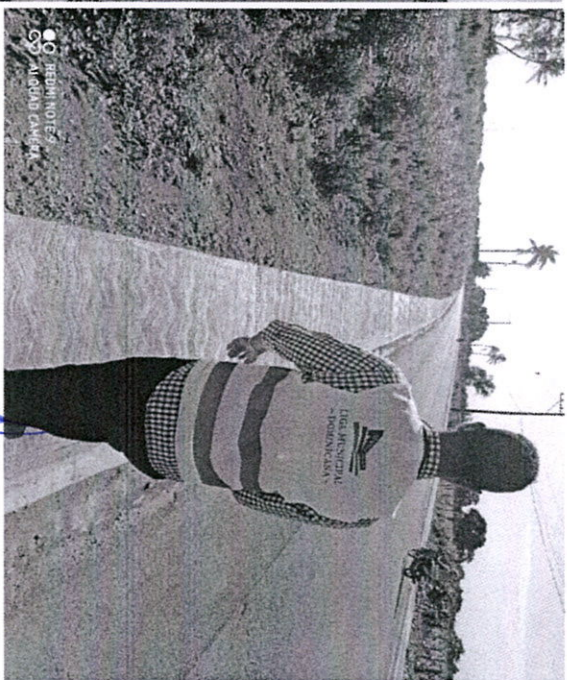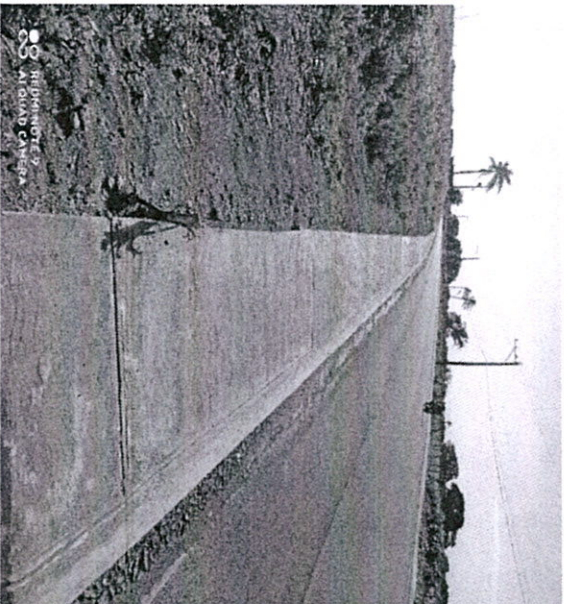

Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico


FELIPE REYES
Técnico

