



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 180103

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: PUERTO PLATA

MUNICIPIO: PUERTO PLATA

DISTRITO MUNICIPAL: MAIMÓN

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de junio de 2023

1. Ing. Staylin Mendoza

2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR LOS TEJADA CALLE 1RA				37.90	2		75.8
TRAMO B	SECTOR LOS TEJADA CALLE 1RA	270.20	1.00	2	308.65	2	540.4	617.3
TRAMO C	SECTOR LOS TEJADA CALLE 2DA				23.30	2		46.6
TRAMO D	SECTOR LOS TEJADA CALLE 3RA	31.50	1.00	2	103.90	2	63	207.8
TRAMO E	SECTOR LOS TEJADA CALLE 4TA	185.05	1.00	2	272.45	2	370.1	544.9
Total							973.50	1492.40

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,962,742.38

Monto desembolsado RD\$ 2,481,371.19 (50%)

Avance de obra 100.32%



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 22 de junio de 2023

PROVINCIA: PUERTO PLATA

MUNICIPIO: PUERTO PLATA

DISTRITO MUNICIPAL: MAIMÓN

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 973.50 metros cuadrados de aceras y 1,492.40 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Esta obra fue ejecutada por contrato
2. Tanto la construcción de aceras como de contenes presentan una buena terminación.
3. En algunos de los tramos se tubo que construir muro de encache para el soporte de las aceras.
4. En algunos de los tramos se vio la necesidad de utilizar gran volumen de relleno bajo acera.
5. La obra completa fue ejecutada en un sector totalmente virgen.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

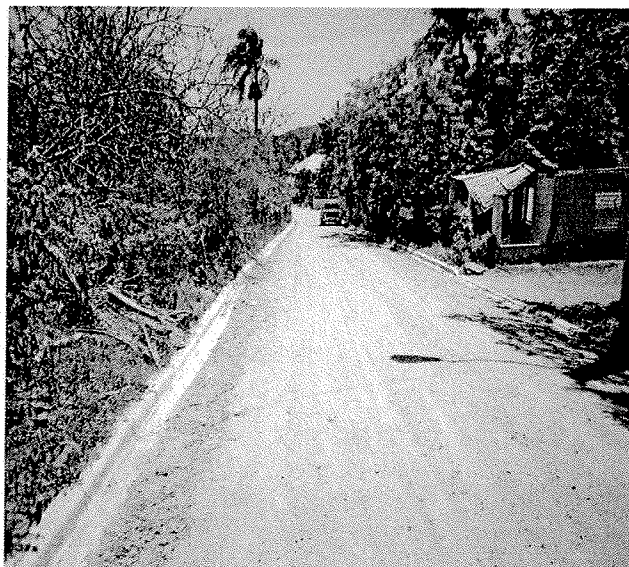

Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico


FELIPE REYES
Técnico

