

# LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 180702

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: PUERTO PLATA

MUNICIPIO: SOSÚA

DISTRITO MUNICIPAL: CABARETE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 26 de mayo de 2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera

2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	c/ PRINCIPAL	607.30	1.60	1.00	1,248.80	1.00	971.68	1,248.80
Total							971.68	1,248.80


### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,190,655.53

Monto desembolsado RD\$ 2,095,327.77 (50%)

Avance de obra 104.04%

# LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 26 de mayo de 2023

REGIÓN: CIBAO NORTE  
PROVINCIA: PUERTO PLATA  
MUNICIPIO: SOSÚA  
DISTRITO MUNICIPAL: CABARETE


## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 971.68 metros cuadrados de aceras y 1,248.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## NOTAS

1. Cumplen con lo recomendado por el programa .
2. Realizarán más contenes y estos están con adoquines por vía de otros.

## IMÁGENES

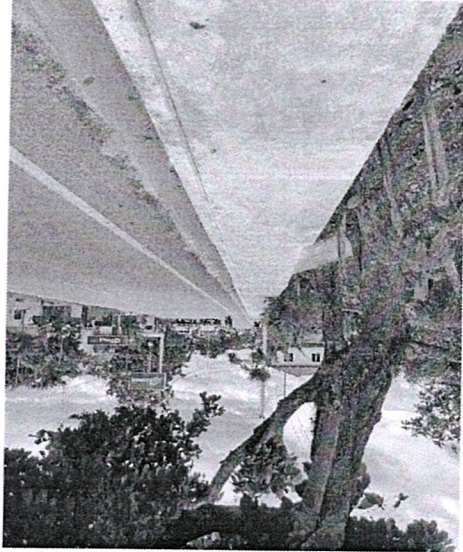

Técnico  
FELIPE REYES



Técnico  
ING. RICHARD CABRERA



Suministra los datos de este reporte,

LIGA MUNICIPAL  
—DOMINICANA—

