

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 090501

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: SAN VÍCTOR

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de junio de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Danilo Mercado

2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/Los Rieles				236.60	1.00		236.60
TRAMO B	C/Los Rieles				330.20	1.00		330.20
TRAMO C	C/Los Rieles				125.80	1.00		125.80
TRAMO D	C/Los Rieles				114.20	1.00		114.20
TRAMO E	C/Los Rieles				240.80	1.00		240.80
TRAMO F	C/Los Rieles				107.60	1.00		107.60
TRAMO G	C/Los Rieles				301.80	1.00		301.80
TRAMO H	C/Los Rieles				374.00	1.00		374.00
TRAMO I	C/Los Rieles				238.00	1.00		238.00
TRAMO J								
Total							-	2,069.00


AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,885,089.03

Monto desembolsado RD\$ 4,885,089.03 (100%)

Avance de obra 107.13%

LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 8 de junio de 2022

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: SAN VÍCTOR

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,069.00 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.


NOTAS

1. manifestó que el metro lineal de contén lo están realizando por debajo de \$1,500 por ende pueden hacer mas metrajes.
2. Observamos que la plantilla utilizada está por debajo a la recomendada según los requerimientos técnicos.
3. También se le comentó que el relleno utilizado debes de estar por debajo del borde del contén.


IMÁGENES






Técnico
CÉSAR DE LOS SANTOS



Técnico
ING. DANILLO MERCADO



Suministra los datos de este reporte,

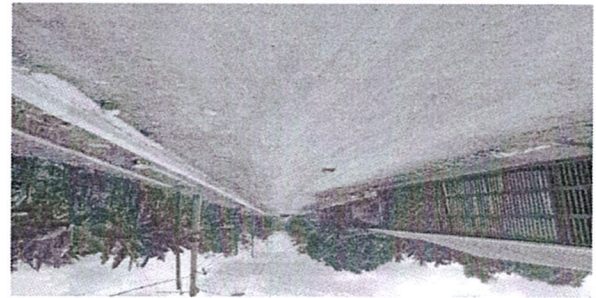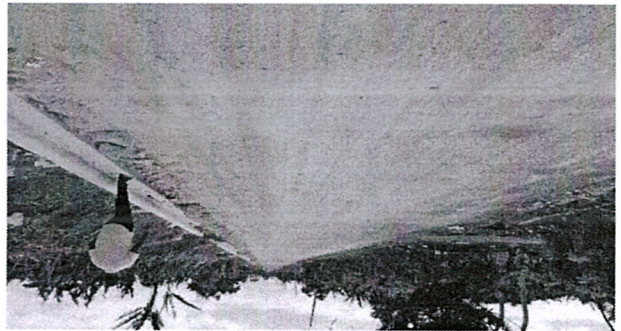

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

