



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 320601

REGIÓN: OZAMA

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: LOS ALCARRIZOS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de enero de 2023

TÉCNICOS:

1. Ing. Richard Cabrera
2. Ing. Félix Tavárez
3. Arq. Yarissa Pérez
4. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (3,4)	35.60	1.00	1	56.10	1	35.6	56.1
TRAMO B	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (5,6)	35.60	0.90	1	36.70	1	32.04	36.7
TRAMO C	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (7,8)	27.70	0.90	1	27.70	1	24.93	27.7
TRAMO D	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (9,10)	9.00	0.75	1	18.9	1	6.75	18.9
TRAMO E	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (11,12)	118.50	0.75	1	145.4	1	88.875	145.4
TRAMO F	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (13,14)	44.30	0.75	1	44.3	1	33.225	44.3
TRAMO G	BARRIO LA ESMERALDA. C/ ÁMBAR. (16,17)	17.80	1.00	1	17.8	1	17.8	17.8
TRAMO H	CALLE CRISTAL (18,19)	31.50	1.00	1	35	1	31.5	35
TRAMO I	CALLE CRISTAL (20,21)				36.2	1		36.2
TRAMO J	CALLE CRISTAL (22,23)	22.00	0.60	1	22	1	13.2	22
TRAMO K	CALLE CRISTAL (24,25)	34.90	1.00	1	34.9	1	34.9	34.9
TRAMO L	CALLE CRISTAL (26,27)	32.20	0.70	1	32.2	1	22.54	32.2
TRAMO M	CALLE JADE(28,29)	4.40	0.94	1	30.2	2	4.136	60.4
TRAMO N	CALLE JADE(30,31)				18.5	1		18.5
TRAMO O	CALLE JADE(32,33)	11.30	0.88	1			9.944	
TRAMO P	CALLE JADE(34,35)	81.50	0.81	1	82.3	1	66.015	82.3
TRAMO Q	CALLE JADE(36,37)	48.50	0.76	1	55.4	1	36.86	55.4
TRAMO R	CALLE CORDALINA(38,39)	44.80	0.60	1	69.8	2	26.88	139.6
TRAMO S	CALLE RESPALDO JADE(40,41)				2.9	1		2.9



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO T	CALLE GEMA (42,43)	3.70	1.00	1	3.7	1	3.7	3.7
TRAMO U	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (44,45)	17.00	1.00	1	17	1	17	17
TRAMO V	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA(46,47)	19.70	1.00	1	32.3	1	19.7	32.3
TRAMO W	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (48,49)	31.12	1.00	1	34.6		31.12	
TRAMO X	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (50,51)	100.60	1.00	1	100.6	2	100.6	201.2
TRAMO Y1	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (52,53)	8.40	1.00	1	8.4	1	8.4	8.4
TRAMO Z1	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (54,55)	28.10	1.00	1	28.1	1	28.1	28.1
TRAMO AA	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (56,57)	27.80	1.00	1	27.8	1	27.8	27.8
TRAMO AB	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (58,59)	28.20	1.00	1	28.2	1	28.2	28.2
TRAMO AC	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (60,61)	18.10	1.00	1	18.11	1	18.1	18.11
TRAMO AD	BARRIO VILLA PROGRESO. CALLE PRINCESA (62,63)	23.40	1.00	1	23.4	1	23.4	23.4
TRAMO AE	CALLE SÁNCHEZ (68,67)	24.20	0.80	2	24.2	2	38.72	48.4
TRAMO AF	CALLE SÁNCHEZ (70,71)	7.30	0.80	1	7.3	1	5.84	7.3
TRAMO AG	CALLE SÁNCHEZ (72,73)	71.20	0.80	2	71.2	2	113.92	142.4
TRAMO AH	CALLE SÁNCHEZ (74,75)	10.10	0.60	1	10.1	1	6.06	10.1
TRAMO AI	CALLE SÁNCHEZ (76,77)	17.30	1.00	1	17.3	1	17.3	17.3
TRAMO AJ	CALLE SÁNCHEZ (78,79)	10.50	0.80	1	13.9	1	8.4	13.9
TRAMO AK	CALLE SÁNCHEZ (80,81)	27.90	1.00	1	27.9	1	27.9	27.9
TRAMO AL	CALLE SÁNCHEZ (82,83)	21.60	0.80	1	21.6	1	17.28	21.6
TRAMO AM	CALLE SÁNCHEZ (84,85)	12.20	0.80	1	12.2	1	9.76	12.2
TRAMO AN	CALLE SÁNCHEZ (86,87)	26.40	0.80	2	26.4	2	42.24	52.8
TRAMO AO	CALLE SÁNCHEZ (88,89)	11.10	0.80	1	11.1	1	8.88	11.1
TRAMO AP	CALLE SÁNCHEZ (90-91)	35.50	0.90	1	32	2	31.95	64
TRAMO AQ	CALLE JUAN PABLO (92,93)	90.90	0.80	1	134.3	2	72.72	268.6
TRAMO AR	CALLE HERMANOS DELINE (96,97)				2.8	2		5.6



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO AS	CALLE BOY SCOUT 3ERA (100,101)				3.6	2		7.2
TRAMO AT	CALLE BOY SCOUT 2DA (104,105)				45.7	2		91.4
TRAMO AU	CALLE BOY SCOUT 1ERA (108,109)	14.10	0.80	2	14.1	2	22.56	28.2
TRAMO AV	CALLE BOY SCOUT 1ERA (110,111)	29.55	0.80	2	29.55	2	47.28	59.1
TRAMO AW	BARRIO JUANA SALTITOPA. CALLEJON EL CANAL	294.60	0.81	1	424.8	1	238.626	424.8
TRAMO AX	BARRIO JUANA SALTITOPA. PROLONGACION 17 (L.I.)	205.80	1.11	1	224.3	1	228.549	224.3
TRAMO AY	BARRIO JUANA SALTITOPA. PROLONGACION 17 (L.D.)	192.60	1.17	1	192.6	1	225.342	192.6
TRAMO AZ	BARRIO JUANA SALTITOPA. RESPALDO 17	105.40	0.76	1	101.9	2	80.104	203.8
TRAMO BA	BARRIO JUANA SALTITOPA. CALLE LA TORRE	606.00	0.96	1	652	1	581.76	652
TRAMO BB	BARRIO JUANA SALTITOPA. CALLE RUDELANIA	8.40	1.06	1	40.2	1	8.904	40.2
TRAMO BC	BARRIO JUANA SALTITOPA. CALLE RESPALDO 6, LOS LIBERTADORES	137.30	0.89	1	137.3	1	122.197	137.3
TRAMO BD	BARRIO JUANA SALTITOPA. CALLE LOS CUERVOS				21.7	1		21.7
TRAMO BE	BARRIO JUANA SALTITOPA. CALLE MARI SOL	120.80	0.78	1	140.1	1	94.224	140.1
TRAMO BF	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE PRINCIPAL	183.60	1.22	1	183.6	1	223.992	183.6
TRAMO BG	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LOS PROFESORES	321.60	1.03	1	321.6	1	331.248	321.6
TRAMO BH	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LA POLLA	133.50	1.00	2	133.5	2	267	267
TRAMO BI	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LA FAMILIA	434.60	1.11	1	434.6	1	482.406	434.6
TRAMO BJ	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE DE LEON	230.60	0.97	1	230.4	1	223.682	230.4



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO BK	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LOS REYES	195.80	1.50	1	195.8	1	293.7	195.8
TRAMO BL	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LAS FLORES	184.20	1.50	1	184.2	1	276.3	184.2
TRAMO BM	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE PINEDA	315.60	1.86	1	315.6	1	587.016	315.6
TRAMO BN	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LAS MERCEDES	240.20	1.59	1	240.2	1	381.918	240.2
TRAMO BO	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE SOSA	289.20	0.60	1	301.2	1	173.52	301.2
TRAMO BP	BARRIO LAS MERCEDES. CALLE LA YENI	156.60	1.00	1	156.6	1	156.6	156.6
Total							6239.21	7011.21

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 25,008,585.40

Monto desembolsado RD\$ 25,008,585.41 (100%)

Avance de obra 104.29%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: LOS ALCARIZOS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 20 de enero de 2023



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 6,239.21 metros cuadrados de aceras y 7,011.21 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS






1. En la construcción de las aceras y contenes, algunos tramos no lucían tan recientes de haberlos construidos.
2. Se observó en la visita técnica realizada, que exceden el metraje asignado por la variación de precio unitario estimado por la institución.
3. En la construcción de las aceras y contenes, estos cumplen con las especificaciones que se plantean en programa que lleva la Liga Municipal Dominicana.
4. Se le hizo la observación de que al momento de hacer el vaciado del hormigón deben realizar una limpieza previa del retiro del material orgánico inservible.


IMÁGENES

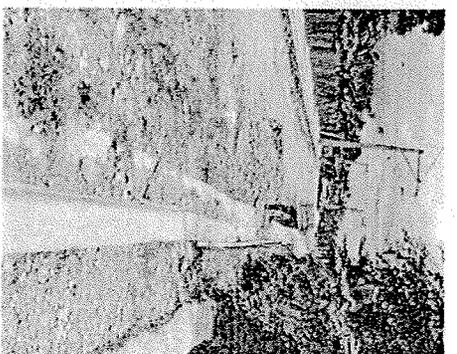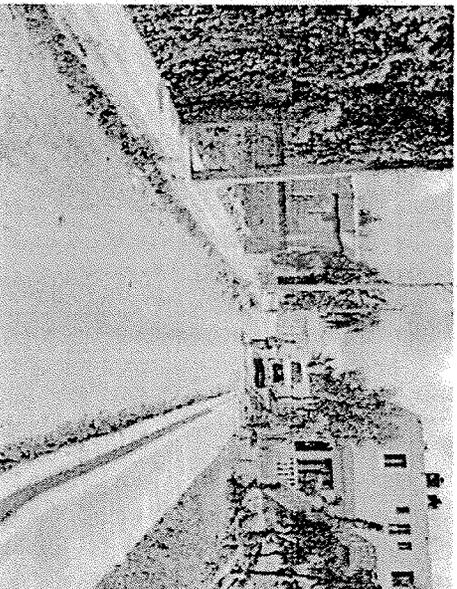






LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

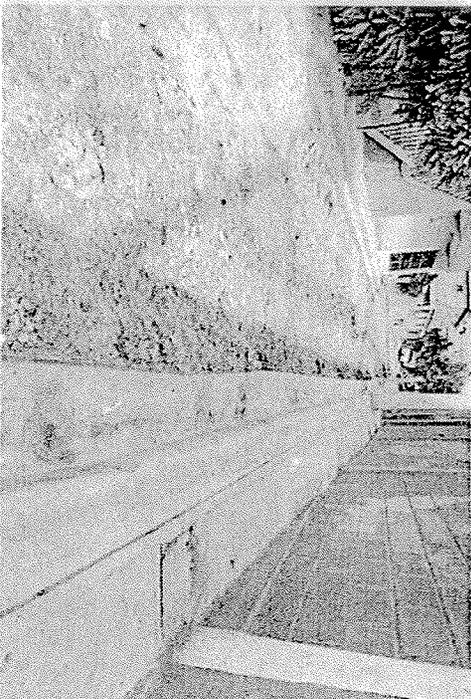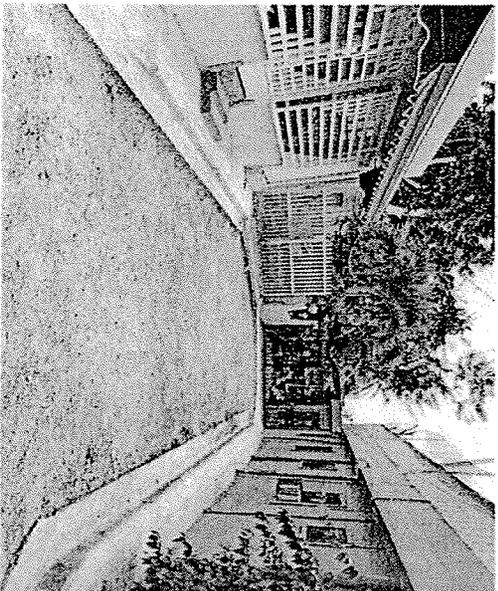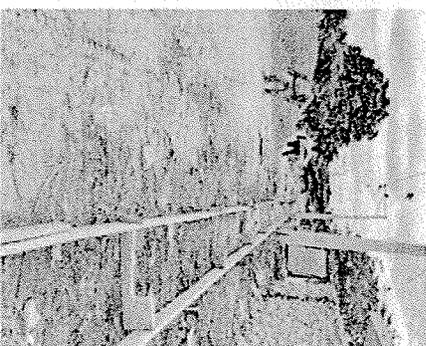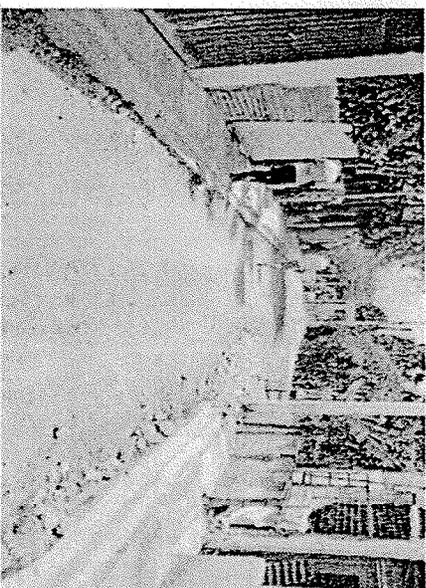



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

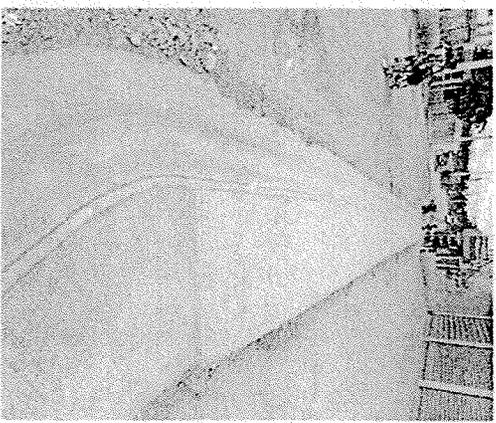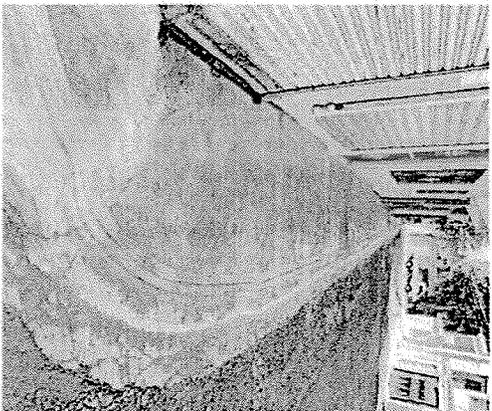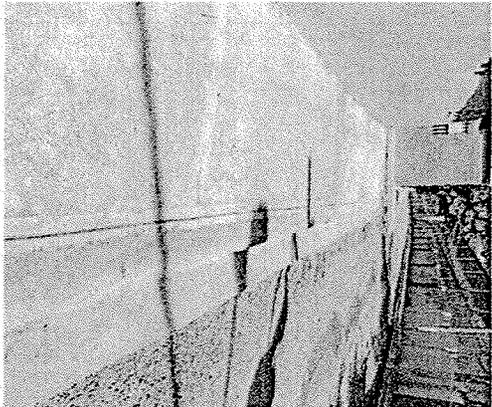


Suministra los datos de este reporte,


ING. RICHARD CABRERA

Técnico



ING. EÉLIX TAVAREZ

Técnico




ARQ. YARISSA PEREZ

Técnico


ING. DANILLO MERCADO

Técnico
