



**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**  
**INFORME DE AVANCE DE OBRA**

**CODIGO:** 040401  
**REGIÓN:** ENRIQUILLO  
**PROVINCIA:** BARAHONA  
**MUNICIPIO:** PARAÍSO  
**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 2 de agosto de 2023

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Staylin Mendoza  
 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ PADRE BILLINI (CENTRO CIUDAD)	71.50	1.71	1.00			122.44	
TRAMO B	LATERAL DE LA ESCUELA	79.70	1.23	1.00			98.03	
TRAMO C	SAN RAFAEL (CENTRO COMUNAL)				11.30	1.00		11.30
TRAMO D	SAN RAFAEL (CENTRO COMUNAL)				97.20	2.00		194.40
TRAMO E	SAN RAFAEL (ENTRADA LA CANCHA)				106.60	1.00		106.60
TRAMO F	C/ PADRE BILLINI (CENTRO CIUDAD)	98.00	1.65	1.00			161.70	
TRAMO G	FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MENCIA	59.30	1.65	1.00			97.85	
TRAMO H	ENTRANDO POR EL HOTEL SAN RAFAEL				93.00	1.00		93.00
TRAMO I								
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>480.01</b>	<b>405.30</b>

**AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA**

Monto asignado RD\$ 3,825,055.76  
 Monto desembolsado RD\$ 1,912,527.88 (50%)  
 Avance de obra 43.33%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN: ENRIQUILLO**

**FECHA DE VISITA TÉCNICA: 2 de agosto de 2023**

**PROVINCIA: BARAHONA**

**MUNICIPIO: PARAÍSO**

**DISTRITO MUNICIPAL: -**

## **INFORME DE AVANCE DE OBRA**

A la fecha de 02/08/2023 se ha ejecutado 480.01 metros cuadrados de aceras y 405.30 metros lineales de contén, lo que corresponde al 43.33% del fondo asignado para este territorio.

### **NOTAS**


1. Estas aceras y contenes se observan con buena terminación.
2. Lo Plasmado aquí es lo construido hasta el momento.

### **IMÁGENES**






# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

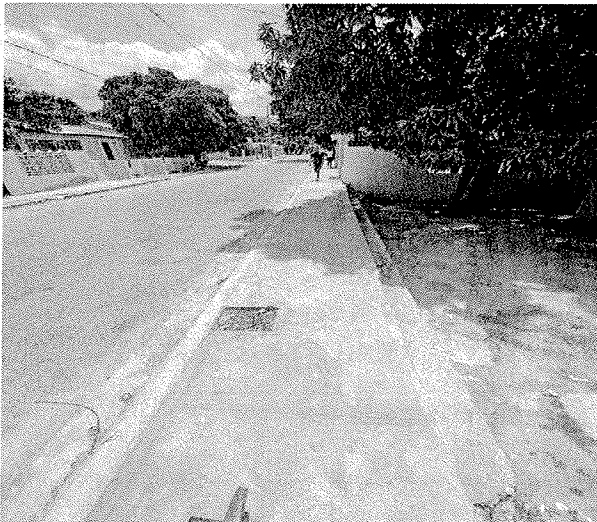

*Suministra los datos de este reporte,*

  
ING. STAYLIN MENDOZA  
Técnico

  
CÉSAR DE LOS SANTOS  
Técnico
