

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 210401
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL
MUNICIPIO: CAMBITA GARABITOS
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de enero de 2024
TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
 2. Felipe Reyes

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LA TORONJA	258.20	1.02	1.00	239.00	1.00	263.36	239.00
TRAMO B	LA TORONJA	113.80	1.00	1.00	113.80	1.00	113.80	113.80
TRAMO C	LA TORONJA	133.00	1.00	1.00	133.00	1.00	133.00	133.00
TRAMO D	LA TORONJA	45.00	3.06	1.00				137.70
TRAMO E	LA TORONJA	92.80	1.00	1.00	110.70	1.00	92.80	110.70
TRAMO F	EL CAJON	71.40	1.00	2.00	71.40	2.00	142.80	142.80
TRAMO G	EL CAJON	73.40	1.00	2.00	73.40	2.00	146.80	146.80
TRAMO H	EL CAJON	47.80	1.15	1.00	69.35	2.00	54.97	138.70
TRAMO I	EL MURO	165.50	1.00	2.00	165.50	2.00	331.00	331.00
Total							1,416.23	1,355.80

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,846,696.17
 Monto desembolsado RD\$ 4,846,696.18 (100%)
 Avance de obra 109.64%



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESA

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: CAMBITA GARABITOS

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de enero de 2024

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,416.23 metros cuadrados de aceras y 1,355.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Los trabajos están siendo ejecutados por contrato
2. Tienen buena terminación tanto las aceras como los contenes.
3. El tramo D, las aceras fueron construidas en la calzada.
4. Los tramos F Y G, las aceras fueron construidas en la calzada.

IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

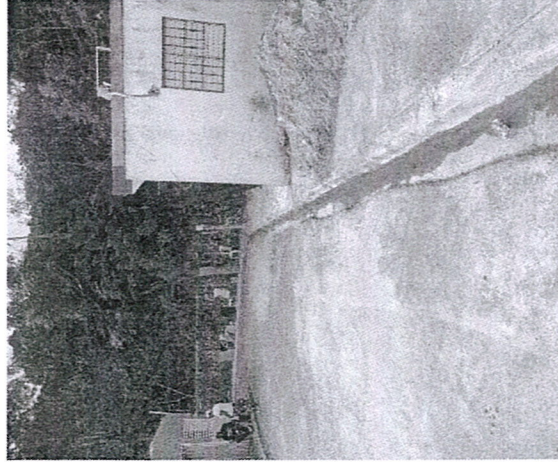

Suministra los datos de este reporte,




ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico



FÉLPE REYES

Técnico

