



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 090107

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: MOCA

DISTRITO MUNICIPAL: EL HIGÜERITO

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 28 de abril de 2022

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. Ing. Staylin Mendoza


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Calle Anis Castillo				349.40	1		349.4
TRAMO B	Calle Anis Castillo				341.00	1		341
TRAMO C	Calle Ahoga Sapo				184.70	1		184.7
TRAMO D	Calle Ahoga Sapo				186	1		186
TRAMO E	Calle Coronel Lora Fernandez	14.70	1.01	1			14.847	
TRAMO F	Calle Coronel Lora Fernandez	23.30	0.55	1			12.815	
TRAMO G	Calle Coronel Lora Fernandez	20.40	1.35	1			27.54	
TRAMO H	Calle Coronel Lora Fernandez	41.00	1.29	1			52.89	
TRAMO I	Calle Coronel Lora Fernandez	44.40	0.88	1			39.072	
TRAMO J	Calle Coronel Lora Fernandez	236.40	1.35	1			319.14	
TRAMO K	Calle Coronel Lora Fernandez	54.80	0.79	1			43.292	
TRAMO L	Calle Coronel Lora Fernandez	174.00	1.25	1			217.5	
Total							727.096	1061.1

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,655,649.99

Monto desembolsado RD\$ 1,827,825.00 (50%)

Avance de obra 98.01%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

PROVINCIA: ESPAILLAT

MUNICIPIO: MOCA

DISTRITO MUNICIPAL: EL HIGÜERITO

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 28 de abril de 2022


REPORTE

A la fecha de 28/04/2022 se ha ejecutado 727.10 metros cuadrados de aceras y 1,061.10 metros lineales de contén, lo que corresponde al 98.01% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. Este distrito municipal esta ejecutando por administracion.
2. En el Sector La Guazuma y Las Palmitas solo se ejecutaron contenes, y en el casco urbano en la Calle Coronel Lora Fernandez solo se ejecutaron aceras.
3. Las aceras no estan uniforme debido al poco espacio que tienen, ya que la mayoría de las viviendas estan construidasin respetar los linderos. Estas tienen un ancho desde 0.55 m hasta 1.25 m.

IMÁGENES

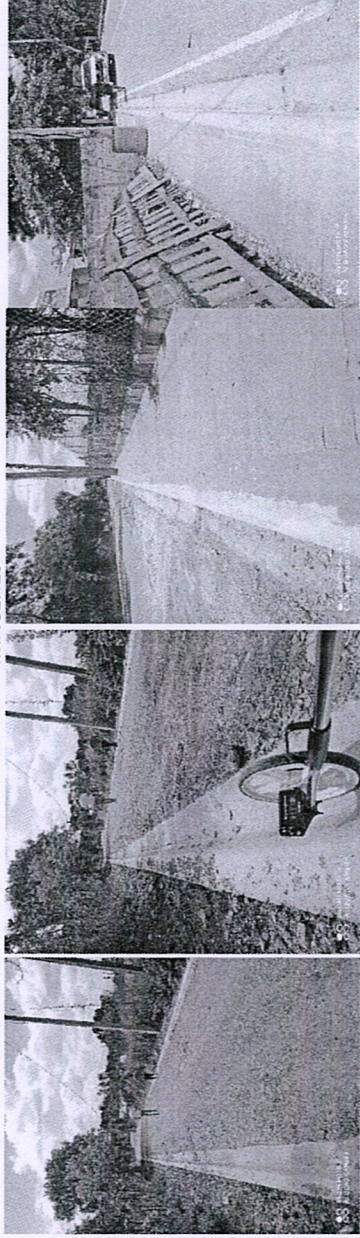


Suministra los datos de este reporte,



ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico



ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

