

# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**CODIGO:** 100202

**REGIÓN:** ENRIQUILLO

**PROVINCIA:** INDEPENDENCIA

**MUNICIPIO:** DUVERGÉ

**DISTRITO MUNICIPAL:** VENGAN A VER

**FECHA DE ÚLTIMA VISITA:** 9 de septiembre de 2022

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Staylin Mendoza

2. Ing. Asamín Ferreras


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/Duarte	66.90	1.20	1	32.20	1	80.28	32.2
TRAMO B	C/Duarte	140.90	1.20	1	140.90	1	169.08	140.9
TRAMO C	C/Duarte	193.70	1.20	1	205.70	1	232.44	205.7
TRAMO D	C/Duarte	51.70	1.14	1	91.9	1	58.938	91.9
TRAMO E	C/Duarte	119.70	1.20	1	119.7	1	143.64	119.7
TRAMO F	C/Duarte				162.7	1		162.7
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>684.378</b>	<b>753.1</b>

#### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,900,265.12

Monto desembolsado RD\$ 1,450,132.57 (50%)

Avance de obra 97.13%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

## SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: ENRIQUILLO  
PROVINCIA: INDEPENDENCIA  
MUNICIPIO: DUVERGÉ  
DISTRITO MUNICIPAL: VENGAN A VER

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 9 de septiembre de 2022


### REPORTE


A la fecha de 09/09/2022 se ha ejecutado 684.38 metros cuadrados de aceras y 753.10 metros lineales de contén, lo que corresponde al 97.13% del fondo asignado para este territorio.

### NOTAS

1. La cantidad de aceras no corresponde a la cantidad de contenes debido a que se esta ejecutando con un ancho promedio de 1.20m por ser una avenida principal.
2. Tanto las aceras como contenes presente buena calidad visualmente.
3. Se estan ejecutando rampas para discapacitados, aunque se le recomiendo aumentar el ancho de estas y no dejarle tropesones con relacion a la plancha de contén.

### IMÁGENES

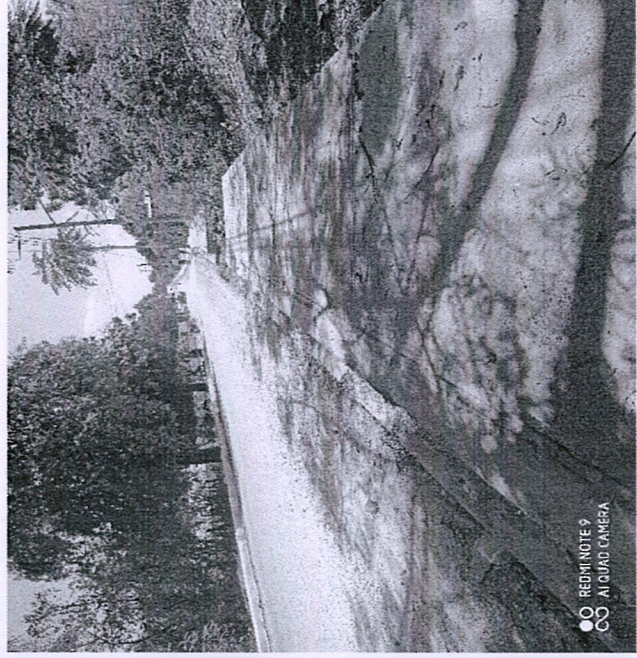




LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

Suministra los datos de este reporte.

  
ING. STAYLÍN MENDOZA

Técnico

  
ING. ASAMÍN FERRERAS

Técnico
