

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 210402

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: CAMBITA GARABITOS

DISTRITO MUNICIPAL: CAMBITA EL PUEBLECITO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29 de agosto de 2023

1. Elizabeth García

TÉCNICOS: 2. Arq. Zunilda Del Rosario


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/TRINITARIA	537.40	1.55	1.00	546.60	1.00	832.97	546.60
TRAMO B	LA GUAMA				179.80	2.00		359.60
TRAMO C	C/LOS MAESTROS	36.90	0.86	1.00	36.90	1.00	31.73	36.90
TRAMO D	C/NUESTRA SRA. DE LA ALTAGRACIA	272.34	1.26	1.00	273.30	1.00	343.15	273.30
TRAMO E	C/ANTONIO DIONISIO	9.00	1.25	1.00	9.00	1.00	11.25	9.00
TRAMO F	C/HERMANAS MIRABAL	24.50	1.04	1.00	24.50	1.00	25.48	24.50
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1,244.58	1,249.90

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,734,713.25

Monto desembolsado RD\$ 1,867,356.63 (50%)

Avance de obra 129.06%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIÁ

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: CAMBITA GARABITOS

DISTRITO MUNICIPAL: CAMBITA EL PUEBLECITO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29 de agosto de 2023


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,244.58 metros cuadrados de aceras y 1,249.90 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. Al momento de nuestra visita técnica la obra estaba ejecutada en su totalidad.
2. Esta obra se ejecutó por contrato.

IMÁGENES

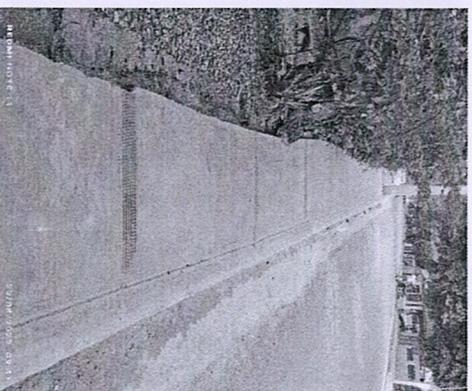



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

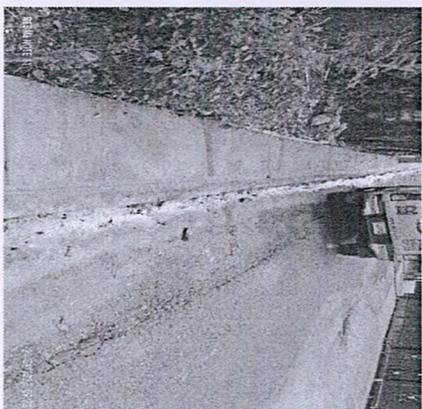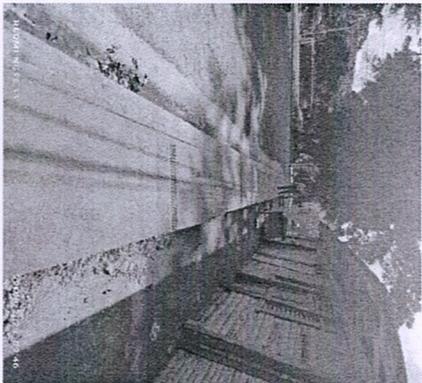

Suministra los datos de este reporte,

Elizabeth G.
ELIZABETH GARCÍA
Técnico

Zunilda Del Rosario G.
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO
Técnico
