



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 170104

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: PERAVIA

MUNICIPIO: BANÍ

DISTRITO MUNICIPAL: SABANA BUEY

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de mayo de 2023

1. Ing. Ana Indhira Ramírez

TÉCNICOS: 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	La Altagracia	62.50	1.00	1.00	62.50	2.00	62.50	125.00
TRAMO B	La Altagracia	91.90	1.00	1.00	91.90	2.00	91.90	183.80
TRAMO C	La Libertad	70.50	1.00	1.00	70.50	2.00	70.50	141.00
TRAMO D	La Libertad	66.40	1.00	1.00	66.40	2.00	66.40	132.80
TRAMO E	La Estancia	98.00	1.00	1.00	98.00	2.00	98.00	196.00
TRAMO F	Santa Fe (La Iglesia)	51.40	1.00	1.00	51.40	2.00	51.40	102.80
TRAMO G	Deuris Mateo	64.90	1.00	1.00	64.90	1.00	64.90	64.90
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							505.60	946.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,844,519.56
Monto desembolsado RD\$ 1,422,259.78 (50%)
Avance de obra 108.51%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGION: VALDESIJA

PROVINCIA: PERAVIA

MUNICIPIO: BANI

DISTRITO MUNICIPAL: SABANA BUEY

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 24 de mayo de 2023



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 505,60 metros cuadrados de aceras y 946,30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Se está ejecutando por contrato.
2. Solo están realizando contenes para aprovechar el plan de asfalto nacional.
- 3.

IMÁGENES

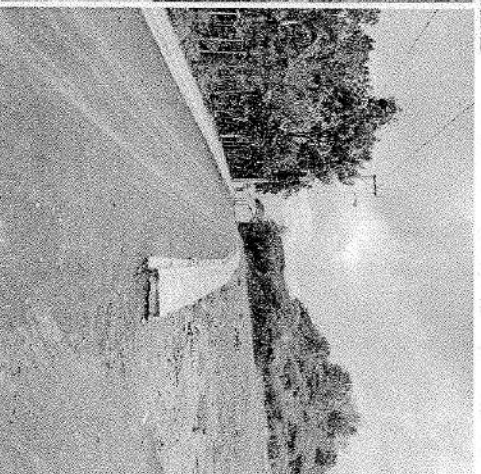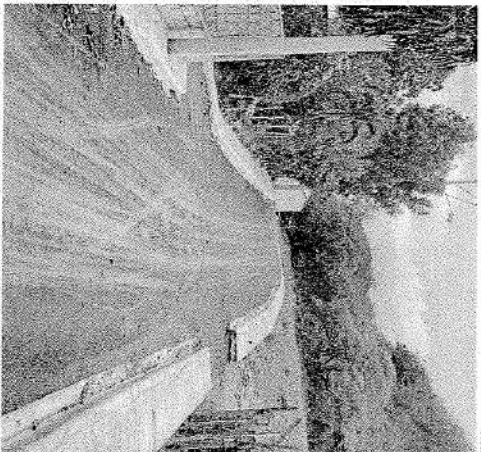





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,


ING ANA INDHIRA RÁMIREZ
Técnico


CÉSAR DE LOS SANTOS
Técnico
