

LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


INFORME DE AVANCE DE OBRA (3er componente)

CODIGO: 320601
REGIÓN: OZAMA
PROVINCIA: SANTO DOMINGO
MUNICIPIO: LOS ALCARRIZOS
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de diciembre de 2024

TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez
2. Arq. Zunilda Del Rosario
3. Ing. Staylin Mendoza
4. CÉSAR DE LOS SANTOS
5. Ing. Richard Cabrera

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR LA UNION, BARRIO LA FE 1RA							
TRAMO B	CALLE SAGRARIO DIAZ	308.69	1.00	1.00	169.49	2.00	308.69	338.98
TRAMO C	CALLE DIAZ	19.34	1.00	1.00	10.90	2.00	19.34	21.80
TRAMO D	CALLE RESP. DE LOS SANTOS	96.55	1.07	2.00	114.70	2.00	206.91	229.40
TRAMO E	CALLE ALTAGRACIA	228.35	1.07	2.00	277.55	2.00	486.51	555.10
TRAMO F	CALLE MERCEDES	18.60	0.86	2.00	23.65	2.00	31.85	47.30
TRAMO G	CALLE LOS HERMANOS PINZON	72.25	0.78	2.00	90.30	2.00	113.36	180.60
TRAMO H	CALLE DE LOS SANTOS	1,454.37	1.00	1.00	713.35	2.00	1,454.37	1,426.70
TRAMO I	CALLE MANUEL BRITO	43.58	1.00	1.00	58.70	1.00	43.58	58.70
TRAMO J	CALLE RESP. MANUEL BRITO	25.35	1.00	1.00	29.90	1.00	25.35	29.90
TRAMO K	CALLE SAN PEDRO	40.66	1.00	1.00	76.80	1.00	40.66	76.80
TRAMO L	SECTOR LA UNION, BARRIO LA FE 2DA							
TRAMO M	CALLE 1RA	134.60	1.08	2.00	134.60	2.00	289.68	269.20
TRAMO N	CALLE SAN MARCOS LADO IZQUIERDO	37.20	1.20	2.00	37.20	2.00	89.28	74.40
TRAMO O	CALLE HERMANAS MIRABAL	809.29	1.00	1.00	682.18	1.00	809.29	682.18
TRAMO P	CALLE MAURICIO LADO IZQUIERDO	20.00	0.66	1.00	20.00	1.00	13.20	20.00
TRAMO Q	CALLE F LADO IZQUIERDO	75.76	1.00	1.00	64.50	2.00	75.76	129.00
TRAMO R	CALLE MARTIN BAEZ	403.47	1.00	1.00	358.80	1.00	403.47	358.80
TRAMO S	CALLE SAN PEDRO	50.50	0.91	2.00	50.50	2.00	92.38	101.00
TRAMO T	CALLE SAN MARCOS LADO IZQUIERDO	26.80	1.00	1.00	26.80	1.00	26.80	26.80




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO U	CALLE SANTA LUCIA	250.57	1.00	1.00	155.90	2.00	250.57	311.80
TRAMO V	CALLE SAN LUCAS	125.15	0.78	2.00	125.15	2.00	194.30	250.30
TRAMO W	CALLE LAS MERCEDES	434.16	1.00	1.00	376.20	1.00	434.16	376.20
TRAMO X	SECTOR LOS AMERICANOS, BARRIO SAN MIGUEL							
TRAMO Y1	CALLE 1RA	37.75	0.89	2.00	87.75	2.00	66.95	175.50
TRAMO Z1	CALLE CENTRAL	223.40	1.11	2.00	223.40	2.00	495.67	446.80
TRAMO AA	SECTOR LA PIÑA, BARRIO VILLA MARIA							
TRAMO AB	CALLE JUAN BOSCH	62.05	1.11	2.00	100.10	2.00	138.34	200.20
TRAMO AC	CALLE CAAMAÑO	74.55	0.98	2.00	158.95	2.00	145.94	317.90
TRAMO AD	CALLE JOAQUIN BALAGUER	64.00	1.00	2.00	59.45	2.00	128.00	118.90
Total							6,384.41	6,824.26

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

MONTO ASIGNADO RD\$ 61,354,041.68
 MONTO DESEMBOLSADO RD\$ 30,677,020.84 (50%)
 Avance de obra 42.02%

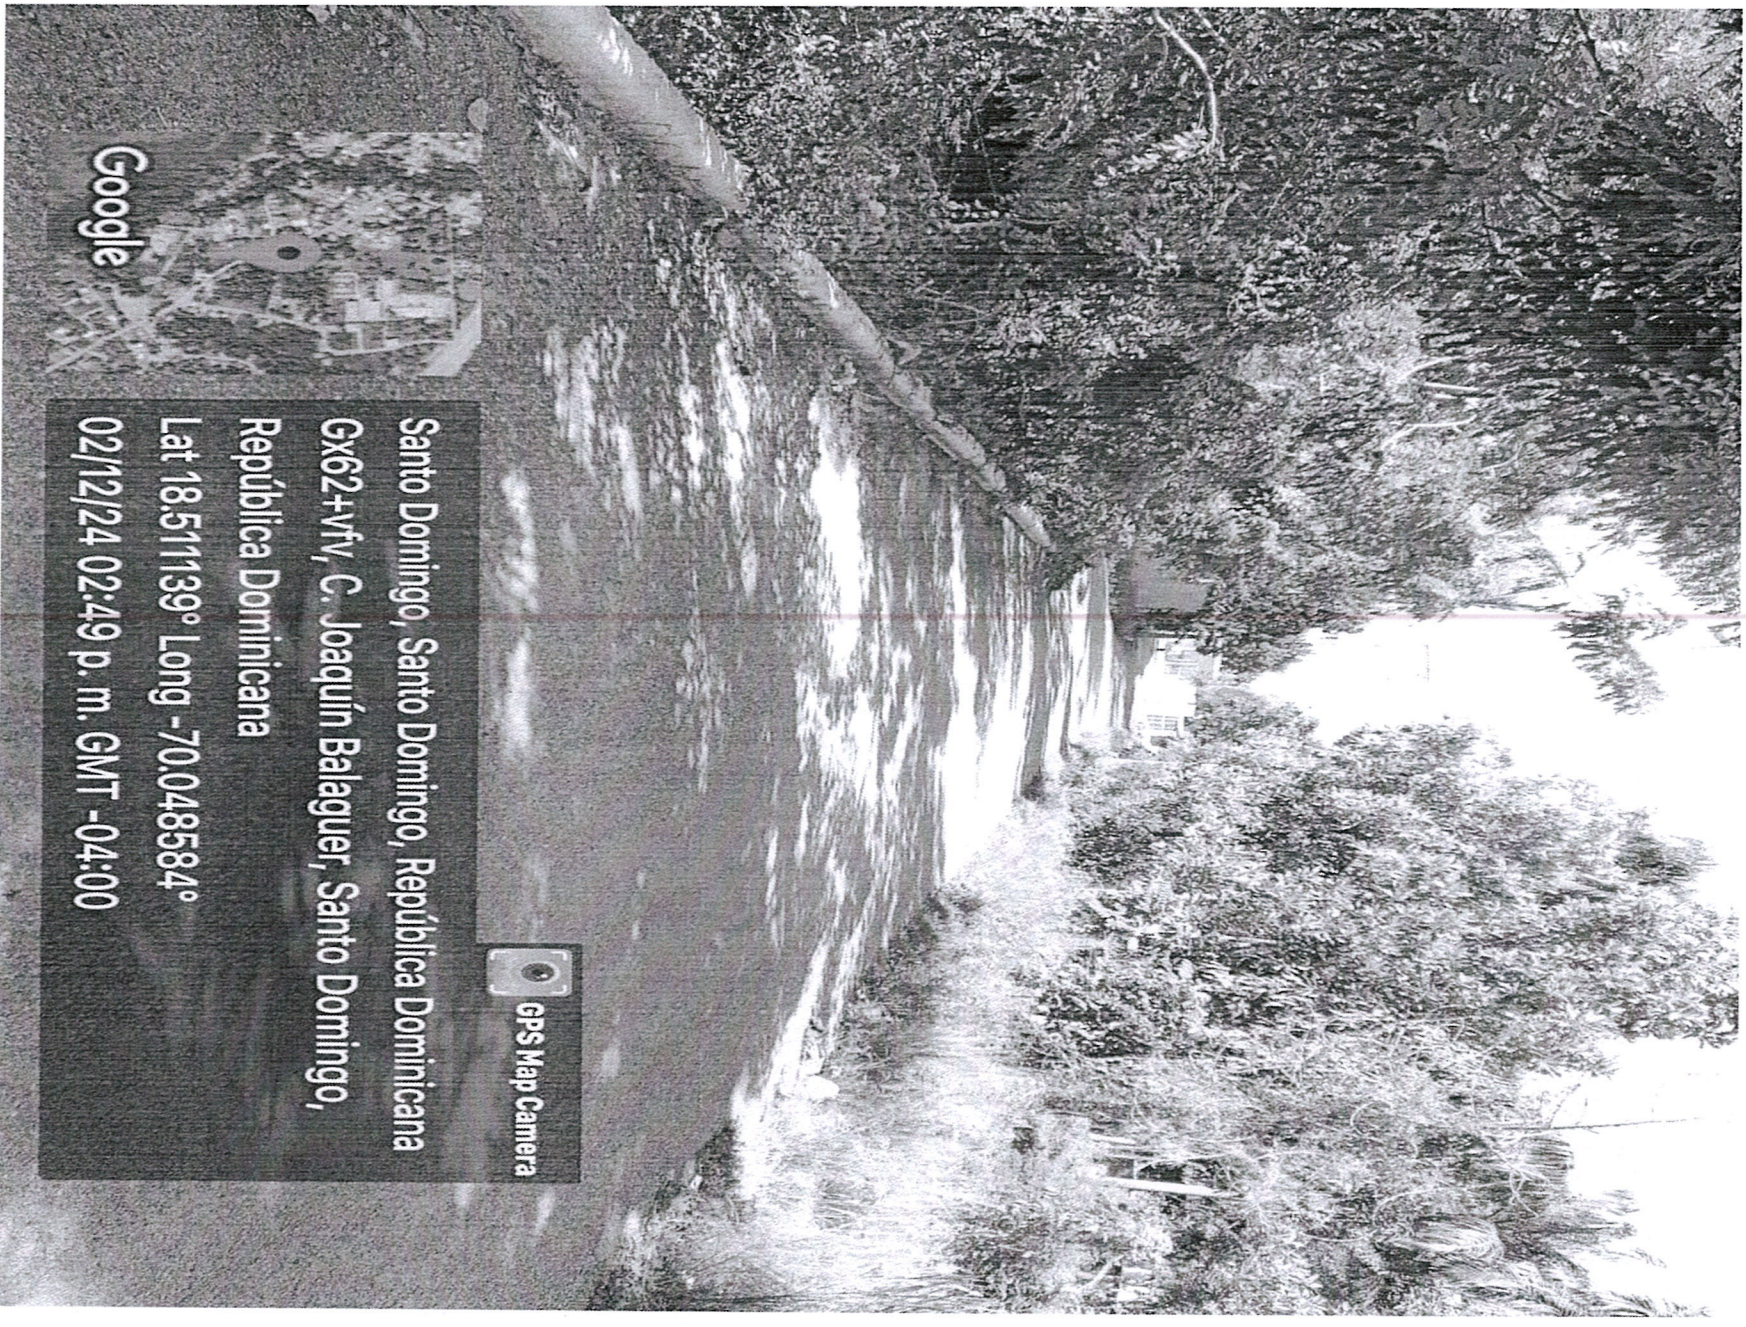


GPS Map Camera

Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana
Gx62+vtv, C. Joaquín Balaguer, Santo Domingo,
República Dominicana

Lat 18.511139° Long -70.048584°

02/12/24 02:49 p. m. GMT -04:00

Google

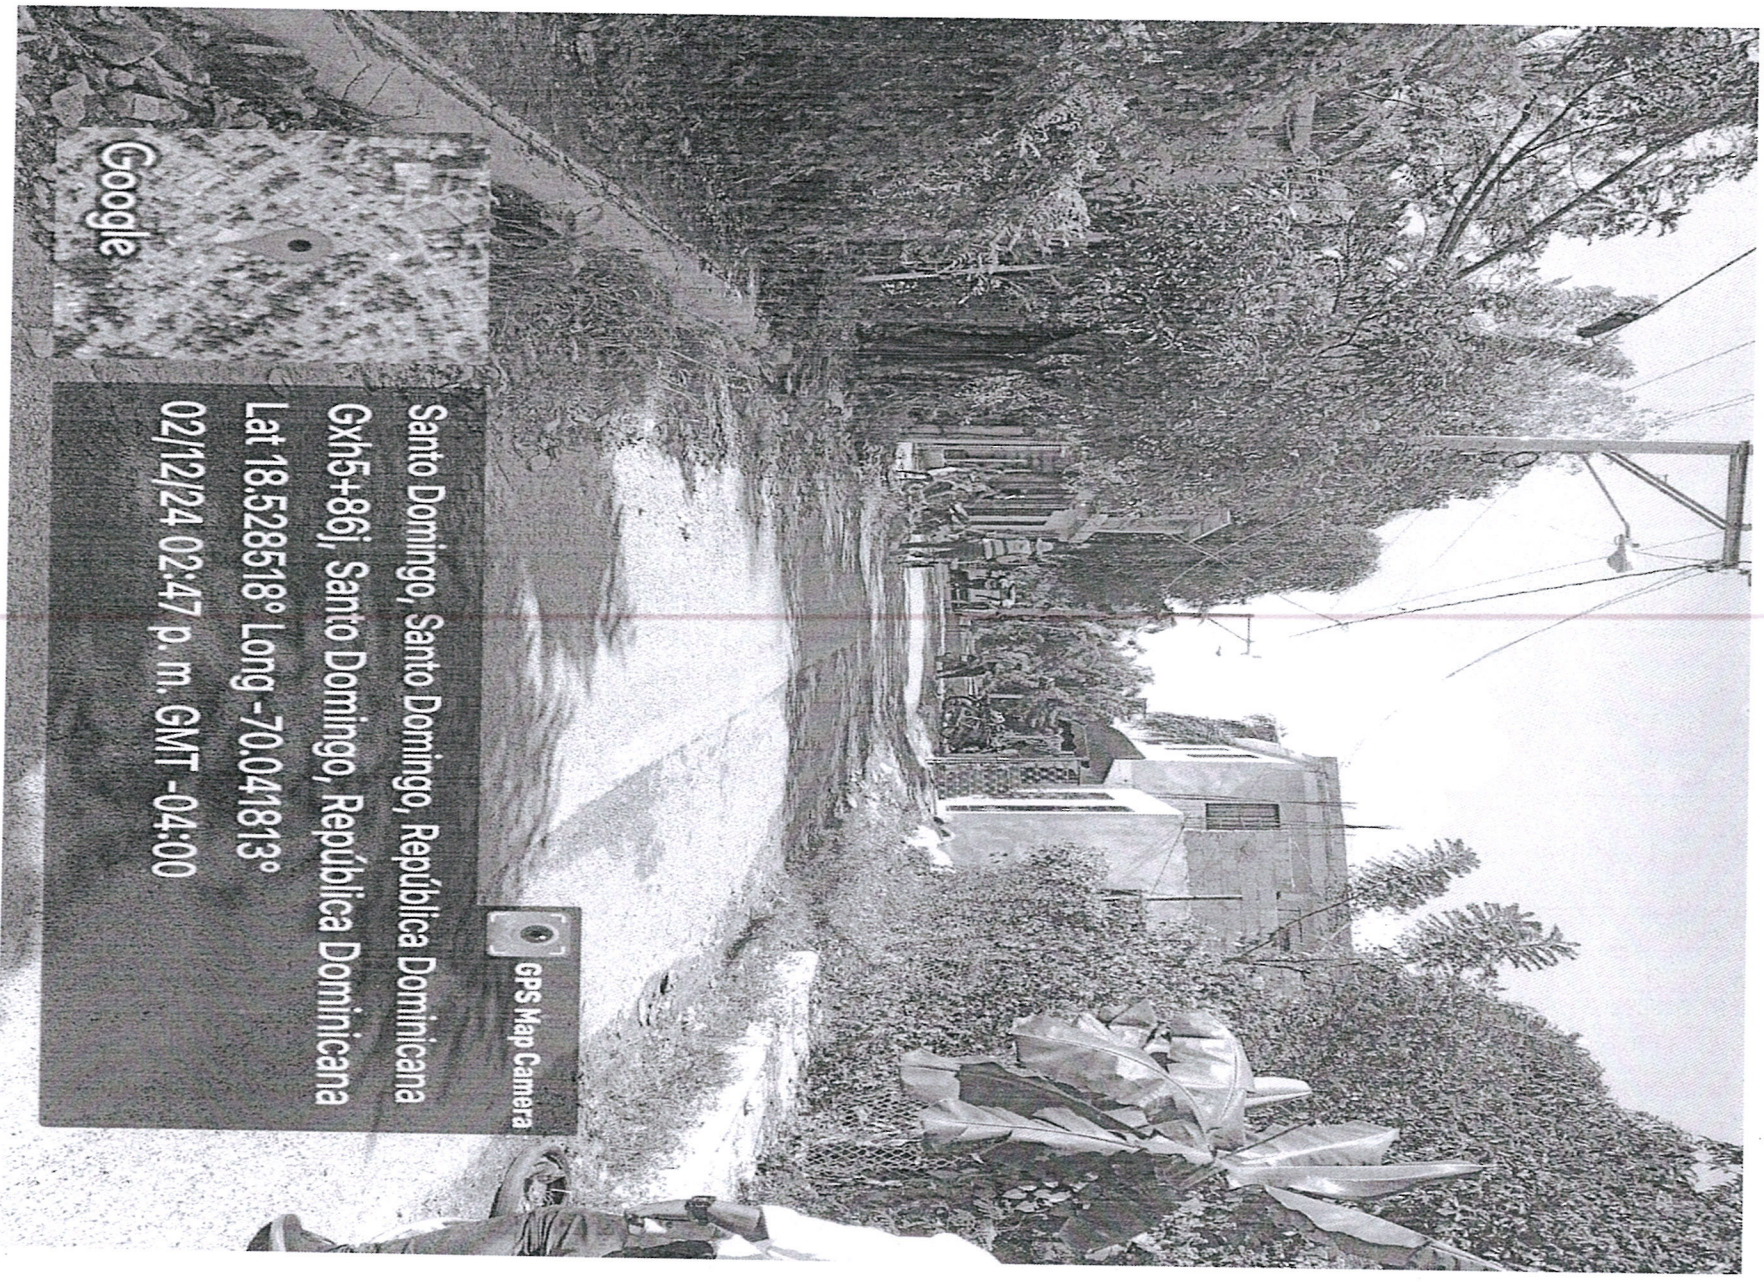

Google

Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana
Gxh5+86j, Santo Domingo, República Dominicana
Lat 18.528518° Long -70.041813°
02/12/24 02:47 p. m. GMT -04:00






Google

Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana
Gxn5+86j, Santo Domingo, República Dominicana
Lat 18.528518° Long -70.041813°
02/12/24 02:47 p. m. GMT -04:00



GPS Map Camera

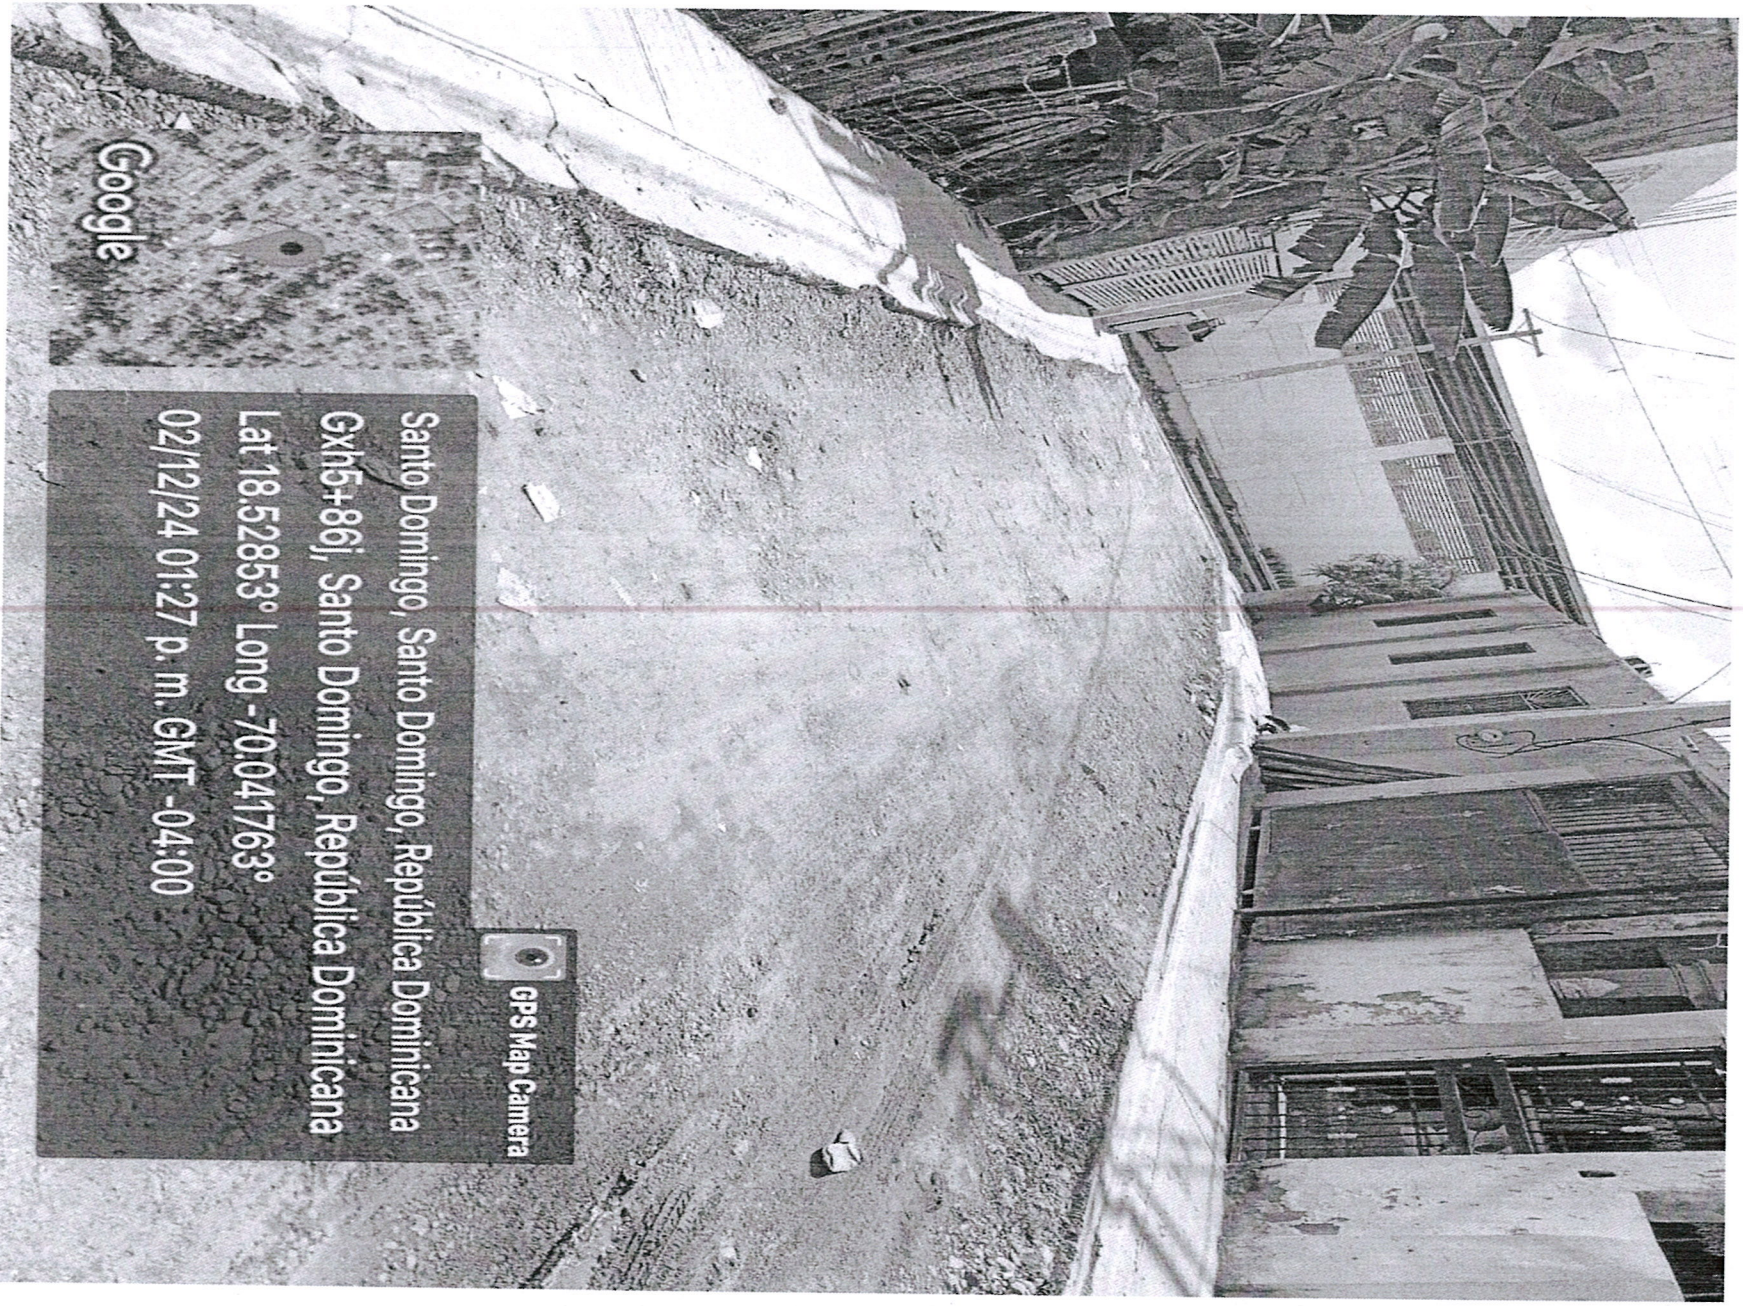

Google



GPS Map Camera

Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana
Gxh5+86j, Santo Domingo, República Dominicana
Lat 18.52853° Long -70.041763°
02/12/24 01:27 p. m. GMT -04:00



Liga Municipal Dominicana


Sector La Unión Barrio La Fe Los Alcarrí

02.12.2024 13:15

18.52913 -70.04219

GXJ5+J3Q, C. Respaldo San Marcos, Santo Domingo



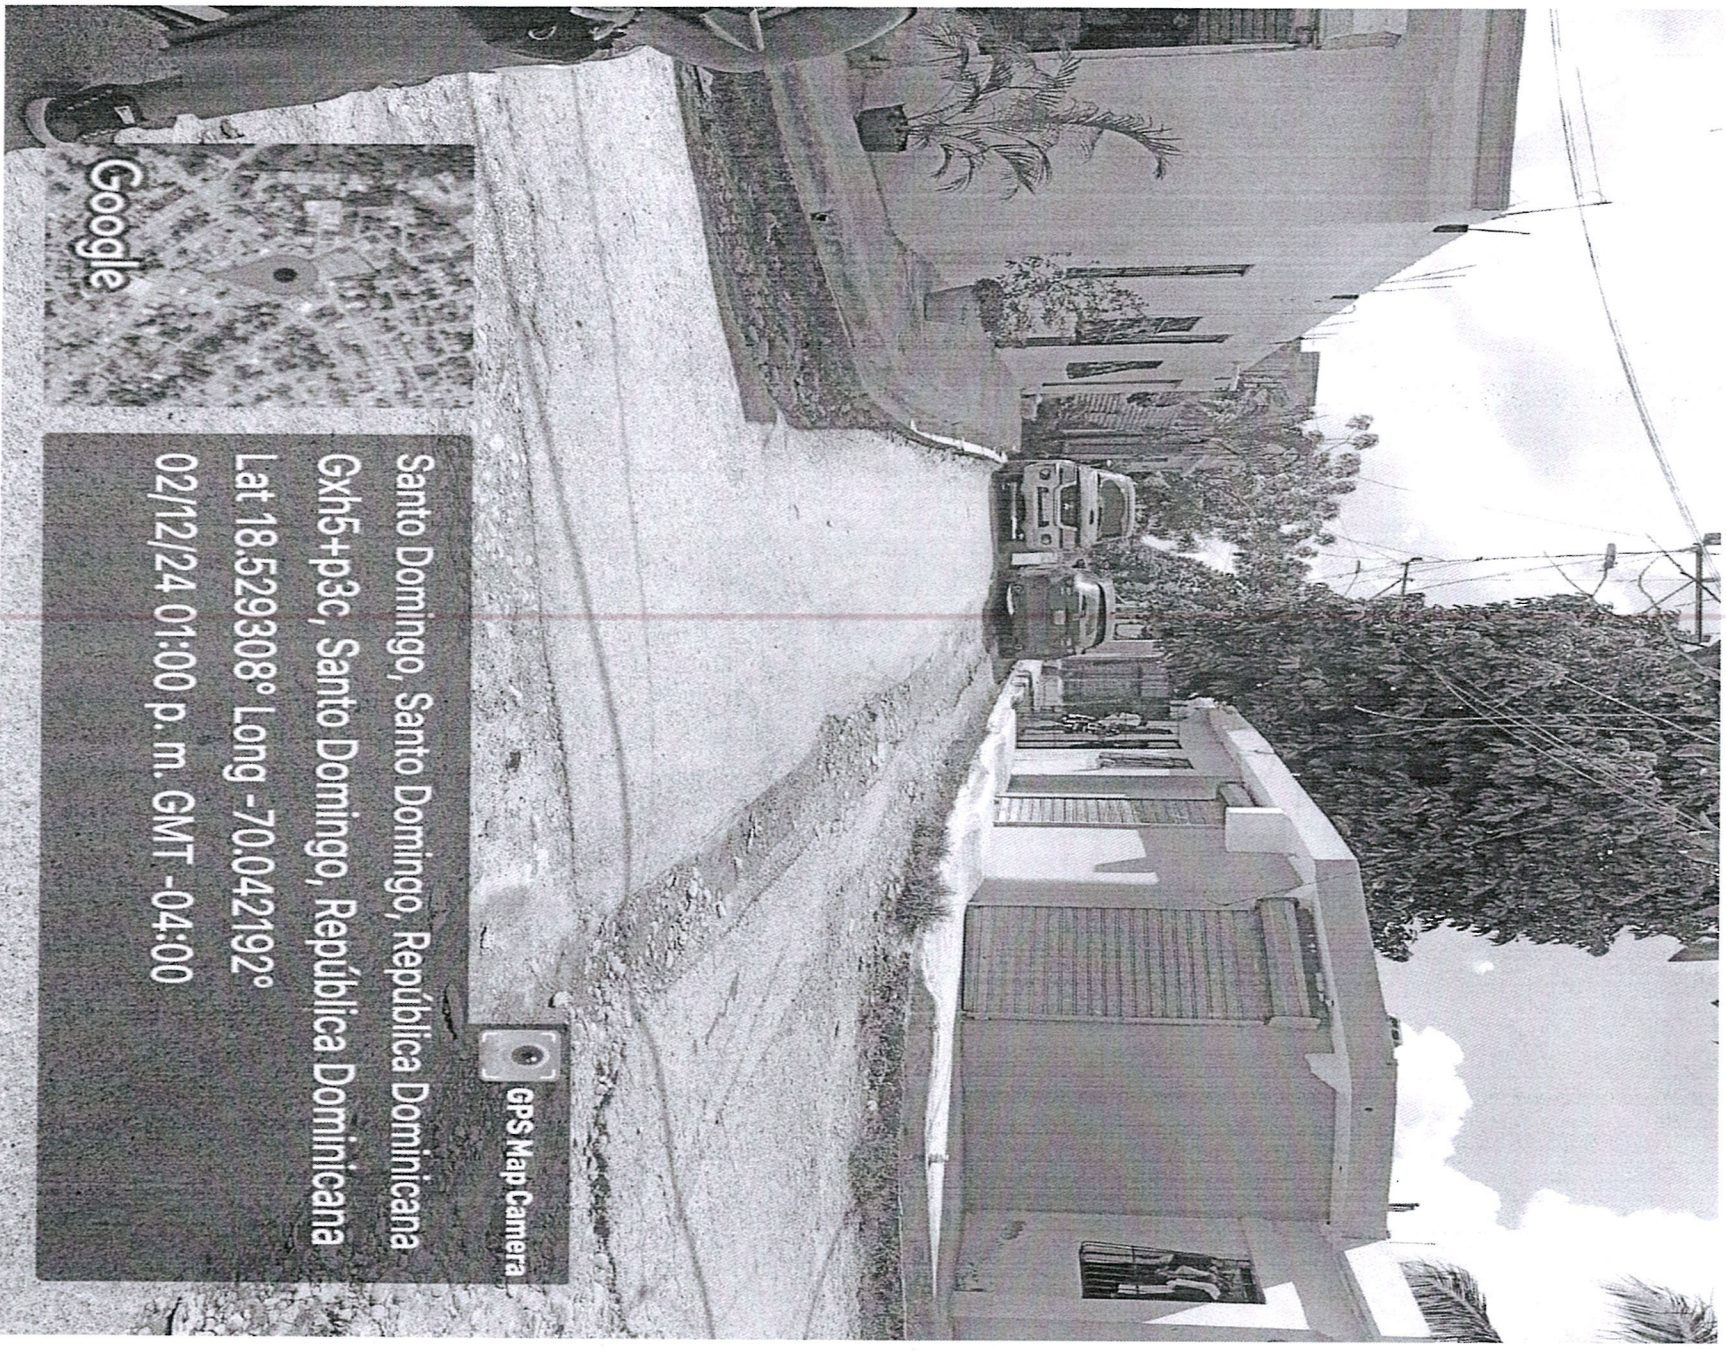


Google



GPS Map Camera

Santo Domingo, Santo Domingo, República Dominicana
Gxh5+p3c, Santo Domingo, República Dominicana
Lat 18.529308° Long -70.042192°
02/12/24 01:00 p. m. GMT -04:00



LIGA MUNICIPAL -DOMINICANA-

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: OZAMA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 19 de diciembre de 2024


PROVINCIA: SANTO DOMINGO

MUNICIPIO: LOS ALCARRIZOS

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE AVANCE DE OBRA

A la fecha de 19/12/2024 se ha ejecutado 6,384.41 metros cuadrados de aceras y 6,824.26 metros lineales de contén, lo que corresponde al 42.02% del fondo asignado para este territorio.

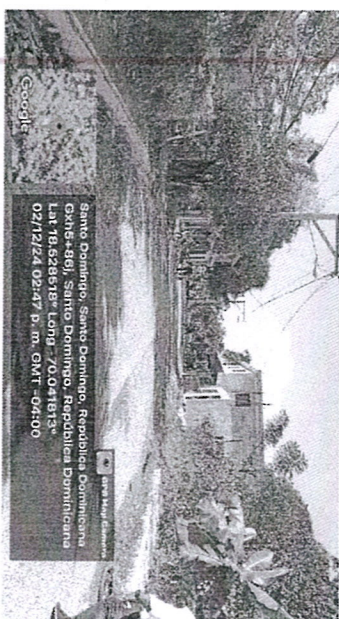

Suministra los datos de este reporte,

Ing. Ana Indhira Ramírez
ING. ANA INDHIRA RAMÍREZ
Técnico

Arq. Zunilda del Rosario
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO
Técnico

Ing. Richard Cabrera
ING. RICHARD CABRERA
Ingeniero

Ing. Staylin Mendoza
ING. STAYLIN MENDOZA
Ingeniero

Cesar Ariel de los Santos
CESAR ARIEL DE LOS SANTOS
Técnico

