



**LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -**

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANTEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de octubre de 2022

TÉCNICOS: 1. Arq. Zunilda Del Rosario
2. Ing. Danilo Mercado

CODIGO: 210303
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL
MUNICIPIO: BAJOS DE HAINA
DISTRITO MUNICIPAL: QUITA SUEÑO (DM)

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE 1 ERA	56.70	1.55	2	108.80	2	175.77	217.6
TRAMO B	CAMANOLO BORDA	57.45	0.90	2	87.15	2	103.41	174.3
TRAMO C	CALLE 3ERA	28.50	1.05	2	49.80	2	59.85	99.6
TRAMO D	CALLE MINIMARKET EL TRONCO AA	24.60	1.15	1	22.40	2	28.29	44.8
TRAMO E	CALLE DE LA PARADA DE MOTOCONCHO	127.30	1.28	2	127.3	2	325.888	254.6
TRAMO F	CALLE BO. NUEVO	199.80	0.85	2	266.4	2	339.66	532.8
TRAMO G	CALLE LA CUESTA (ZDA)	60.12	0.90	2	150.3	2	108.216	300.6
Total							1141.08	1624.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 4,202,585.51
Monto desembolsado RD\$ 2,101,292.76 (50%)
Avance de obra 134.44%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13 de octubre de 2022

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: BAJOS DE HAINA

DISTRITO MUNICIPAL: QUITA SUEÑO (DM)


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,141.08 metros cuadrados de aceras y 1,624.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. El proyecto se ejecutó por contrato, bajo la supervisión de un ingeniero civil.
2. La obra cumple con los estándares de calidad recomendados por el programa.
3. La alcaldía ha construido mas de 100 % y seguirán ejecutando en el Sector de Villa Esperanza.

IMÁGENES

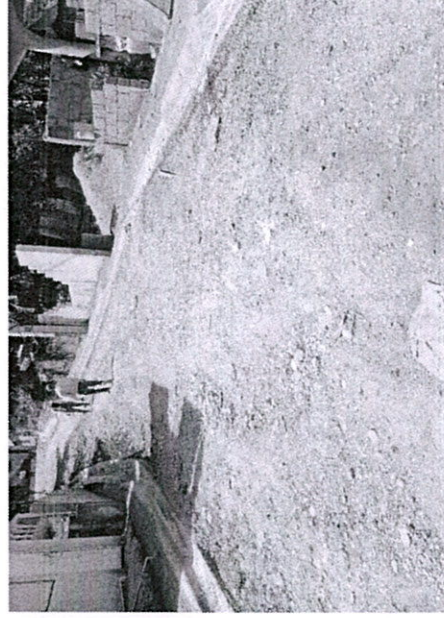



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

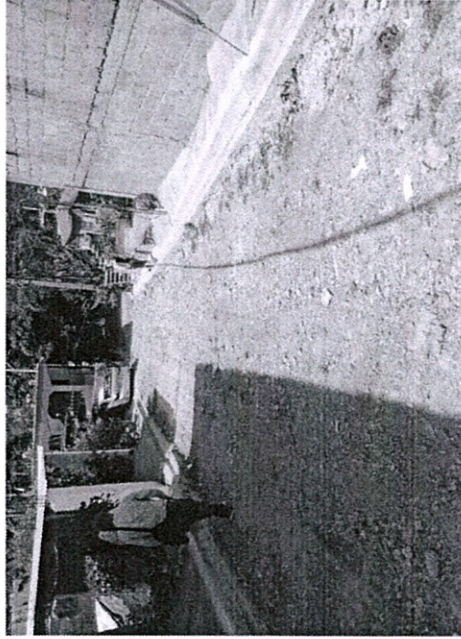

Suministra los datos de este reporte,


ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO
Técnico


ING. DANILLO MERCADO
Técnico

