



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA


CODIGO: 210501
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL
MUNICIPIO: VILLA ALTAGRACIA
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29 de noviembre de 2022
TÉCNICOS: 1. Ing. Ana Indhira Rámirez
2. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE DETRASDEL IFTD	172.00	0.95	1	179.20	1	163.4	179.2
TRAMO B	AV. DUARTE(ENTRADA LAS DELICIAS Y 1 ERA DEL INVI)	253.30	1.45	1	253.30	1	367.285	253.3
TRAMO C	AV. DUARTE(ENTRADA LAS DELICIAS Y 1 ERA DEL INVI)	108.30	1.25	2	108.30	2	270.75	216.6
TRAMO D	AV. DUARTE-ENTRADA TALLER DE MECANICA	30.00	0.50	1	30.00	1	15	30
TRAMO E	AV. DUARTE(ZONA FRANCA HASTA LOS MULTIS)	239.20	2.10	1	239.2	1	502.32	239.2
TRAMO F	CALLE PRINCIPAL(HORMIGO)	46.70	1.35	1	47.6	1	63.045	47.6
TRAMO G	CALLE PRINCIPAL(HORMIGO)	37.60	1.10	1	37.6	1	41.36	37.6
TRAMO H	CALLE PRIMERA	120.30	0.68	2	186.8	2	163.608	373.6
TRAMO I	CALLE SEGUNDA	53.70	0.70	2	53.7	2	75.18	107.4
Total							1661.95	1484.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 8,417,123.36
Monto desembolsado RD\$ 4,208,561.69 (50%)
Avance de obra 70.83%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29 de noviembre de 2022

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: VILLA ALTAGRACIA

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE AVANCE DE OBRA

A la fecha de 29/11/yyyy se ha ejecutado 1,661.95 metros cuadrados de aceras y 1,484.50 metros lineales de contén, lo que corresponde al 70.83% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS


1. La obra se está ejecutando por Contrato.
2. Este Proyecto cumple con los estándares de calidad recomendado por el Programa.

IMÁGENES

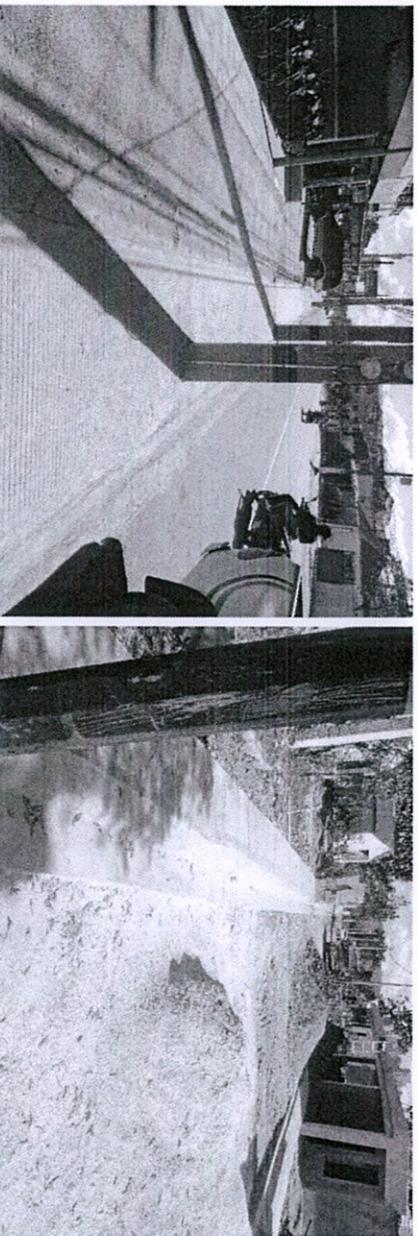




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

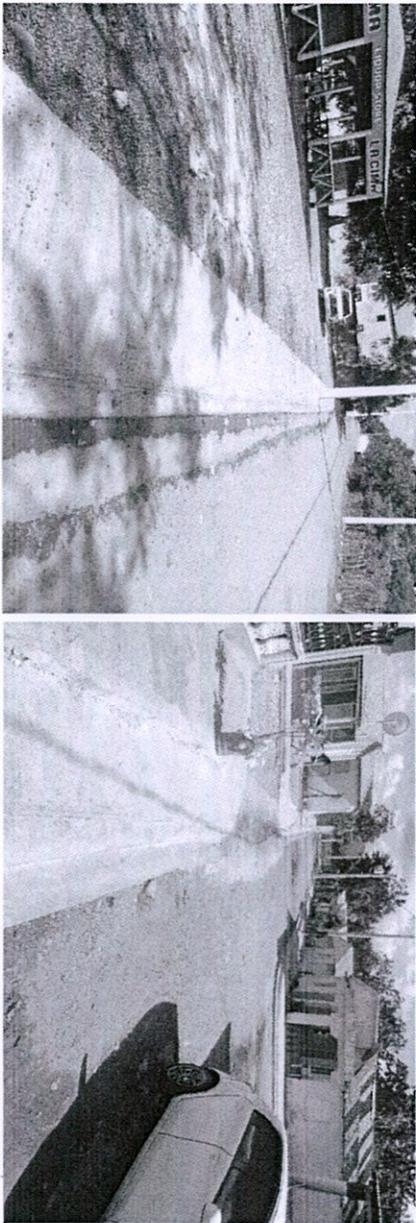

v

Suministra los datos de este reporte,


ING. ANA INDIRIRA RÁMIREZ
Técnico


ING. DANILLO MERCADO
Técnico

