



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 210601

REGIÓN: VALDESIA

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: YAGUATE

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de enero de 2023

1. Ing. Edward Acosta

TÉCNICOS:


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	ARROYO MAMEY, CARRT. PRINCIPAL	355.70	0.96	1	38.20	1	340.4049	38.2
TRAMO B	ARROYO MAMEY, CALLEJÓN DE LOS ROBELOS	14.10	0.60	1	439.80	1	8.46	439.8
TRAMO C	ARROYO MAMEY, CALLEJÓN DE LOS ROBELOS 2				159.60	1		159.6
TRAMO D	CASCO URBANO, AV. ENRIQUILLO	388.40	1.56	1	388.40	1	605.904	388.4
TRAMO E	CASCO URBANO, AV. GASTÓN F. DELIGNE	285.80	1.62	1	285.8	1	462.7102	285.8
TRAMO F	CALLEJÓN DE YAGUATE, C/MÁXIMO GÓMEZ	248.20	1.00	1	248.2	1	248.2	248.2
TRAMO G	LOS ALTOS DE SANTA CRUZ, C/PRIMERA	37.40	0.82	1	66.7	1	30.668	66.7
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1696.35	1626.70

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,898,270.00

Monto desembolsado RD\$ 2,949,135.00 (50%)

Avance de obra 108.03%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESA

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: YAGUATE

DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de enero de 2023



INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,696.35 metros cuadrados de aceras y 1,626.70 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. En este municipio se construyó casi la misma longitud de acera que de contenes.
2. Las aceras y contenes construidos hasta la fecha del levantamiento cumplen con la calidad deseada.

IMÁGENES

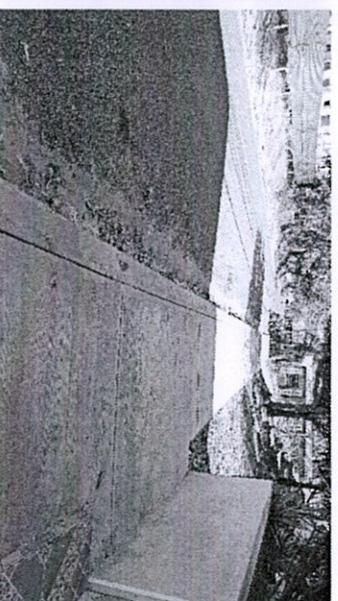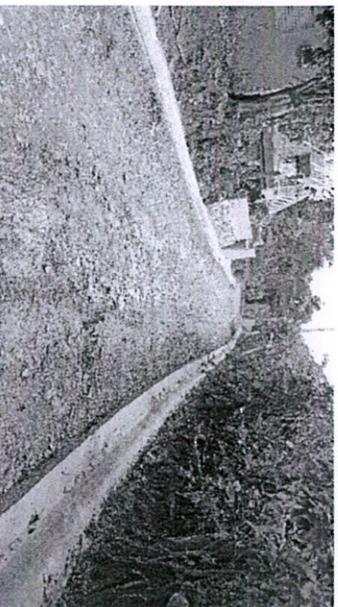



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

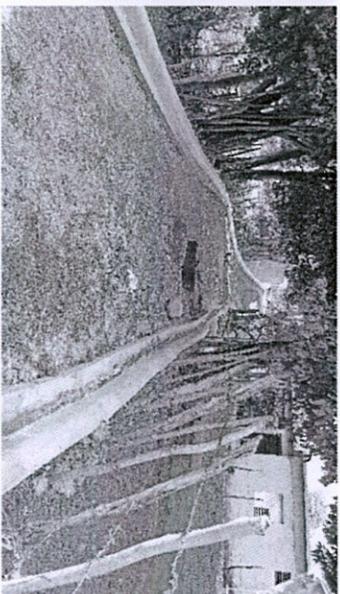

Suministra los datos de este reporte,



ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

Técnico

