



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 210602
REGIÓN: VALDESIA
PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL
MUNICIPIO: YAGUATE
DISTRITO MUNICIPAL: DOÑA ANA (DM)

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de enero de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Edward Acosta

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR LOS RIELES, C/EL LIMÓN				159.70	1.00		159.70
TRAMO B	SECTOR LOS BRUJANES, C/PRINCIPAL				682.80	1.00		682.80
TRAMO C	SECTOR LA SIERRA, C/LOS MACIAS				484.10	1.00		484.10
TRAMO D	SECTOR EL ALTO MUSICAL, C/ EL ALTO MUSICAL				148.50	1.00		148.50
TRAMO E	SECTOR LA CURVA, C/CIRCUNVALACIÓN	125.00	0.95	1.00	431.10	1.00	118.75	431.10
Total							118.75	1,906.20

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,905,203.56
Monto desembolsado RD\$ 1,952,601.78 (50%)
Avance de obra 129.52%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: VALDESIA

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 12 de enero de 2023

PROVINCIA: SAN CRISTÓBAL

MUNICIPIO: YAGUATE

DISTRITO MUNICIPAL: DOÑA ANA (DM)


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 118.75 metros cuadrados de aceras y 1,906.20 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. Según lo evidenciado en las fotos en la fecha del levantamiento, en este distrito se construyeron más contenes que aceras.
2. Los contenes y aceras construidos cumplen con las normas constructivas y la calidad esperada.
3. Se evidenciaron algunos tramos donde la acción de los vehículos pesados deterioraron algunos tramos de contenes por lo que se notificó su inmediata reparación.

IMÁGENES

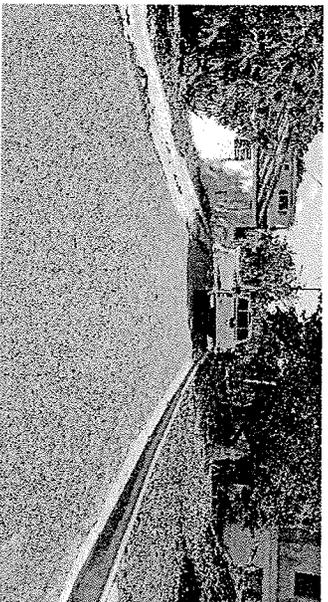




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

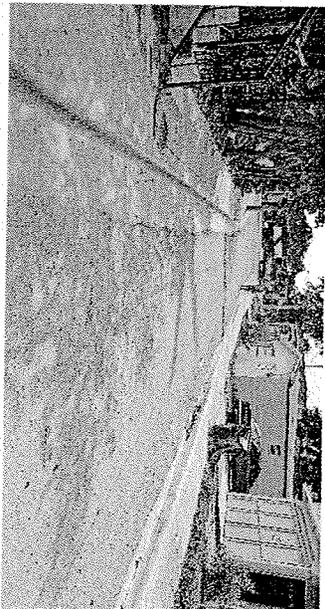

Suministra los datos de este reporte,



ING. EDWARD ACOSTA
Técnico

Técnico
