



**LIGA MUNICIPAL  
- DOMINICANA -**

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**  
**INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**

**CODIGO:** 220104  
**REGIÓN:** EL VALLE  
**PROVINCIA:** SAN JUAN  
**MUNICIPIO:** SAN JUAN  
**DISTRITO MUNICIPAL:** SABANA ALTA


**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 6 de abril de 2022

**TÉCNICOS:**  
1. Ing. Edward Acosta  
2. Ing. Richard Cabrera  
3. Ing. Danilo Mercado

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/Principal (Centro Tecnológico)				181.50	2		363
TRAMO B	C/del Cache (Colmado La Economía)				118.50	2		237
TRAMO C	C/Jarro Sucio	141.50	1.00	2	141.50	2	283	283
TRAMO D	C/ de Dermia	46.40	1.00	2	46.4	2	92.8	92.8
TRAMO E	C/Entrada Factorías Marras	67.50	1.00	2	67.5	2	135	135
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
<b>Total</b>							<b>510.80</b>	<b>1110.80</b>

**AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA**

Monto asignado RD\$ 2,958,071.31  
Monto desembolsado RD\$ 2,958,071.31 (100%)  
Avance de obra 115.42%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN: EL VALLE**

**FECHA DE VISITA TÉCNICA: 6 de abril de 2022**

**PROVINCIA: SAN JUAN**

**MUNICIPIO: SAN JUAN**

**DISTRITO MUNICIPAL: SABANA ALTA**


## **INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 510.80 metros cuadrados de aceras y 1,110.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### **NOTAS**


1. Esta es la cantidad de aceras y contenes construidos hasta el momento de la visita.
2. El gobierno local ejecutó una mayor cantidad de aceras y contenes de la estimada.

### **IMÁGENES**

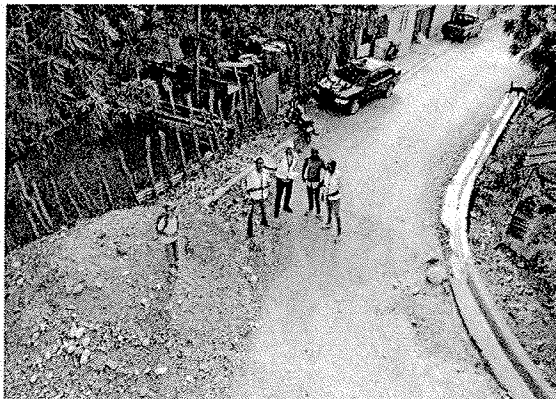




# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

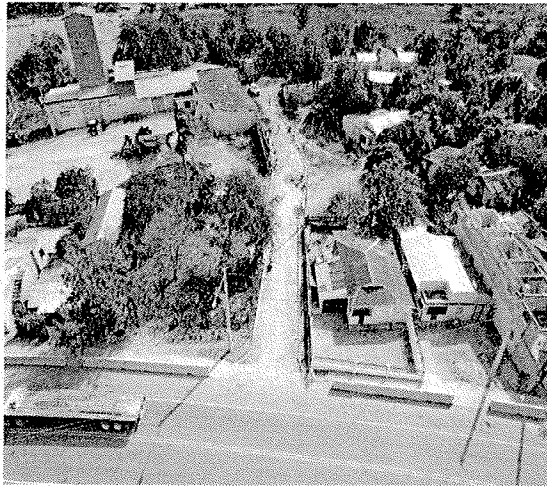

Suministra los datos de este reporte,




ING. EDWARD ACOSTA

Técnico



ING. RICHARD CABRERA

Técnico

  
ING. DANILO MERCADO  
Técnico

