



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 220105

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: SAN JUAN

DISTRITO MUNICIPAL: EL ROSARIO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de febrero de 2023

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. Arq. Keilin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE 1 (LOS CHARCOS DEL CAPA)				25.20	2		50.4
TRAMO B	CALLE 2				43.00	1		43
TRAMO C	CALLE 3				32.80	1		32.8
TRAMO D	CALLE 4				2.60	1		2.6
TRAMO E	CALLE 5				12	1		12
TRAMO F	CALLE 6				30.5	1		30.5
TRAMO G	CALLE 7				151.6	2		303.2
TRAMO H	CALLE 8				50.6	2		101.2
TRAMO I	CALLE 9				22.3	2		44.6
TRAMO J	CALLE 2DA (CALDON)				144.4	2		288.8
TRAMO K	C.PUEBLO NUEVO (BARRIO LOS OLVIDADOS)				176.8	2		353.6
TRAMO L	CALLE 1 (LAS YAYAS)				126.3	2		252.6
TRAMO M	CALLE 2				53.7	2		107.4
TRAMO N	CALLE 3				35.2	1		35.2
TRAMO O	CALLE 4				51.7	2		103.4
Total							0.00	1761.30

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,411,952.96

Monto desembolsado RD\$ 3,411,952.96 (100%)

Avance de obra 129.44%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: SAN JUAN

DISTRITO MUNICIPAL: EL ROSARIO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 9 de febrero de 2023


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 1,761.30 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS



1. La obra se esta ejecutando por administración.
2. El proyecto cumple con los estándares de calidad recomendados por el programa.


IMÁGENES

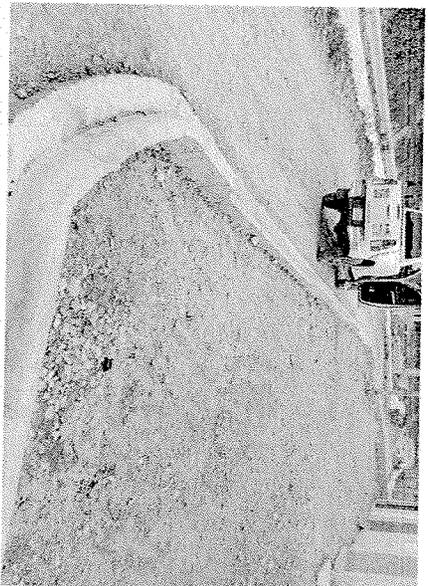





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

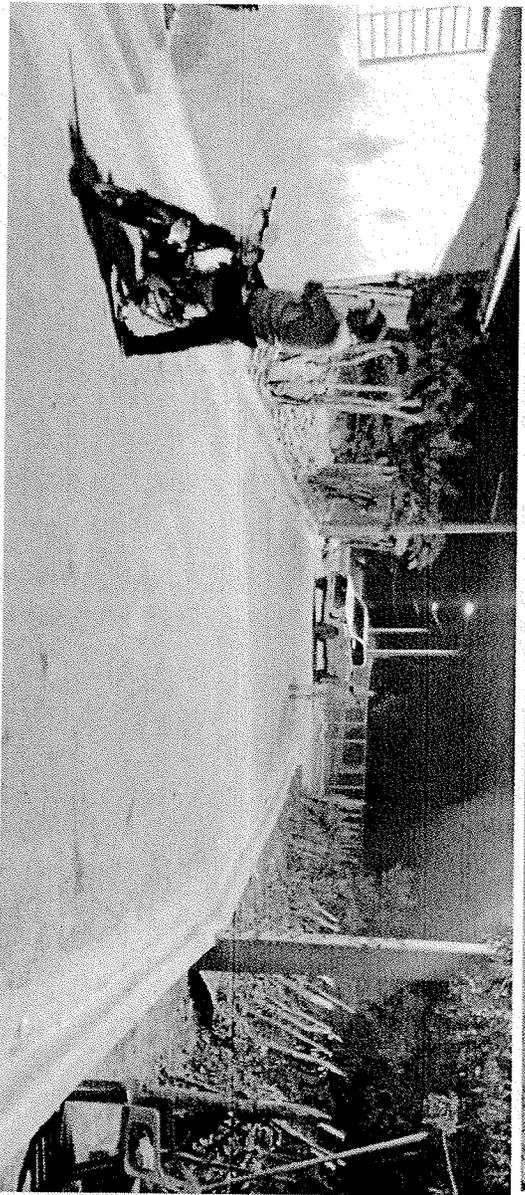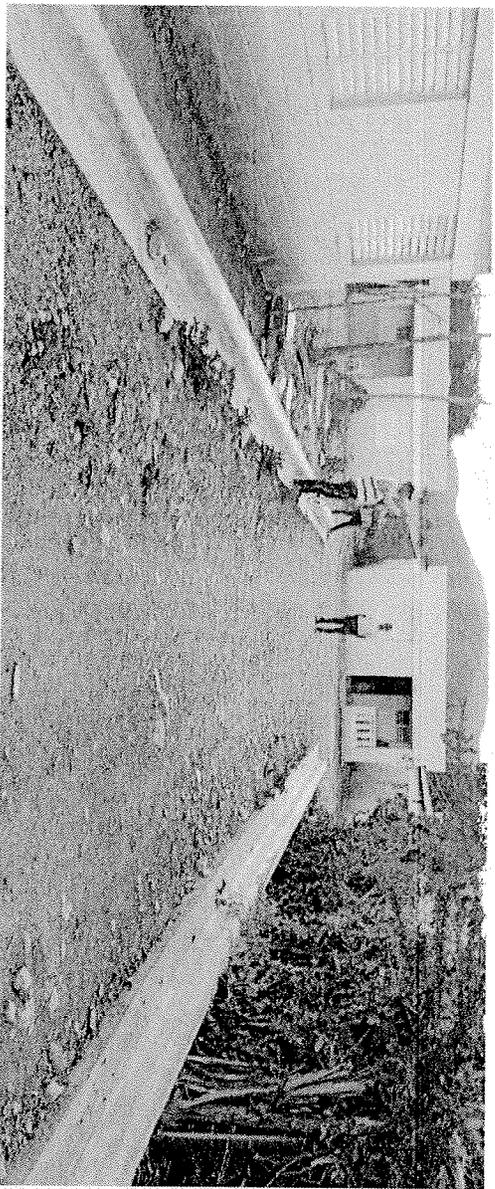




LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

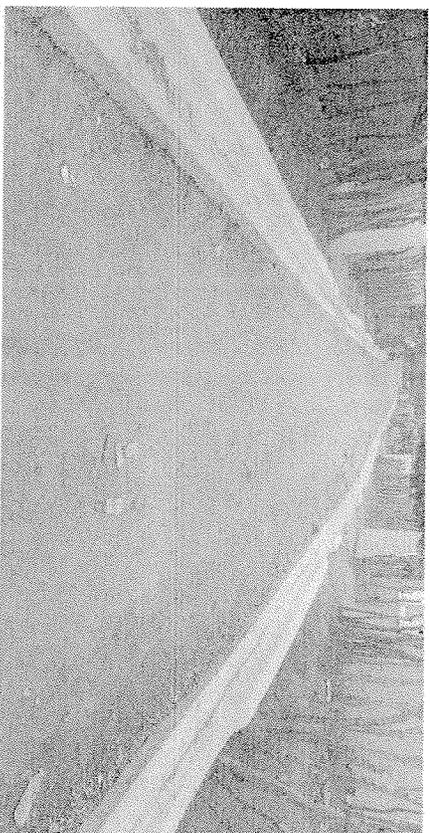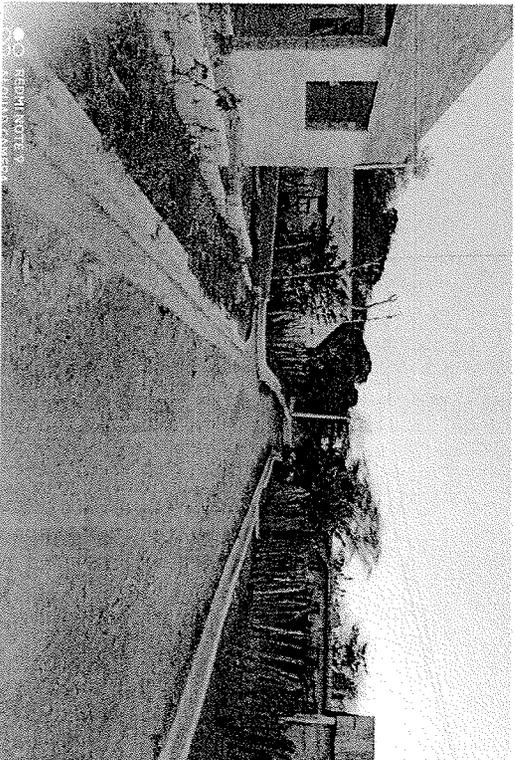

Suministra los datos de este reporte,




ING. DANILLO MERCADO
Técnico


ARQ. KELVIN MORA
Técnico
