



## LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 220110  
 REGIÓN: EL VALLE  
 PROVINCIA: SAN JUAN  
 MUNICIPIO: SAN JUAN  
 DISTRITO MUNICIPAL: LAS CHARCAS DE MARÍA NOVA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 26 de mayo de 2022  
 TÉCNICOS: 1. Ing. Richard Cabrera  
 2. César De Los Santos

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m <sup>2</sup> )	TOTAL DE CONTENES (m)	
TRAMO A	Sección Loma De Babor	165.20	1.00	2	165.20	2	330.4	330.4	
TRAMO B		X2	13.20	1.00	1	13.20	1	13.2	13.2
TRAMO C		X3	60.70	1.00	2	60.70	2	121.4	121.4
TRAMO D		X4	134.02	1.00	1	128.1	2	134.02	256.2
TRAMO E		X5	83.70	1.00	1	83.7	1	83.7	83.7
TRAMO F		X6	104.50	1.00	1	104.5	1	104.5	104.5
TRAMO G		X7	177.80	1.00	1	177.8	1	177.8	177.8
TRAMO H		X8	22.50	1.00	1	22.5	1	22.5	22.5
TRAMO I		X9	28.10	1.00	1	28.5	1	28.1	28.5
TRAMO J		X10	40.70	1.00	1	40.7	1	40.7	40.7
TRAMO K		X11	35.30	1.00	2	35.3	2	70.6	70.6
Total							1126.92	1249.5	

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,949,937.23

Monto desembolsado RD\$ 1,474,968.62 50%

Avance de obra 153.23%




# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 26 de mayo de 2022

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: SAN JUAN

DISTRITO MUNICIPAL: LAS CHARCAS DE MARÍA NOVA





## REPORTE

A la fecha de 26/05/2022 se ha ejecutado 1,126.92 metros cuadrados de aceras y 1,249.50 metros lineales de contén, lo que corresponde al 153.23% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS


1. Los datos recopilados en este levantamiento constatan que se está ejecutando tal cual lo establece el programa.
2. Las tramos nombrados como X1, X2... etc, son debido a que las calles no poseen nombres.

## IMÁGENES

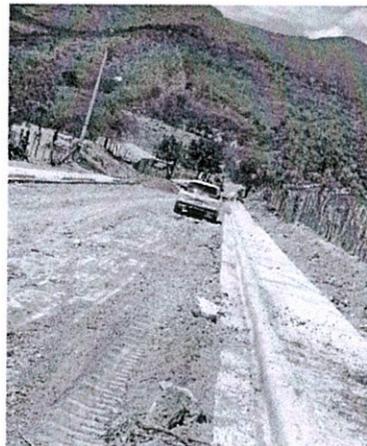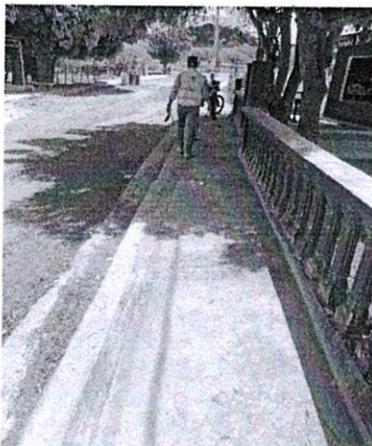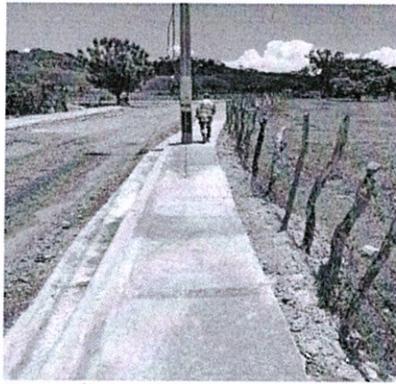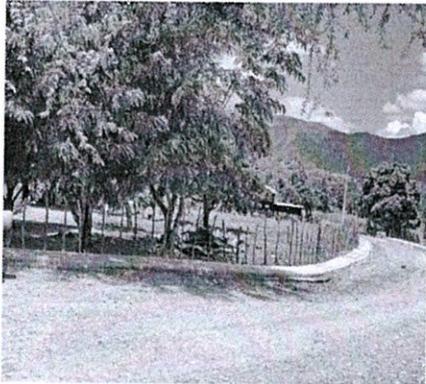



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

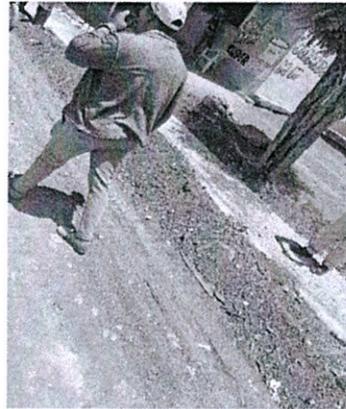

Suministra los datos de este reporte,

ING. RICHARD CABRERA  
Técnico

CÉSAR DE LOS SANTOS  
Técnico

