



LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: 220303

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: EL CERCADO

DISTRITO MUNICIPAL: BATISTA

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 04 de mayo del 2022

1. Ing. Danilo Mercado

TÉCNICOS: 2. Arq. Kellin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	C/ DUARTE, PRINCIPAL.				70.80	1		70.8
TRAMO B	C/ DUARTE, PRINCIPAL.				125.80	1		125.8
TRAMO C	C/ DUARTE, PRINCIPAL.				123.80	1		123.8
TRAMO D	C/ DUARTE, PRINCIPAL.				63.1	1		63.1
TRAMO E	C/ PRIMERA				18.2	1		18.2
TRAMO F	C/ SEGUNDA				70.2	1		70.2
TRAMO G	C/ SEGUNDA				70.2	1		70.2
TRAMO H	C/CASIMIRO MONTERO				74.9	1		74.9
TRAMO I	C/ DUARTE, PRINCIPAL.				45.3	1		45.3
TRAMO J	C/CASIMIRO MONTERO				23.4	1		23.4
TRAMO K	C/CASIMIRO MONTERO				28.9	1		28.9
TRAMO L	C/CASIMIRO MONTERO				28.9	1		28.9
TRAMO M	C/DOMINGO SANCHEZ				63.1	1		63.1
Total							0	806.6


AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 2,857,534.09

Monto desembolsado RD\$ 1,428,767.05 (50%)

Avance de obra 70.78%

LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—



SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: EL VALLE

PROVINCIA: SAN JUAN

MUNICIPIO: EL CERCADO

DISTRITO MUNICIPAL: BATISTA


REPORTE

A la fecha de 04 de mayo del 2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 806.60 metros lineales de contén, lo que corresponde al 70.78% del fondo asignado para este territorio.

NOTAS

1. El Gobierno Local esta ejecutando obras complementarias con sus fondos.
2. Solo construirán contenes.
3. Se esta ejecutando por administración

IMÁGENES

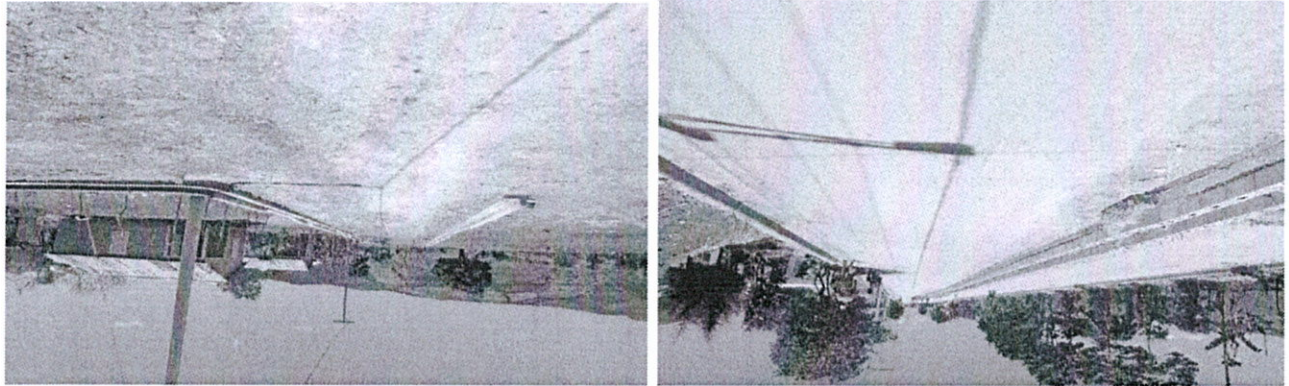





Técnico

ING. DANILLO MERCADO

Técnico

ARQ. KEILIN MORA

Suministra los datos de este reporte,

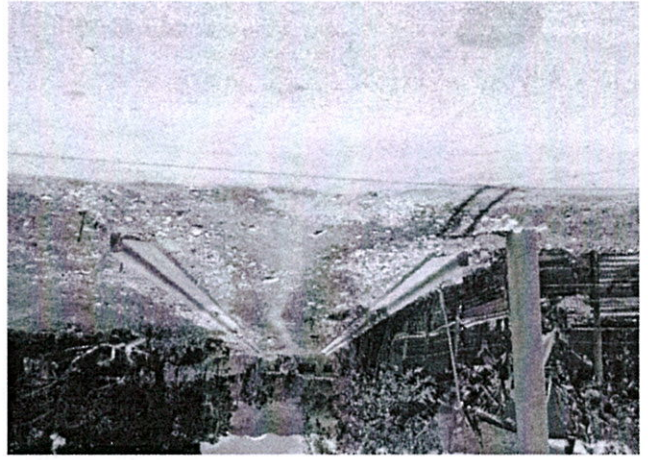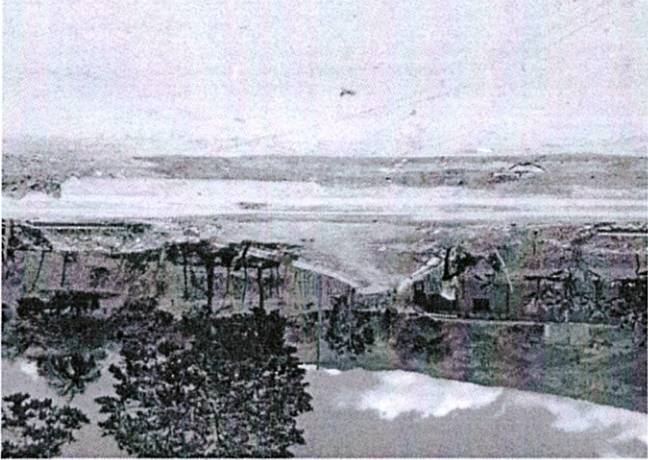

LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

