


LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 230101
REGIÓN: HIGUAMO
PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORÍS
MUNICIPIO: SAN PEDRO DE MACORÍS
DISTRITO MUNICIPAL: -

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 11 de julio de 2023
TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
 2. Arq. Keillin Mora

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m ²)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE SANTA FE	216.00	2.02	2.00	208.59	2.00	874.27	417.18
TRAMO B	CALLE EDUARDO MANON	633.60	1.10	2.00	633.60	2.00	1,393.92	1,267.20
TRAMO C	CALLE LA CHIMENEA	59.20	1.00	1.00	132.10	2.00	59.20	264.20
TRAMO D	CALLE PARTE ATRAS DE LA ESCUELA VILMA PEREIRA				80.70	1.00		80.70
TRAMO E	CALLE EL TAMARINDO	49.50	1.04	2.00	191.55	2.00	102.68	383.10
TRAMO F	CALLE REYNA ESTHER	70.50	1.26	2.00	141.00	1.00	177.18	141.00
TRAMO G	CALLE LA CHIMENEA	24.10	1.10	1.00	24.10	1.00	26.51	24.10
TRAMO H	CALLE REYNA ESTHER (SECTOR VILLA BLANCA)	139.10	1.00	2.00	243.50	2.00	278.20	487.00
TRAMO I	CALLE REYNA ESTHER (SECTOR VILLA BLANCA)				107.30	1.00		107.30
TRAMO J	CALLE EL TAMARINDO (EL SEA)				130.90	2.00		261.80
TRAMO K	CALLE EL TAMARINDO (EL SEA)				327.25	2.00		654.50
TRAMO L	CALLE MEDIO AMBIENTE				57.80	2.00		115.60
TRAMO M	CALLE MEDIO AMBIENTE	4.35	1.20	1.00	52.00	1.00	5.22	52.00
TRAMO N	CALLE FRENTE AL CODIA				87.05	2.00		174.10
TRAMO O	CALLE 3RA SECTOR VILLA PROGRESO				89.70	2.00		179.40
TRAMO P	CALLE 3RA SECTOR VILLA PROGRESO				383.85	2.00		767.70
TRAMO Q	CALLE 1RA SECTOR VILLA PROGRESO				52.00	2.00		104.00




LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO R	CALLE EL PLAY 1				87.95	2.00		175.90
TRAMO S	CALLE EL PLAY 2				65.40	2.00		130.80
TRAMO T	CALLE EL PLAY 3	27.00	1.20	1.00	181.75	2.00	32.40	363.50
TRAMO U	CALLE EL PLAY 4	53.10	1.13	2.00	107.50	2.00	120.50	215.00
TRAMO V	CALLE EL BRISAL (VILLA FARO)				99.90	2.00		199.80
TRAMO W	CALLE RESP. EL BRISAL (VILLA FARO)				62.80	2.00		125.60
TRAMO X	CALLE MATILDE LARANGUET	137.50	1.00	2.00	137.50	2.00	275.00	275.00
TRAMO Y1	AVENIDAD FRANCISCO DOMINGUEZ CHARRO	20.20	1.47	1.00	20.20	1.00	29.69	20.20
TRAMO Z1	CALLE PRESIDENTE ENRIQUEZ	74.80	1.28	1.00	80.20	1.00	95.74	80.20
TRAMO AA	CALLE PRESIDENTE ENRIQUEZ	64.50	1.14	1.00	69.80	1.00	73.53	69.80
TRAMO AB	CALLE VIRGILIO DIAZ ORDOÑEZ	83.00	3.10	1.00	83.00	1.00	257.30	83.00
TRAMO AC	CALLE MANUEL ARICHER	101.10	2.70	1.00	101.10	1.00	272.97	101.10
TRAMO AD	CALLE GABRIEL DEL CASTILLO	80.80	2.80	1.00	80.80	1.00	226.24	80.80
TRAMO AE	CALLE DR. RAMON CASTILLO	60.00	1.55	1.00	60.00	1.00	93.00	60.00
TRAMO AF	CALLE FRANCISCO MARTINEZ	158.70	3.08	1.00	137.30	1.00	488.38	137.30
TRAMO AG	JARDINERAS A RESTAR (TRAMOS AB, AC Y AD)	73.60	(0.80)	1.00			(58.88)	
Total							4,823.06	7,598.88

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 23,788,473.44
Monto desembolsado RD\$ 23,788,473.45 (100%)
Avance de obra 108.01%



LIGA MUNICIPAL DOMINICANA

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 11 de julio de 2023

PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORÍS

MUNICIPIO: SAN PEDRO DE MACORÍS

DISTRITO MUNICIPAL: -


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 4,823.06 metros cuadrados de aceras y 7,598.88 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS


1. De acuerdo a lo observado en esta visita, la calidad de los materiales y la terminación se adaptan a las normas de construcción.
2. En esta visitas observamos que el replanteo de las aceras y las plantillas de contenes se han realizado correctamente.
3. En este proyecto se intervinieron varios sectores y comunidades en el municipio.

IMÁGENES

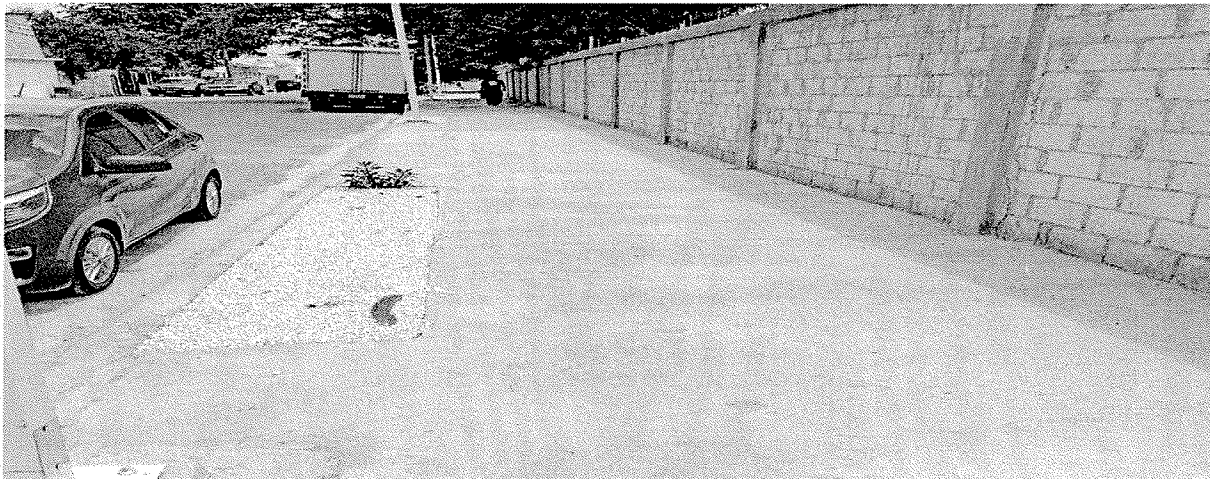



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

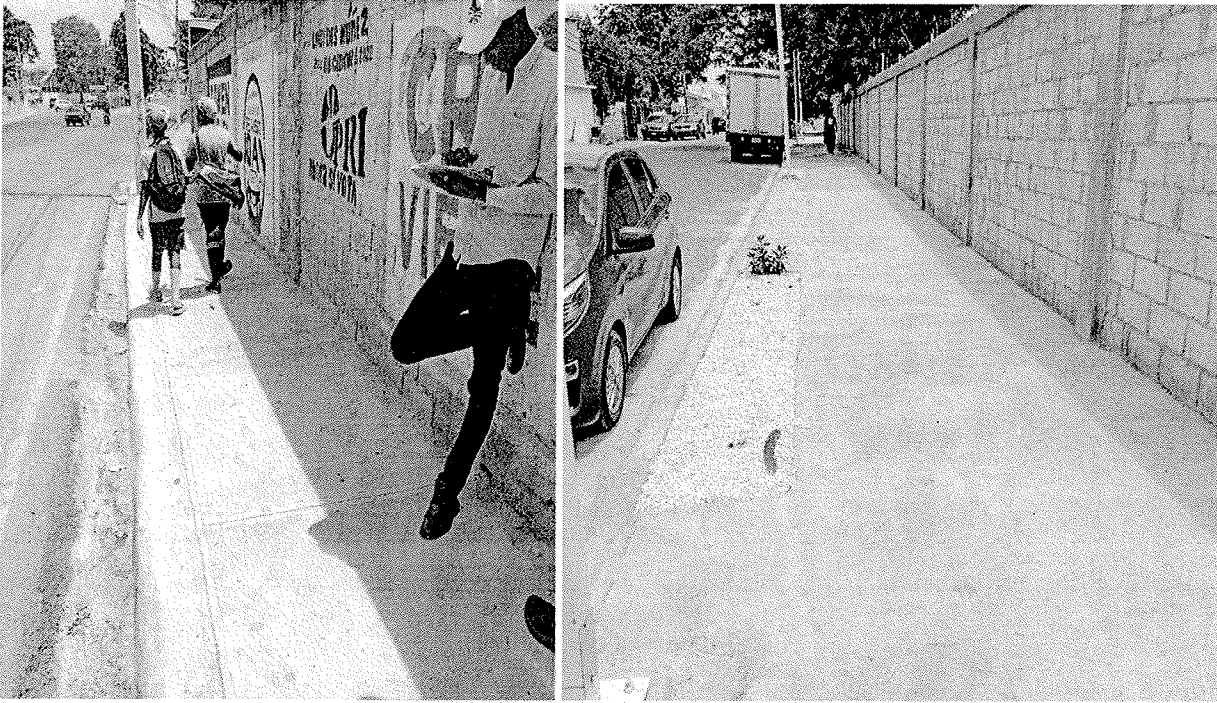

Suministra los datos de este reporte,

ING. STAYLIN MENDOZA

Técnico

ARQ. KEILIN MORA

Técnico

