



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

## INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 230401

**REGIÓN:** HIGUAMO

**PROVINCIA:** SAN PEDRO DE MACORÍS

**MUNICIPIO:** CONSUELO

**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 13/10/2022

1. Ing. Edward Acosta

**TÉCNICOS:** 2. Ing. Félix Tavárez


TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	SECTOR LOS VECINOS, C/RESP. MELLA	137.80	0.80	1	141.40	1	110.24	141.4
TRAMO B	SECTOR LOS VECINOS, C/RESP. MELLA	117.60	0.77	1	141.90	1	90.16	141.9
TRAMO C	SECTOR SANTA ANA, C/PRINCIPAL	176.20	0.77	1	265.90	1	135.0866667	265.9
TRAMO D	SECTOR VILLA PROGRESO, C/41	1,661.60	0.92	1	2,232.40	1	1523.133333	2232.4
TRAMO E								
TRAMO F								
TRAMO G								
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1858.62	2781.60

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,865,733.68

Monto desembolsado RD\$ 5,865,733.69 (100%)

Avance de obra 162.46%



## LIGA MUNICIPAL —DOMINICANA—

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: HIGUAMO

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 13/10/2022

PROVINCIA: SAN PEDRO DE MACORÍS

MUNICIPIO: CONSUELO

DISTRITO MUNICIPAL: -

### INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN


Mediante el presente Informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,858.62 metros cuadrados de aceras y 2,781.60 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

### NOTAS



1. De acuerdo a lo observado en esta visita, la calidad de los materiales y la terminación se adaptan a las normas de construcción.
2. Pudimos observar que usaron las dimensiones correctas para las plantillas de contenes y el ancho de las aceras.

### IMÁGENES





LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

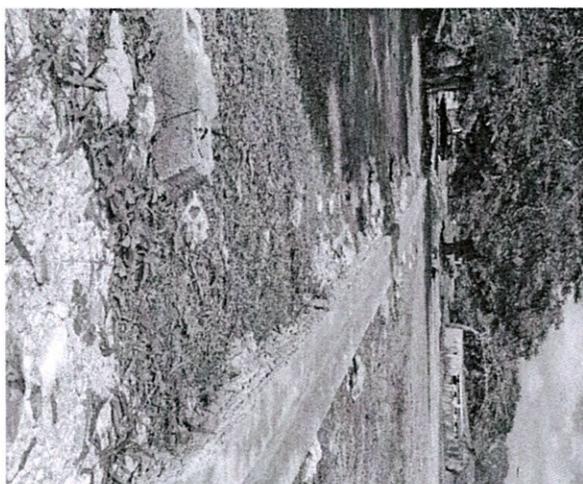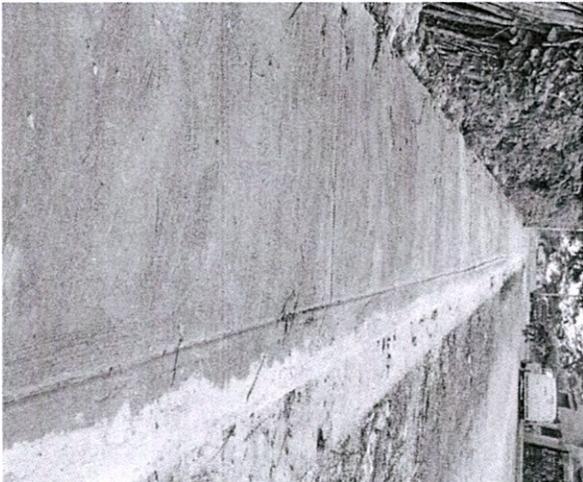

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. EDWARD ACOSTA  
Técnico

  
ING. FÉLIX TAVÁREZ  
Técnico

