

LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

CODIGO: 250107
REGIÓN: CIBAO NORTE
PROVINCIA: SANTIAGO
MUNICIPIO: SANTIAGO
DISTRITO MUNICIPAL: HATO DEL YAQUE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17/07/2023

TÉCNICOS: 1. Ing. Edward Acosta
 2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	Carretera SAJOMA A (desde la bomba hasta Don Alberto)	405.10	1.50	1.00	418.00	1.00	607.65	418.00
TRAMO B	Carretera SAJOMA B (desde Don Alberto hasta la curva)	189.10	1.50	1.00	189.10	1.00	283.65	189.10
TRAMO C	Calle Principal, Los Moya				196.80	2.00		393.60
TRAMO D	Residencial Esteban Tavárez (Entrada EDENORTE)				190.25	2.00		380.50
TRAMO E	Carretera SAJOMA B (desde Repuesto Andre hasta Propagas) Entrada de Villa Fátima	198.70	1.64	1.00	198.70	1.00	326.36	198.70
TRAMO F	Calle Don Berto Abreu, Los Guandules Nuevo				125.30	2.00		250.60
TRAMO G	Calle Principal, Sector San Ramón				94.80	2.00		189.60
TRAMO H								
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							1,217.66	2,020.10

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,808,578.22
 Monto desembolsado RD\$ 5,808,578.22 (100%)
 Avance de obra 113.88%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17/07/2023

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: SANTIAGO

DISTRITO MUNICIPAL: HATO DEL YAQUE


INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 1,217.66 metros cuadrados de aceras y 2,020.10 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

NOTAS

1. Las aceras y contenes construidos hasta la fecha cuentan con buenas calidad constructiva.
2. Hasta el momento de la visita se construyeron aceras solo en la Carretera Sajoma, todas estampadas y pintadas.
3. Las aceras construidas tienen un ancho promedio de 1.50m.

IMÁGENES

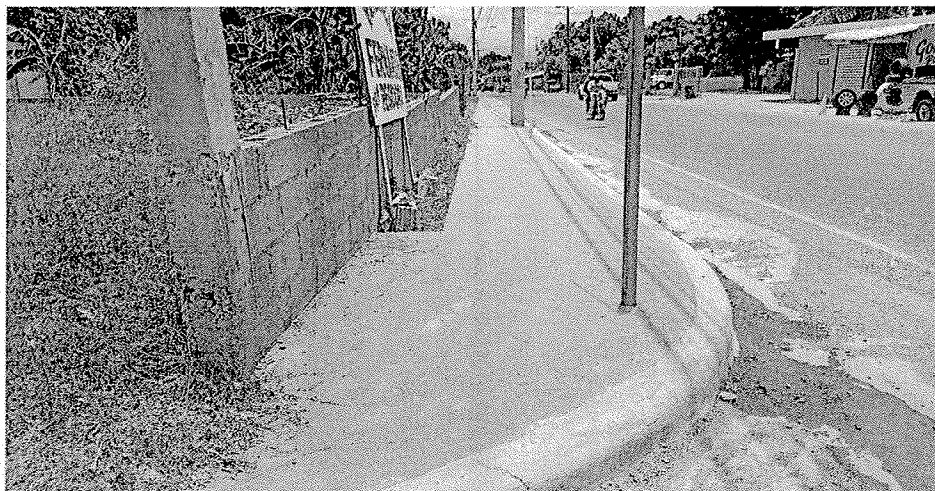



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



Suministra los datos de este reporte,

Edward Acosta

ING. EDWARD ACOSTA

Técnico

Elizabeth García

ELIZABETH GARCÍA

Técnico
