

# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

**CODIGO:** 250303  
**REGIÓN:** CIBAO NORTE  
**PROVINCIA:** SANTIAGO  
**MUNICIPIO:** JÁNICO  
**DISTRITO MUNICIPAL:** EL CAIMITO

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 17-07-2023

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Edward Acosta  
 2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CARRETERA ENTRADA EL CAIMITO	226.50	1.00	1.00			226.50	
TRAMO B	CARRETERA EL PIMALITO			1.00	493.90	1.00	-	493.90
TRAMO C	CARRETERA EL CAMINITO - JUANA JUMA	32.00	0.80	1.00			25.60	
TRAMO D	C/ENTRADA LOS CABA	67.10	1.01	1.00	8.40	1.00	67.79	8.40
TRAMO E	C/PRINCIPAL (FRENTE AL LICEO)	164.00	1.12	1.00	125.50	1.00	183.33	125.50
TRAMO F	C/PRINCIPAL (FRENTE AL COL, FERMIN)				66.10	1.00		66.10
TRAMO G	C/PRINCIPAL, SECTOR YAQUE ABAJO	77.65	1.59	1.00	81.20	1.00	123.68	81.20
TRAMO H	C/SALON COMUNAL	15.10	1.00	1.00			15.10	
<b>Total</b>							<b>641.99</b>	<b>775.10</b>

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,160,338.76  
 Monto desembolsado RD\$ 1,580,169.38 (50%)  
 Avance de obra 87.15%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NORTE

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 17-07-2023

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: JÁNICO

DISTRITO MUNICIPAL: EL CAIMITO


## INFORME DE AVANCE DE OBRA


A la fecha de 17/07/yyyy se ha ejecutado 641.99 metros cuadrados de aceras y 775.10 metros lineales de contén, lo que corresponde al 87.15% del fondo asignado para este territorio.

### NOTAS

1. En la zona se hicieron contenes con muy buena calidad.
  2. En algunos tramos, se construyeron aceras delante de los contenes a modo de estructura de canalización de las aguas (ver fotos).
- Por un tema de costos y espacio en las vías, en algunos tramos se decidió rellenar las cunetas
3. encachadas y construir sobre este relleno un contén con una base que va de 1.12m hasta 1.15m, en vez de construir losas de hormigon armado sobre las cunetas (ver fotos)

### IMÁGENES

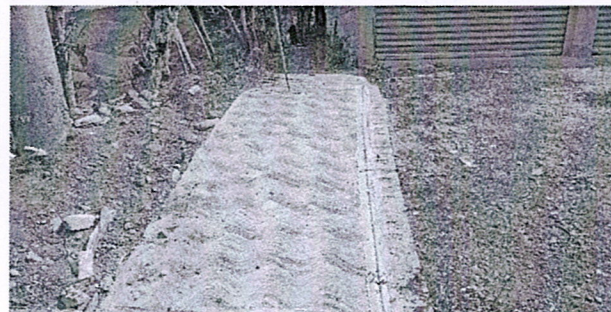




LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —




*Suministra los datos de este reporte,*



ING. EDWARD ACOSTA

Técnico



ELIZABETH GARCÍA

Técnico
