

# LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

## SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN

**CODIGO:** 250701  
**REGIÓN:** CIBAO NORTE  
**PROVINCIA:** SANTIAGO  
**MUNICIPIO:** VILLA GONZÁLEZ  
**DISTRITO MUNICIPAL:** -

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 21/11/2022

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Richard Cabrera  
2. Ing. Staylin Mendoza

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	LA MILAGROSA				202.40	2		404.8
TRAMO B	PROYECTO 1	17.80	1.06	1	153.20	2	18.868	306.4
TRAMO C	PROYECTO 2				142.80	2		285.6
TRAMO D	PROYECTO 3				130.20	2		260.4
TRAMO E	PROYECTO 4				109.75	2		219.5
TRAMO F	PROYECTO 5				107.5	2		215
TRAMO G	PROYECTO 6				84.2	2		168.4
TRAMO H	PROYECTO 7				51.85	2		103.7
TRAMO I	CARLOS GARCIA	86.00	1.36	1	262	2	116.96	524
TRAMO J	EL PALMAR				217	1		217
TRAMO K								
TRAMO DJ								
TRAMO DK								
Total							135.83	2704.80

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 5,567,809.46  
Monto desembolsado RD\$ 5,567,809.46 (100%)  
Avance de obra 125.89%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

**SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

**REGIÓN:** CIBAO NORTE

**FECHA DE VISITA TÉCNICA:** 21/11/2022

**PROVINCIA:** SANTIAGO

**MUNICIPIO:** VILLA GONZÁLEZ

**DISTRITO MUNICIPAL:** -



## **INFORME DE CIERRE DE EJECUCIÓN**


Mediante el presente informe se da constancia que el Gobierno Local ha ejecutado 135.83 metros cuadrados de aceras y 2,704.80 metros lineales de contén, y se valida que se ha ejecutado el 100% o más en volumetría según la proyección estimada.

## **NOTAS**


1. En esta visita se pudo observar un control de la pendiente en los contenes.
2. Una buena terminacion y calidad en la ejecucion de la obra.

## **IMÁGENES**

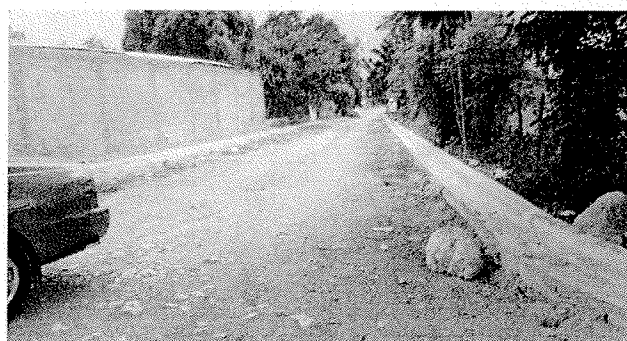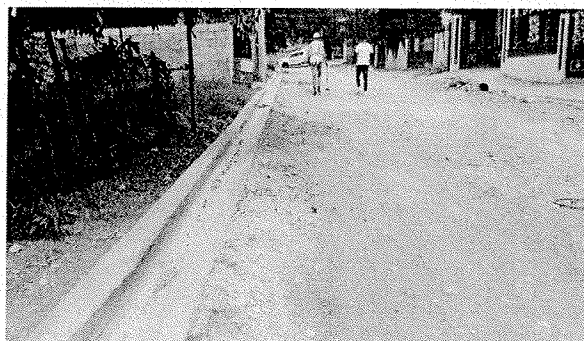



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

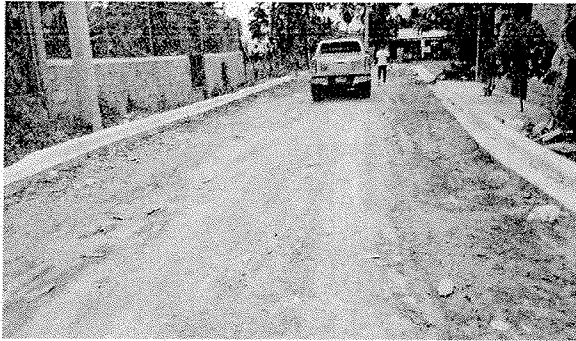

*Suministra los datos de este reporte,*

ING. RICHARD CABRERA  
Técnico

ING. STAYLIN MENDOZA  
Técnico
