



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**CODIGO:** 270204

**REGIÓN:** CIBAO NOROESTE

**PROVINCIA:** VALVERDE

**MUNICIPIO:** ESPERANZA

**DISTRITO MUNICIPAL:** BOCA DE MAO

**FECHA DE ÚLTIMA VISITA:** 12 de mayo de 2022

**TÉCNICOS:** 1. Ing. Ana Indhira Rámirez  
2. Ing. Richard Cabrera

| TRAMOS  | NOMBRE DE LA CALLE                         | LONGITUD DE ACERAS (m) | ANCHO DE ACERAS (m) | CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS | LONGITUD CONTENES (m) | CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES | TOTAL DE ACERAS (m2) | TOTAL DE CONTENES (m) |
|---------|--|------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|
| TRAMO A | CALLE 10 DE SEPTIEMBRE                     |                        |                     |                              | 279.60                | 1                              |                      | 279.6                 |
| TRAMO B | CALLE 26 DE JULIO FRENTE AL COLMADO VARGAS | 42.30                  | 1.35                | 1                            |                       |                                | 57.105               |                       |
| TRAMO C | CALLE 27 DE FEBRERO                        |                        |                     |                              | 70.80                 | 1                              |                      | 70.8                  |
| TRAMO D | CALLE 26 DE JULIO                          | 77.90                  | 1.19                | 1                            | 77.9                  | 1                              | 92.701               | 77.9                  |
| TRAMO E | CALLE 26 DE JULIO                          |                        |                     |                              | 22.4                  | 1                              |                      | 22.4                  |
| TRAMO F | CALLE 26 DE JULIO                          |                        |                     |                              | 15.01                 | 1                              |                      | 15.01                 |
| TRAMO G | CALLE TOMAS MARTINEZ                       |                        |                     |                              | 65.6                  | 1                              |                      | 65.6                  |
| Total   |  |                        |                     |                              |                       |                                | 149.806              | 531.31                |

### AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 3,093,856.22  
Monto desembolsado RD\$ 1,546,928.11 50%  
Avance de obra 49.31%



# LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO NOROESTE

FECHA DE ÚLTIMA VISITA: 12 de mayo de 2022

PROVINCIA: VALVERDE

MUNICIPIO: ESPERANZA

DISTRITO MUNICIPAL: BOCA DE MAO




## REPORTE


A la fecha de 12/05/2022 se ha ejecutado 149.81 metros cuadrados de aceras y 531.31 metros lineales de contén, lo que corresponde al 49.31% del fondo asignado para este territorio.

## NOTAS

1. Esta alcaldía esta ejecutando por contrato.
2. Hasta ahora son los contenes que se estan ejecutado, van intervenir otros sectores y no fueron levantando por los técnico porque aun los regidores y el director no definen cuales son . Al momento de definir dicha acción esto lo van a informar aquí.
3. Van ejecutar aceras y contenes. En la calle 10 de septiembre, las aceras van ser de 2.00m o mas por una situación con los vendedores.

## IMÁGENES

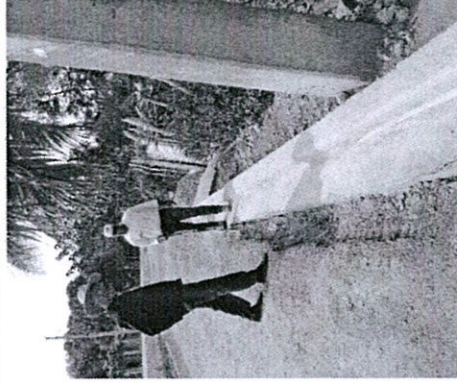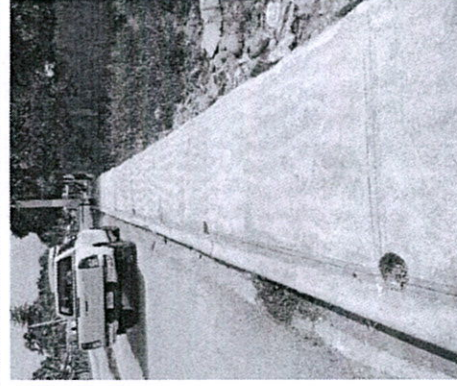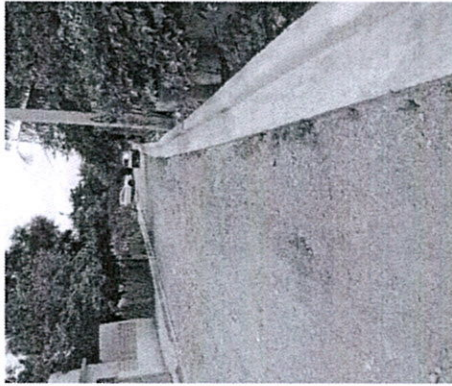



LIGA MUNICIPAL  
— DOMINICANA —

Suministra los datos de este reporte,

  
ING. ANA INDHIRA RÁMIREZ

Técnico



ING. RICHARD CABRERA

Técnico
