



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORME DE AVANCE DE OBRA

CODIGO: 280101
REGIÓN: CIBAO SUR
PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL
MUNICIPIO: BONAO
DISTRITO MUNICIPAL: -


FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29 de noviembre de 2022

TÉCNICOS: 1. Ing. Staylin Mendoza
2. Elizabeth García

TRAMOS	NOMBRE DE LA CALLE	LONGITUD DE ACERAS (m)	ANCHO DE ACERAS (m)	CANTIDAD DE LADOS CON ACERAS	LONGITUD CONTENES (m)	CANTIDAD DE LADOS CON CONTENES	TOTAL DE ACERAS (m2)	TOTAL DE CONTENES (m)
TRAMO A	CALLE PRLONGACION MERCEDES 1 (LOS SOLARES)				230.25	2		460.5
TRAMO B	CALLE PRLONGACION MERCEDES 2 (LOS SOLARES)				131.20	2		262.4
TRAMO C	CALLE PRLONGACION MERCEDES 3 (LOS SOLARES)				117.75	2		235.5
TRAMO D	CALLE PRLONGACION MERCEDES 4 (LOS SOLARES)				150.65	2		301.3
TRAMO E	CALLE PRINCIPAL (DIVINO NIÑO)				162	2		324
TRAMO F	CALLE 1RA (DIVINO NIÑO)				172.7	2		345.4
TRAMO G	CALLE 2DA (DIVINO NIÑO)				88.5	2		177
TRAMO H	CALLE 3RA (DIVINO NIÑO)				81.7	2		163.4
TRAMO I								
TRAMO J								
Total							0.00	2269.50

AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA

Monto asignado RD\$ 9,683,111.53
Monto desembolsado RD\$ 10,875,242.26 (112%)
Avance de obra 58.67%



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

SUBSECRETARÍA DE APOYO MUNICIPAL, OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REGIÓN: CIBAO SUR

FECHA DE VISITA TÉCNICA: 29 de noviembre de 2022

PROVINCIA: MONSEÑOR NOUEL

MUNICIPIO: BONAÑO

DISTRITO MUNICIPAL: -

INFORME DE AVANCE DE OBRA

A la fecha de 29/11/2022 se ha ejecutado .00 metros cuadrados de aceras y 2,269.50 metros lineales de contén, lo que corresponde al 58.67% del fondo asignado para este territorio.



NOTAS

1. Esta obra se esta ejecutando por contrato en diferentes barrios.
2. Tienen muy buena terminación los contenes ejecutados y con material adecuado.
3. Hasta el momento solo se esta ejecutando contenes.

IMÁGENES



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

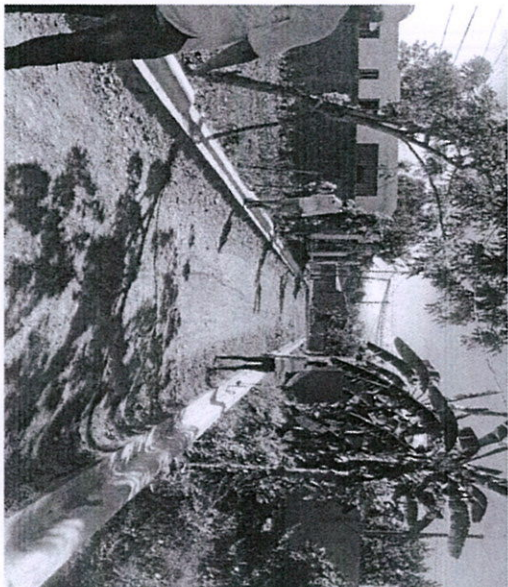

Suministra los datos de este reporte,


ING. STAYLIN MENDOZA
Técnico


ELIZABETH GARCÍA
Técnico

